

НИИСП ГОССТРОЯ УССР

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
на устройство индустриальных сборных
ковровых кровель из полимерных рулонных
материалов с применением широкозахватной
траверсы**

КИЕВ 1988

НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ГОССТРОЯ УССР

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА УСТРОЙСТВО ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СБОРНЫХ
КОВРОВЫХ КРОВЕЛЬ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ РУЛОНИНЫХ
МАТЕРИАЛОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ШИРОКОЗАХВАТНОЙ
ТРАВЕРСЫ

Утверждена заместителем директора НИИСП Госстроя
В.И. СИСАРЕНКО

Одобрена Ученым советом НИИСП Госстроя УССР
Протокол № 13 от 29.12.87

КИЕВ 1988

УДК 69.024.I58:69I.I75.024.I5.002.5I

Изложена технология устройства сборных ковровых кровель из полимерных рулонных материалов с применением способа монтажа кровельных элементов "насухо", основанная на их заводской готовности, комплектной поставке крупноразмерных кровельных ковров и элементов, сборных железобетонных и засыпных - щебеночных пригрузов и применении комплексной механизации монтажных работ.

Для инженерно-технических работников, бригадиров и рабочих, выполняющих работы по устройству кровель жилых и промышленных зданий.

Технологическую карту разработали инж. О.И.Хрущев (ответственный исполнитель), канд техн. наук О.Т.Павлюк (НИИСП Госстроя УССР), и -женеры Ю.П.Шульженко (ВНИИстройполимер Минстройматериалов СССР), В.Г.Токарев, В.Н.Баклан (Глав-

© НИИСП Госстроя УССР, 1988

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

I.I. Технологическая карта распространяется на монтаж крупноразмерных сборных кровельных ковров на покрытиях с площадью участков водосбора или блок-секции 400 м^2 и более (преимущественно с теплым или открытым чердаком).

Карта предусматривает контейнеризованный и комплектный способ доставки сборных элементов кровли и монтаж сборного кровельного ковра с применением широкозахватной траверсы с сердечником конструкции НИИСП Госстроя УССР.

В перечень основных элементов сборной кровли входят железобетонные подкладочные элементы для зажима кровельного ковра по периметру, бронирующие фартуки и косынки для обустройства мест примыканий и собственно сборные кровельные ковры. Комплектующими материалами являются клеящая мастика, защитные колпаки водоприемных воронок, подстилающий песок, разделительный рубероид, пригрузочный щебень и др.

I.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят работы, показанные на рис. I.

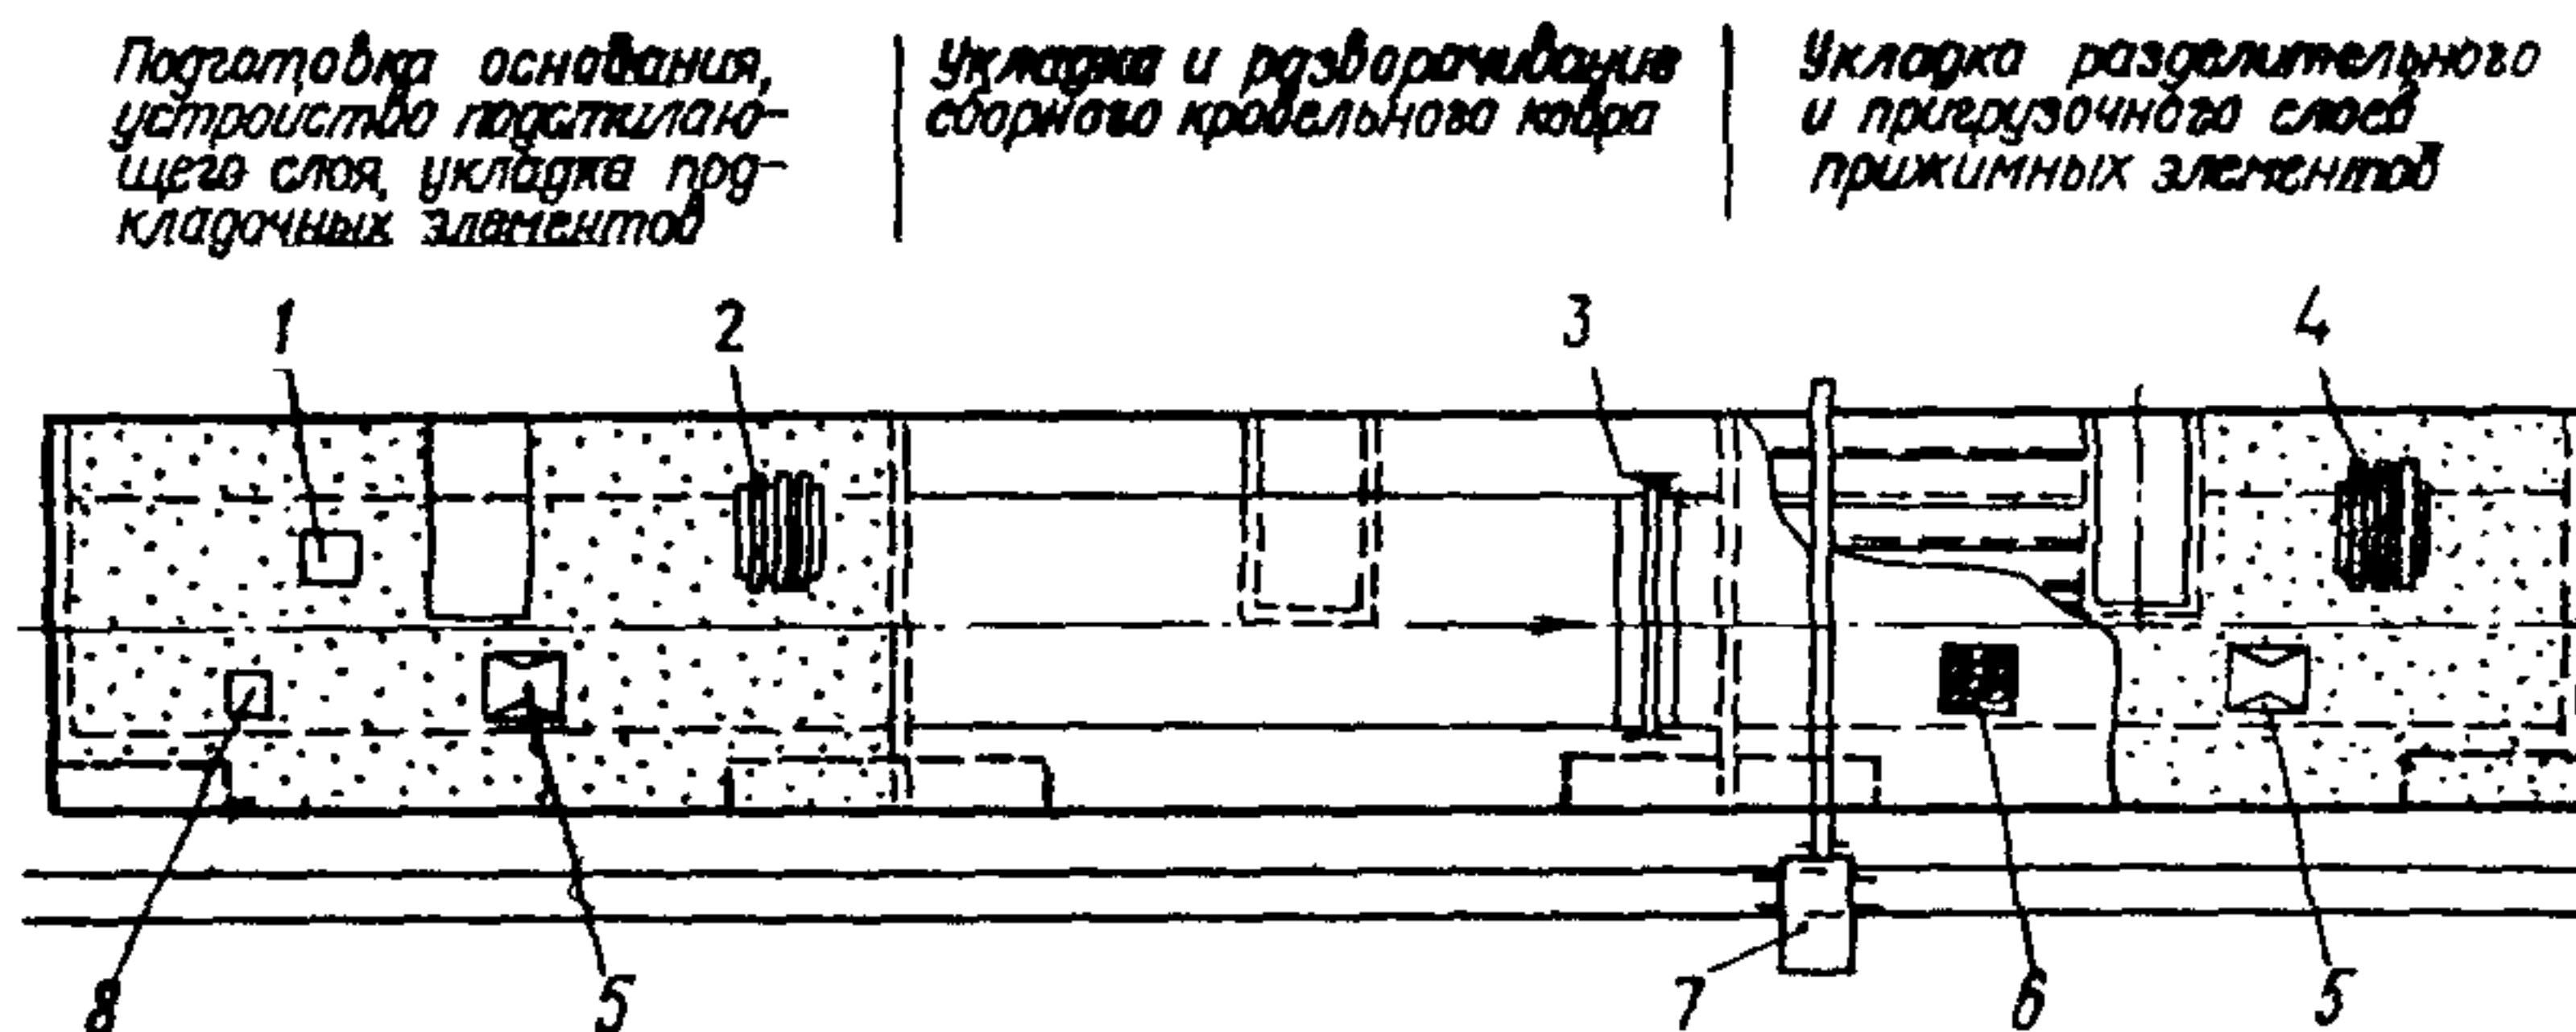


Рис. I. Схема производства кровельных работ: 1 - контейнер для сыпучих материалов; 2 - поддон с подкладочными сборными железобетонными элементами; 3 - траверса для монтажа сборного ковра; 4 - поддон с прижимными сборными железобетонными элементами; 5 - контейнер для доборных кровельных элементов; 6 - контейнер для рулонных материалов; 7 - башенный кран; 8 - бадья для цементного раствора

Работы можно выполнять при температуре наружного воздуха до минус 30°С и силе ветра при укладке сборного ковра не более 10 м/с при хорошей видимости.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До начала кровельных работ на строительную площадку из расчета на участок водосбора или блок-секцию доставляют необходимый комплект кровельных элементов, материалов, а также инвентарные средства для безопасного производства работ.

Подкладочные и прижимные железобетонные элементы, рулонные и сыпучие материалы подают на кровлю башенным краном на поддонах и в контейнерах, сборные кровельные ковры – специальной траперсой; kleящую мастику – в стандартных металлических емкостях для kleящих мастик вместимостью 24 л.

2.2. До монтажа сборной ковровой кровли должны быть завершены следующие работы:

подготовлено основание покрытия с заделкой швов несущих плит, поверхности выровнены цементно-песчаным раствором и выполнена срезка монтажных петель плит заподлицо с основанием;

выполнены разуклонки из цементно-песчаного раствора или легкого бетона по линиям водоразделов к чашам водоприемных воронок;

выполнены отверстия в плитах покрытия под трубы (фланевые стояки);

закончены работы по установке чаш водоприемных воронок;

закончено возведение кирпичной кладки стен машинного отделения лифтов до технологической отметки высотой не более 200 мм от плоскости основания;

очищена от мусора и выступающих напльвов цементного раствора поверхность несущих конструкций покрытия;

доставлены в зону работ по устройству сборной кровли необходимые инструменты и инвентарь.

При отсутствии указаний в проекте для планировки поверхности следует применять цементно-песчаный раствор марки не ниже 50 или херамзитобетон марки 35.

2.3. Для устройства сборной ковровой кровли применяются конструкции водоизоляционных ковров типа Т-І и Т-П. Конструктивные решения кровли должны соответствовать приведенным на рис. 2.


Ковры состоят из водоизоляционного и подкладочного слоев. Водоизоляционный слой выполняется из гидробутила К или робутила АК по ТУ 21-27-96-85; подкладочный слой - из рубероида пергамина. В качестве пригрузочного материала следует применять гравий (щебень) по ГОСТ 8268-82 обеспыленный, чистый с крупностью зерен 5-25 мм, маркой по морозостойкости не ниже I00. Для устройства разделительного слоя над кровельным ковром применяется рубероид подкладочный марок РПП 300 по ГОСТ 10923-82 и пергамин кровельный по ГОСТ 2697-83. В качестве подстилающего слоя из сыпучих материалов следует применять мелкозернистый песок по ГОСТ 8735-75 или крупнозернистый песок по ГОСТ 8736-85. Для устройства дополнительных слоев применяются полотно клееное прокладочное (прокламелин) и тканая сетка марок ССС, СС-І.

В качестве kleящих мастик должны применяться бутилкаучуковая мастика МБК по ТУ 21-27-90-83, каучуковая мастика КН-2 КН-3 по ГОСТ 24064-80.


Применение мастик КН-2 и КН-3 допускается при температуре наружного воздуха не ниже 5 °C при отсутствии атмосферных осадков. В качестве разбавителя мастики МБК должен использоваться уайт-спирит по ГОСТ 3134-78, а мастики КН-2 и КН-3 - этилацетат по ГОСТ 22300-76 с уайт-спиритом в соотношении по массе 1:1.

2.4. Доставленные на объект контейнеры с кровельными элементами следует устанавливать в зоне действия монтажного крана с созданием запаса элементов не менее чем на двухсменную рабочую (из расчета полного завершения работ по захватке). Доставка кровельных элементов осуществляется автотранспортными средствами по часовому графику увязанному с общим графиком монтажных работ объекта.


2.5. Работы по устройству кровли выполняются в следующей технологической последовательности: монтаж подкладочных элементов; очистка основания; устройство подстилающего слоя; устройство карнизов и чаш водоприемных воронок; монтаж сборного ковра кровли; устройство разделительного слоя; укладка пригруза из щебня и монтаж пригрузочных элементов; установка защитных колпаков водоприемных воронок.

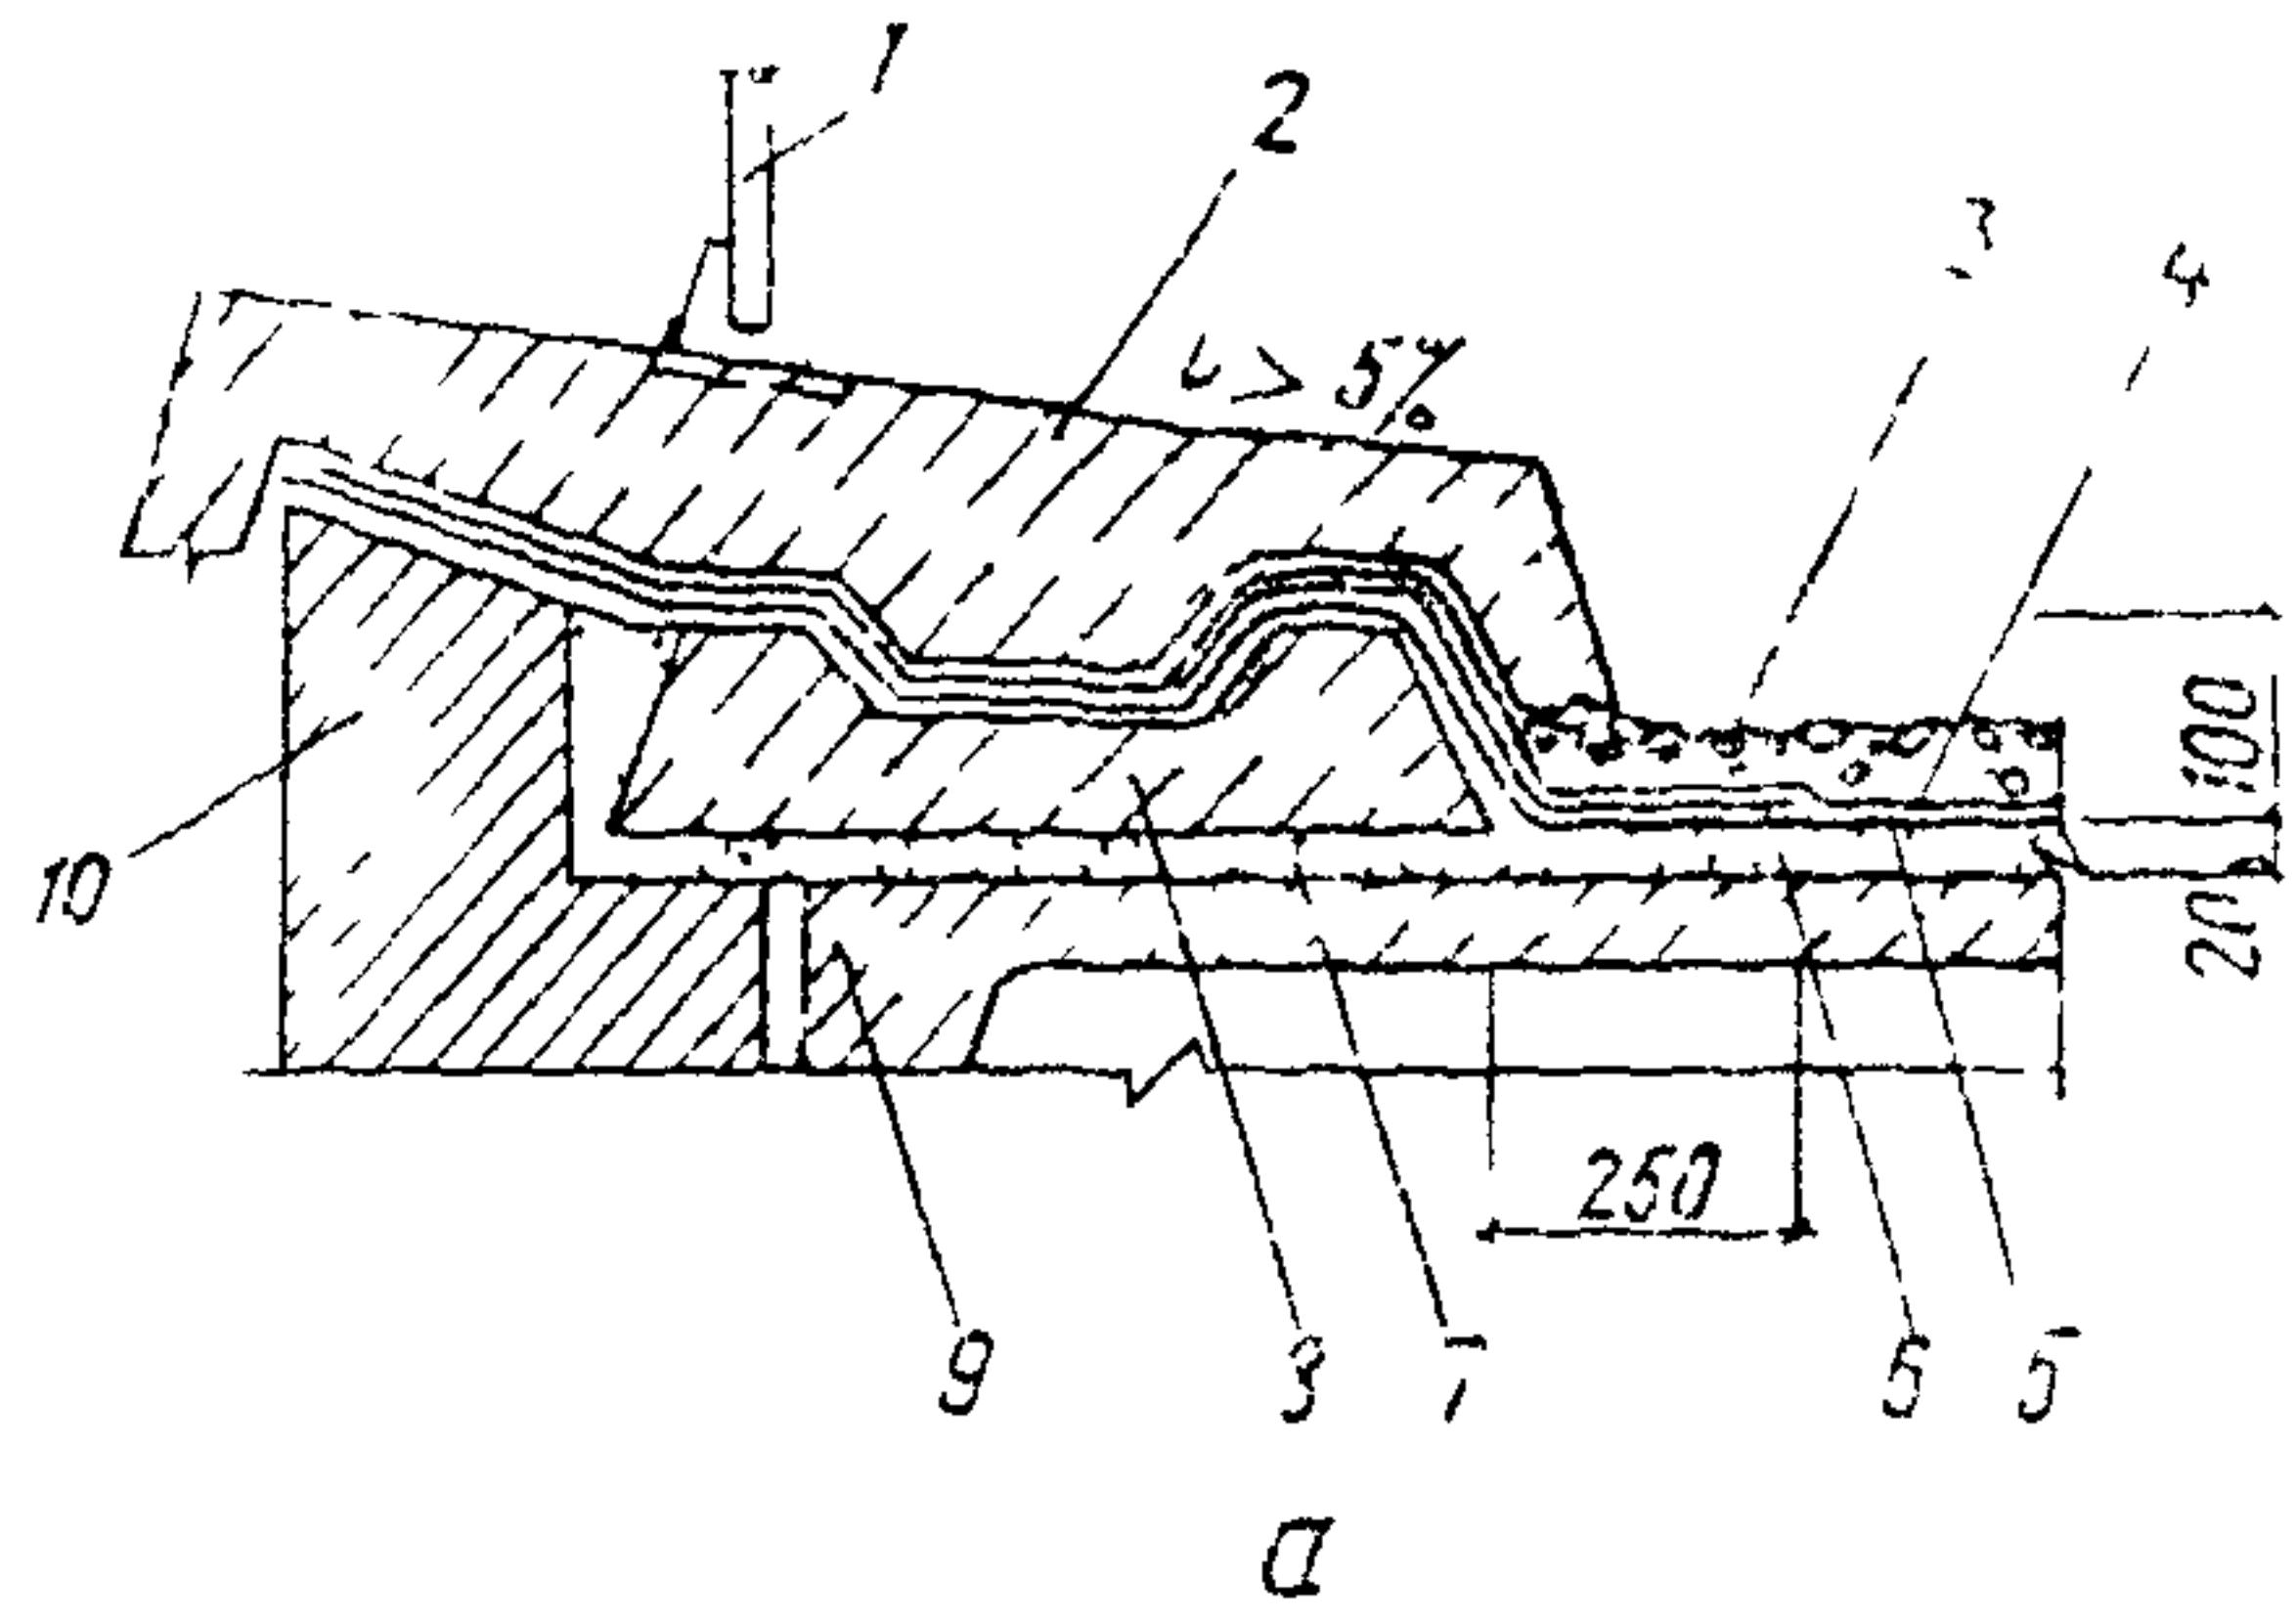


A

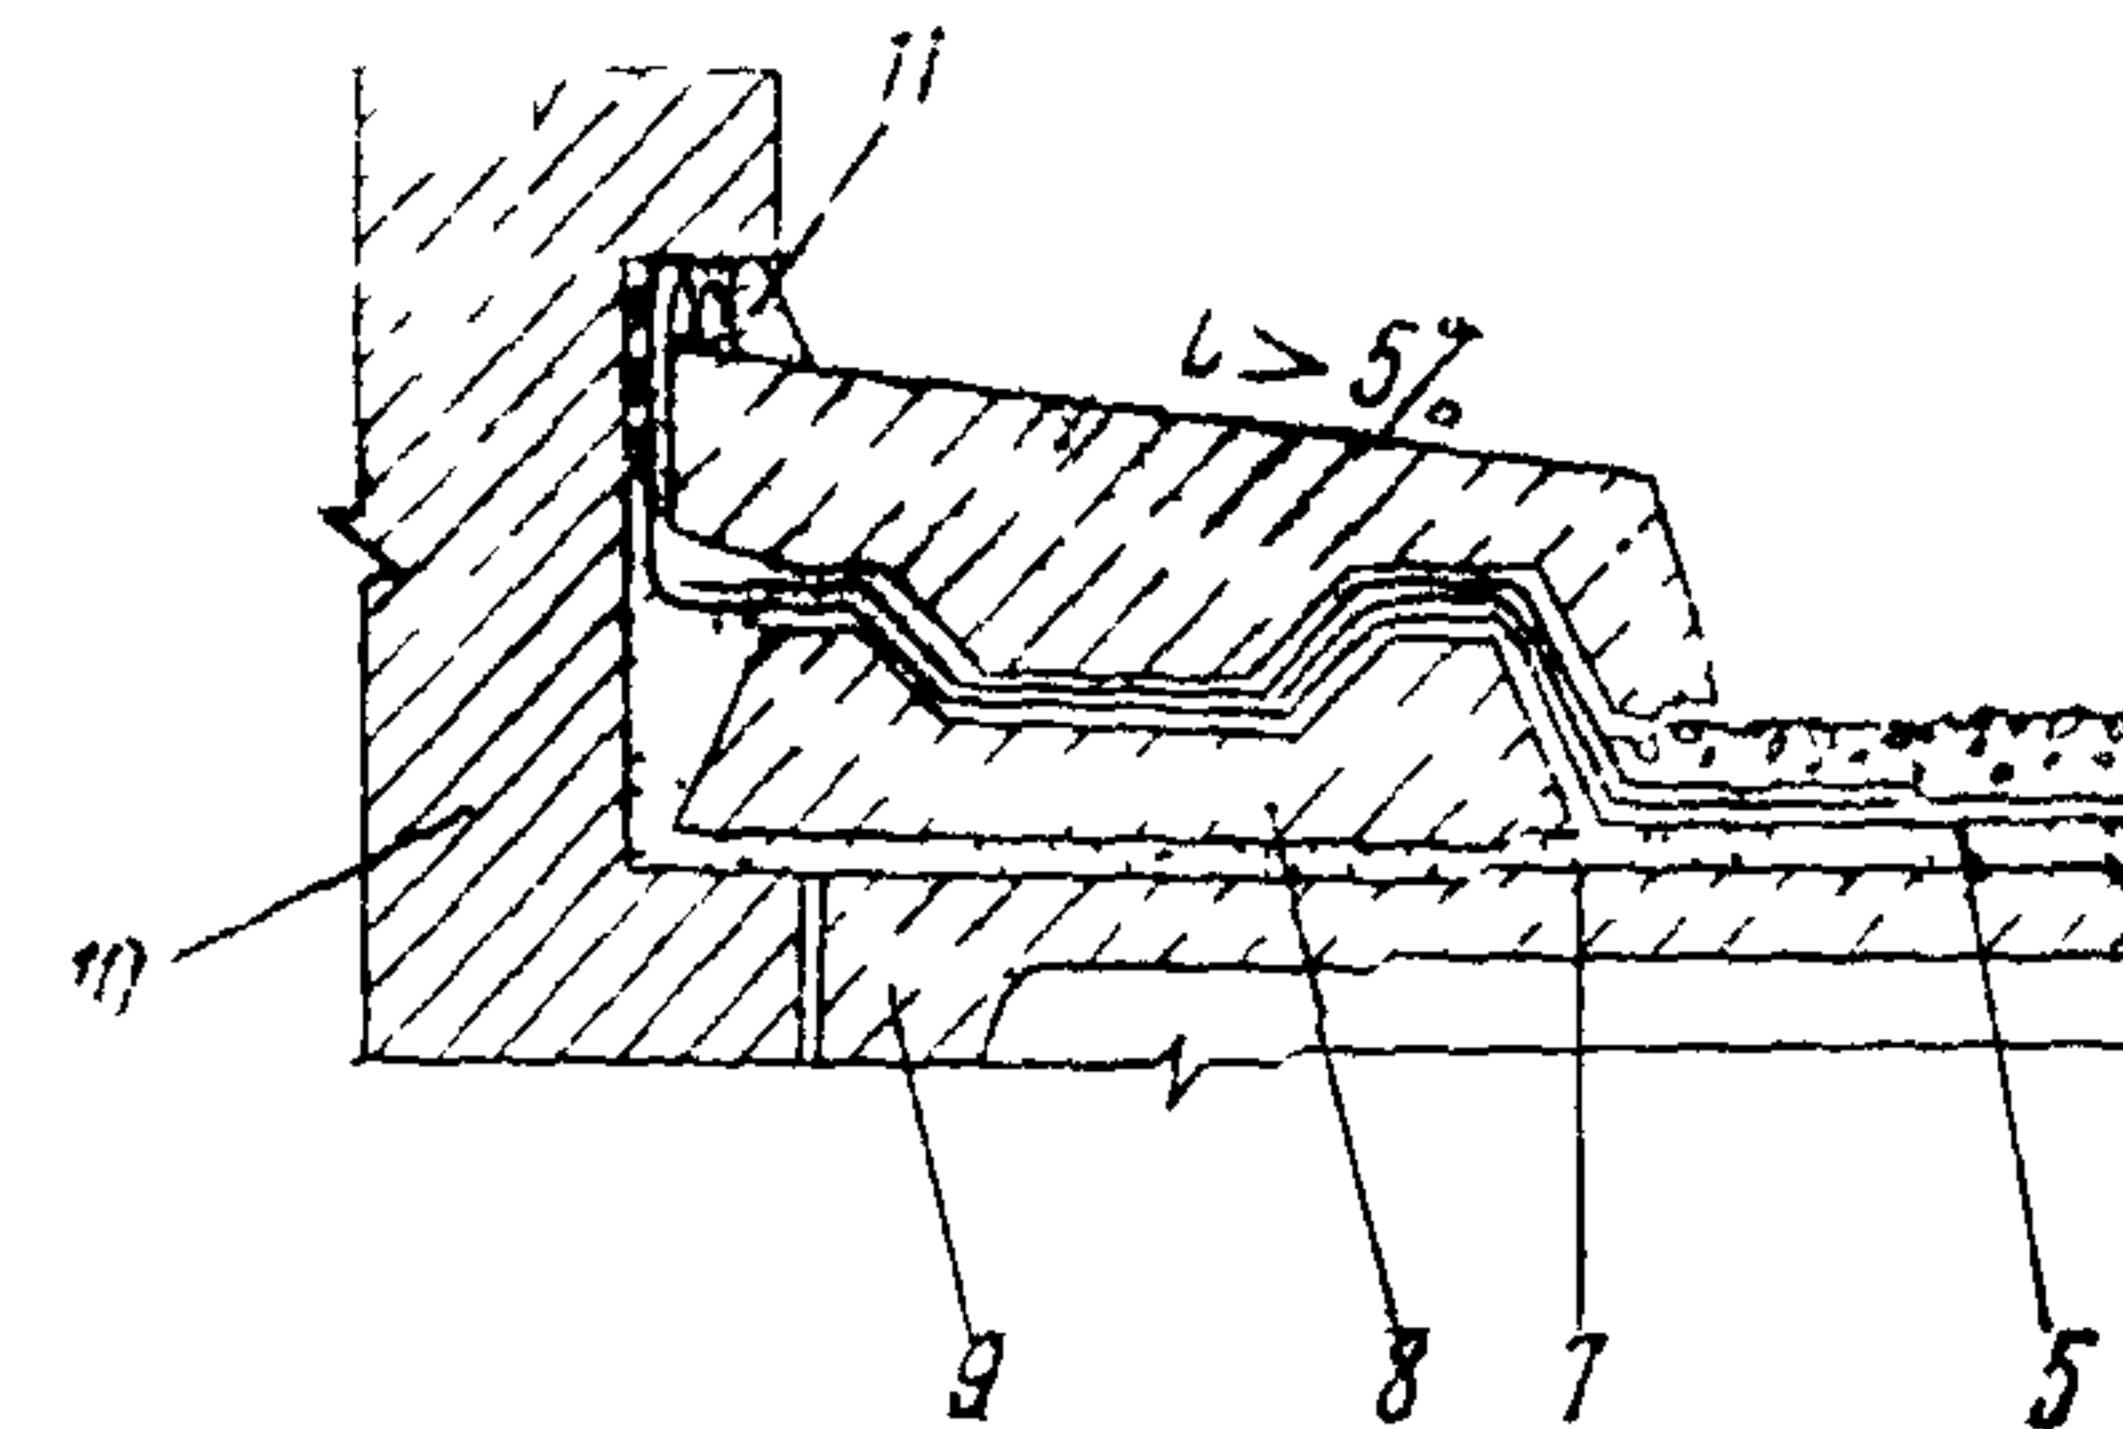

B

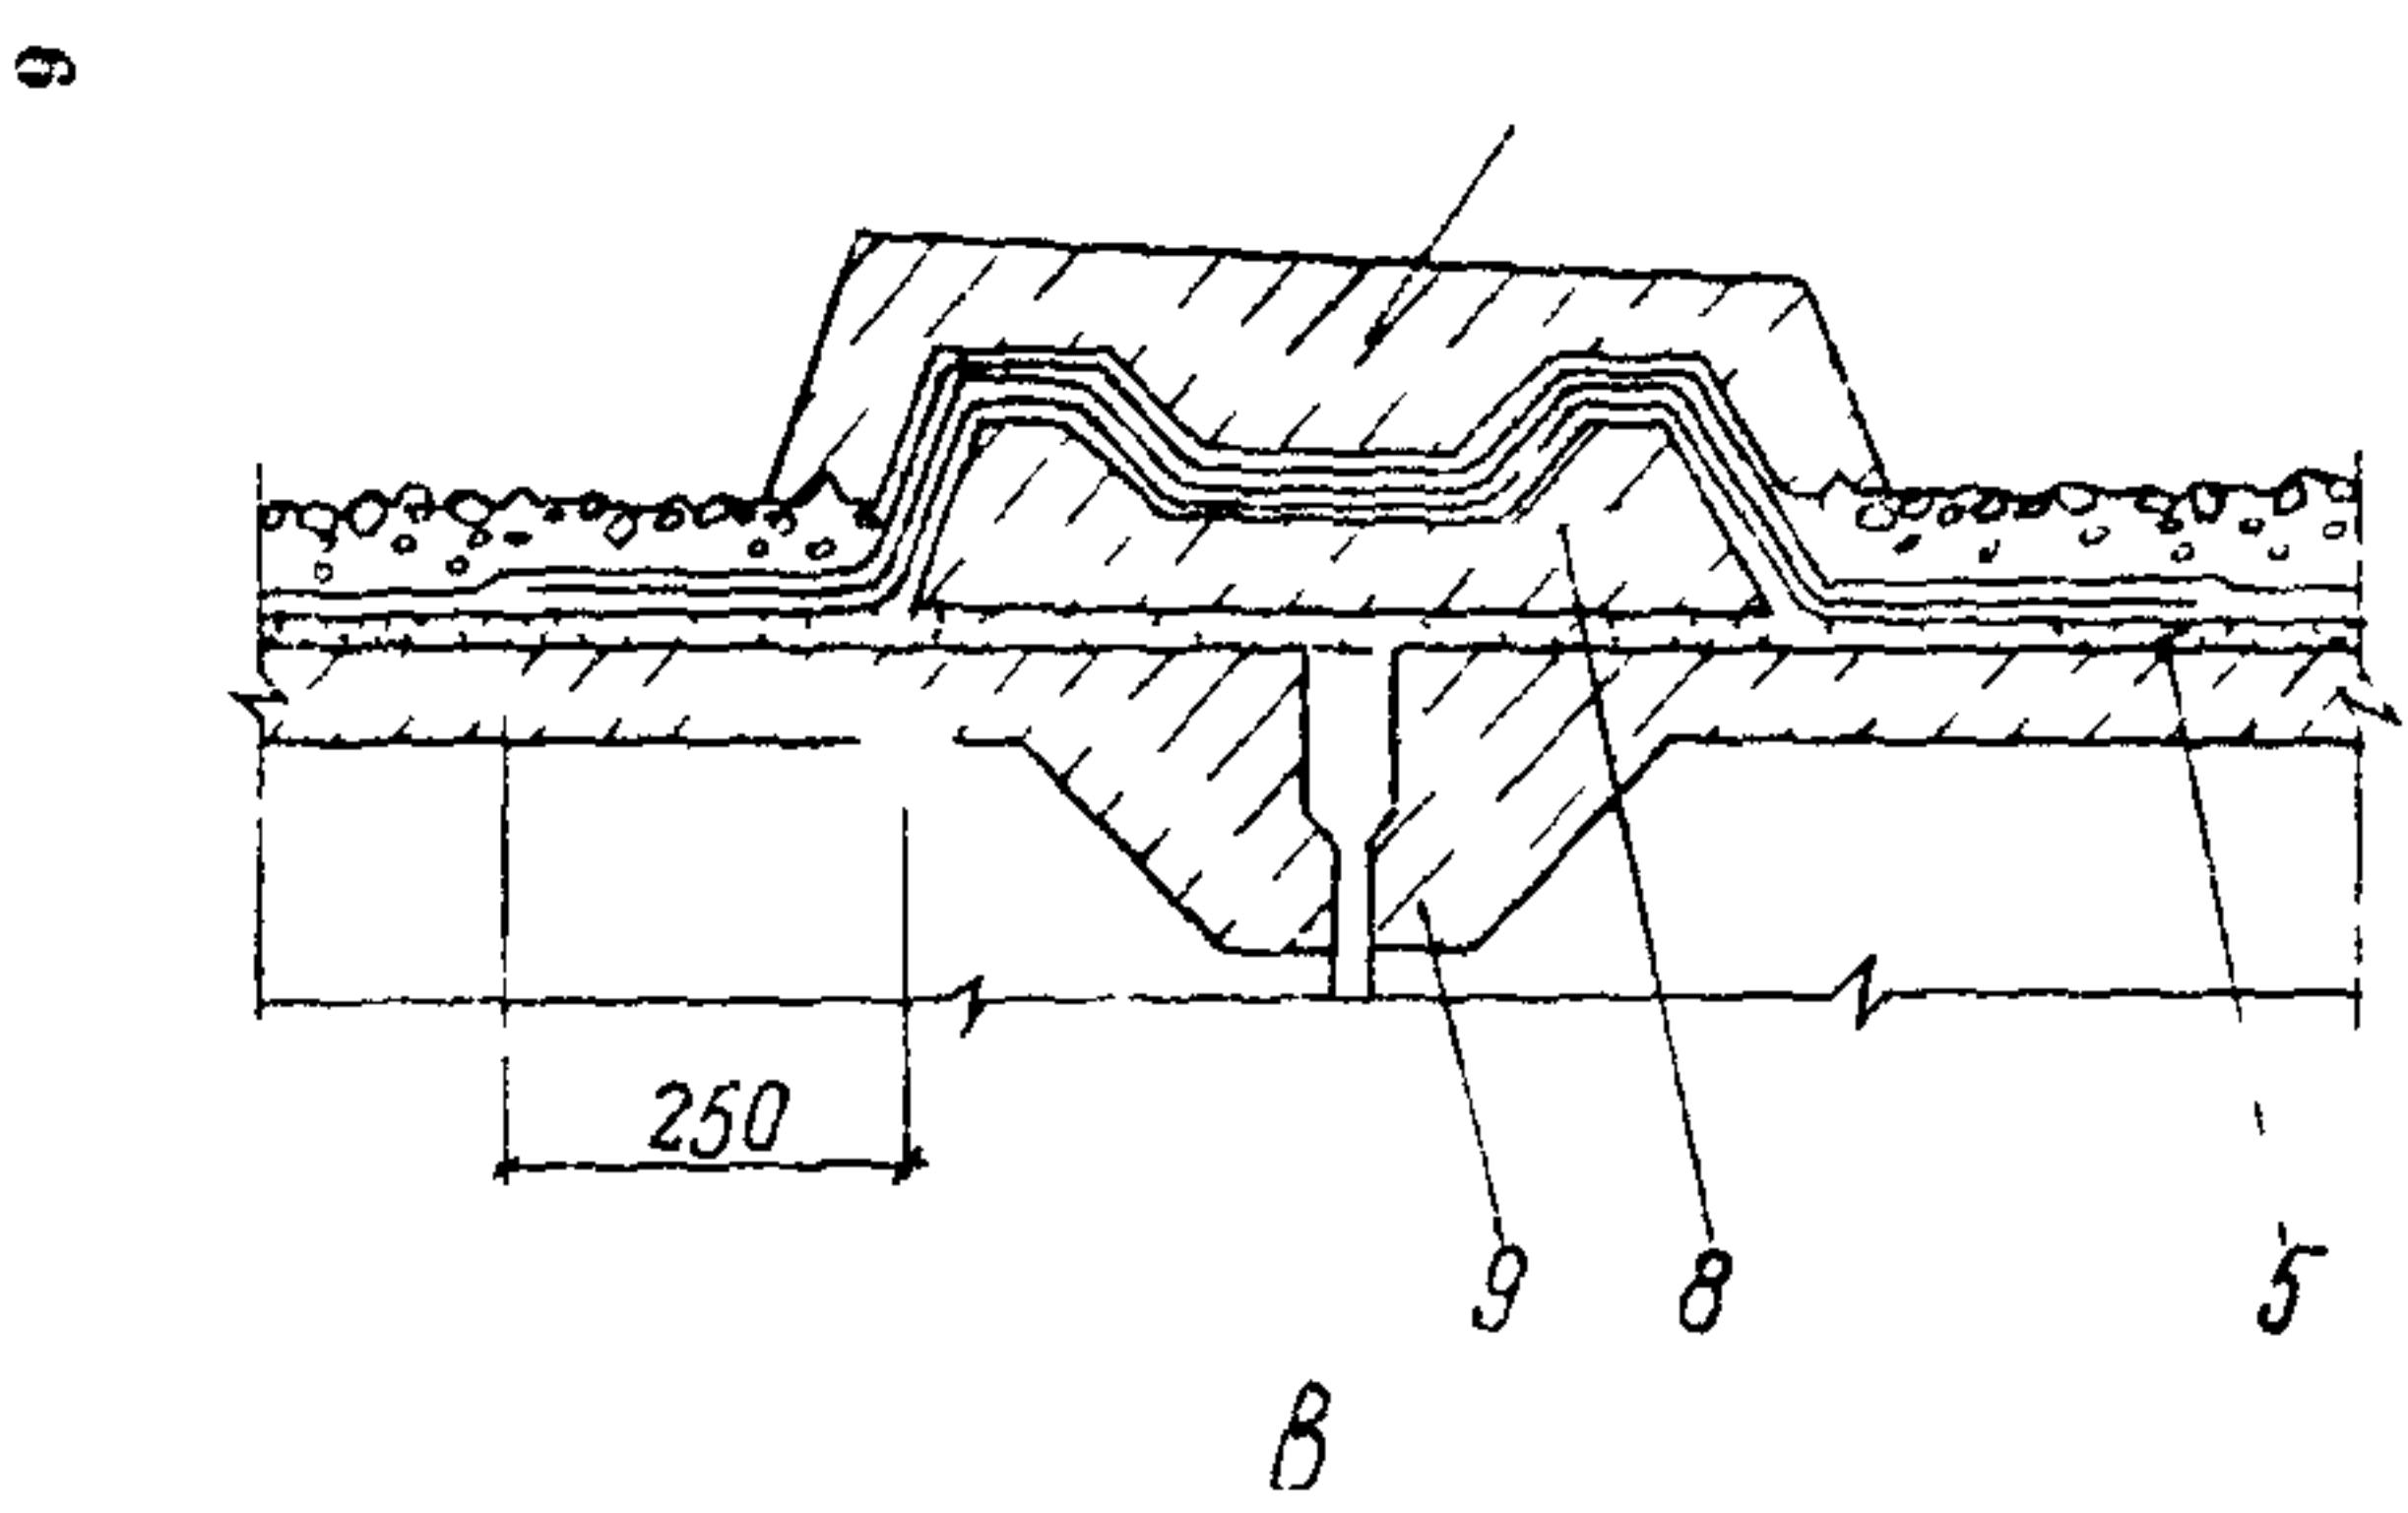

C

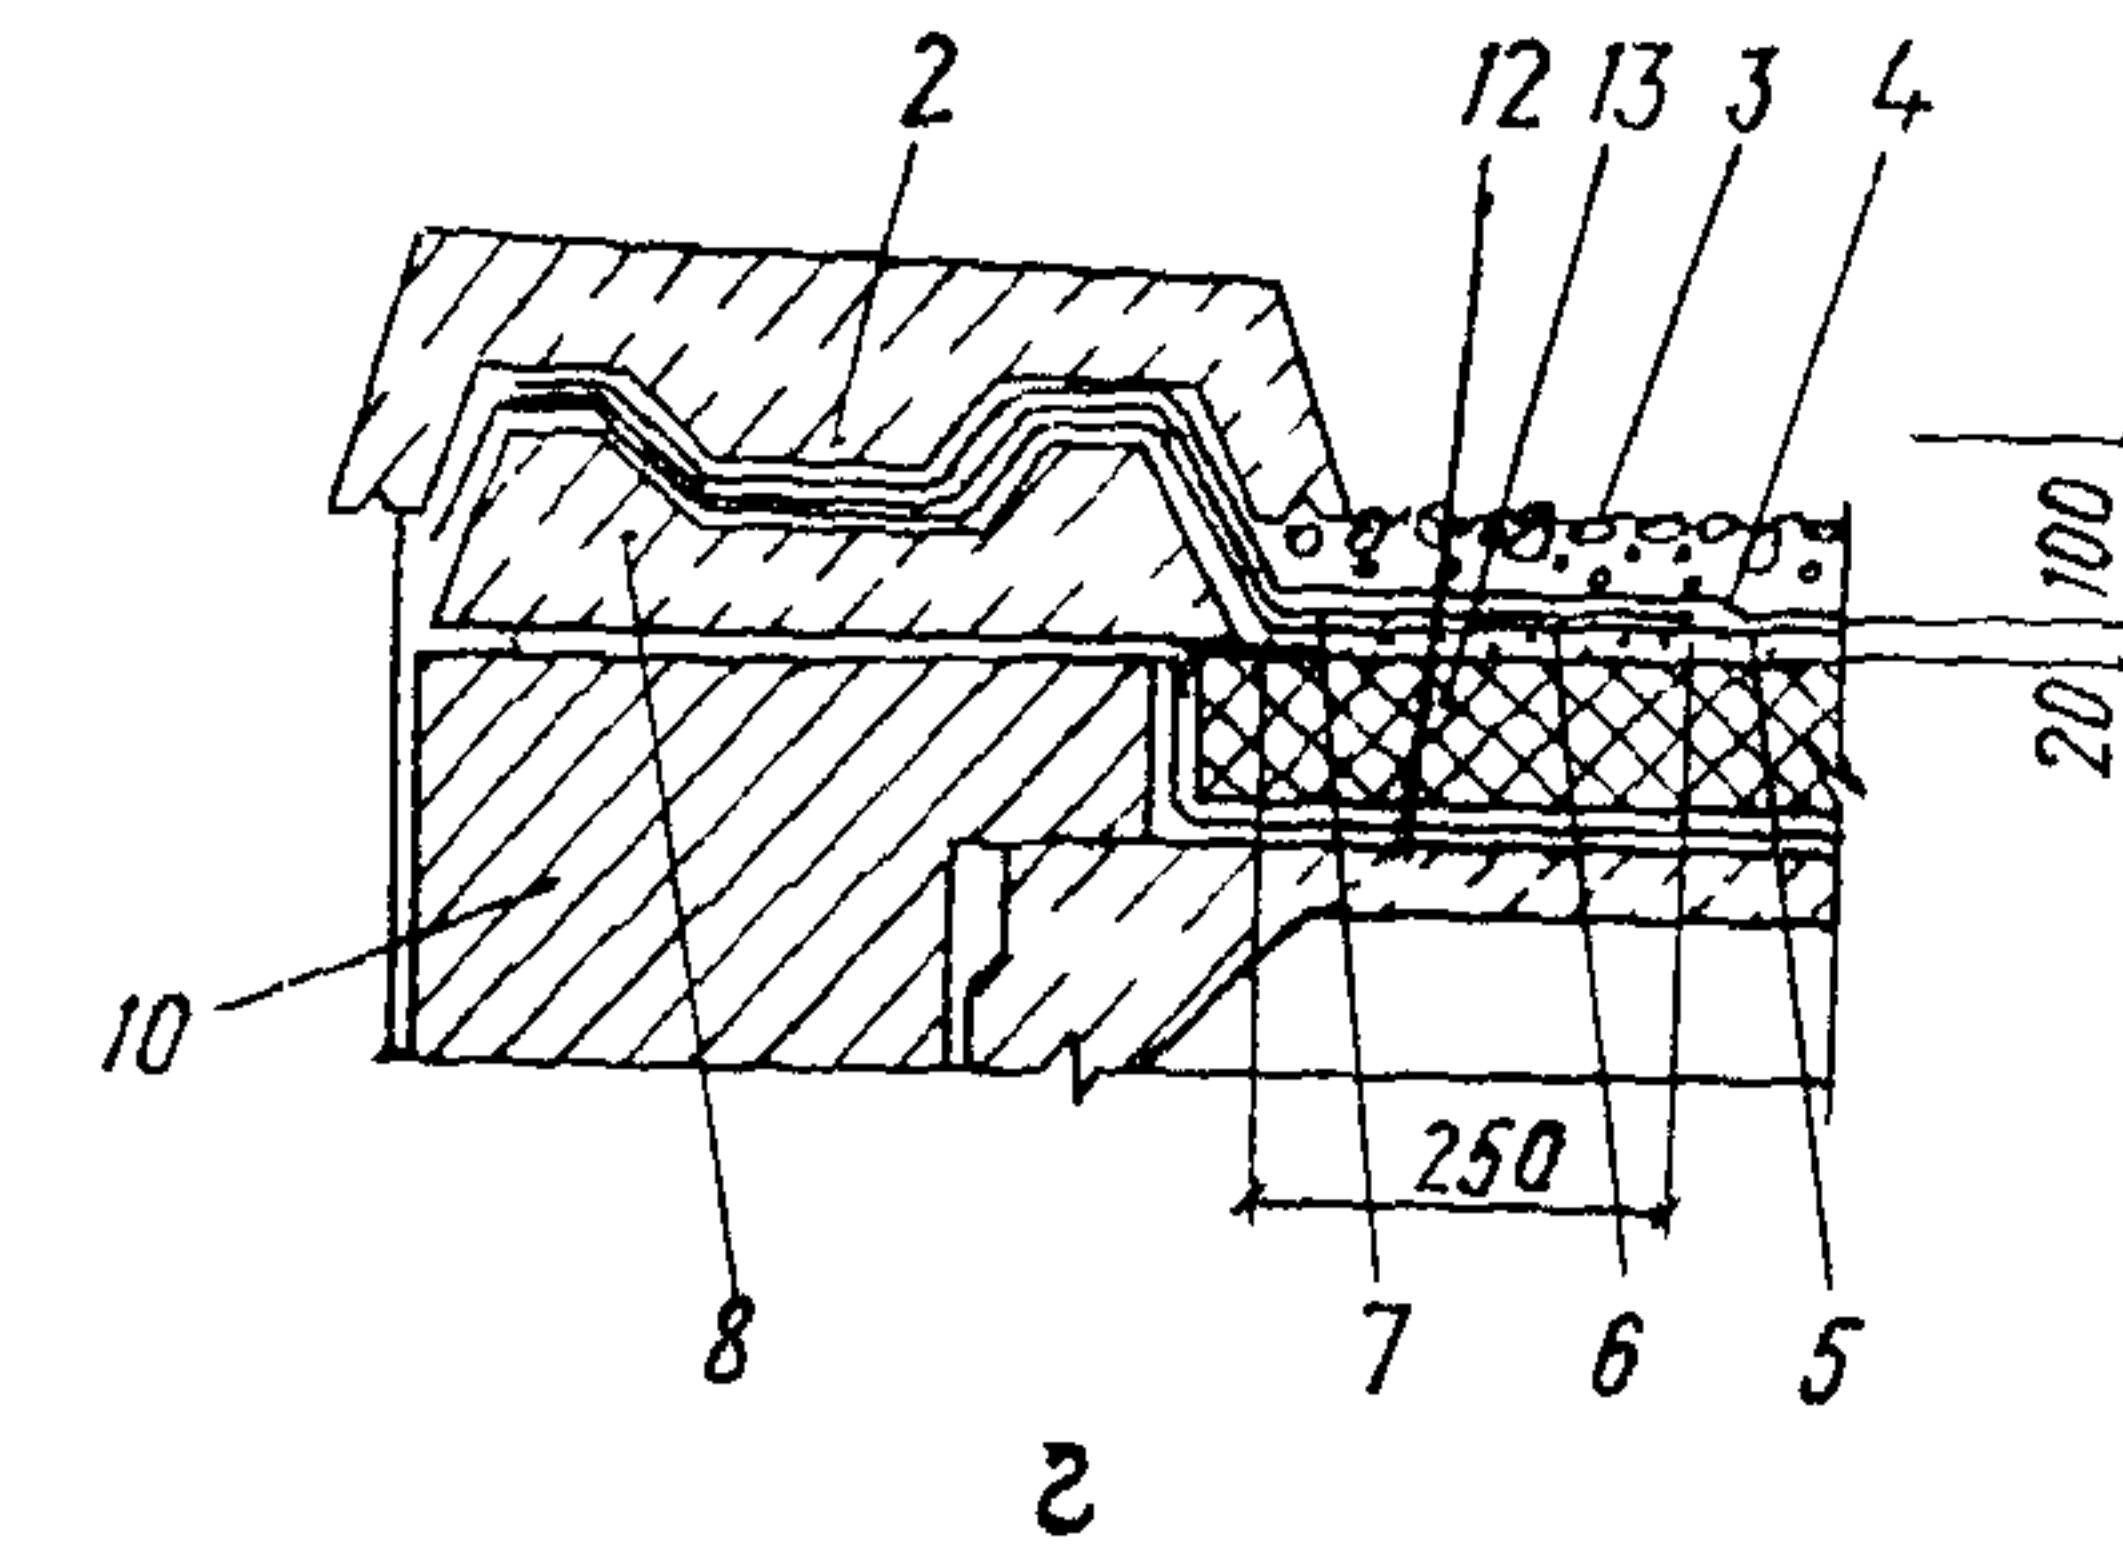

D

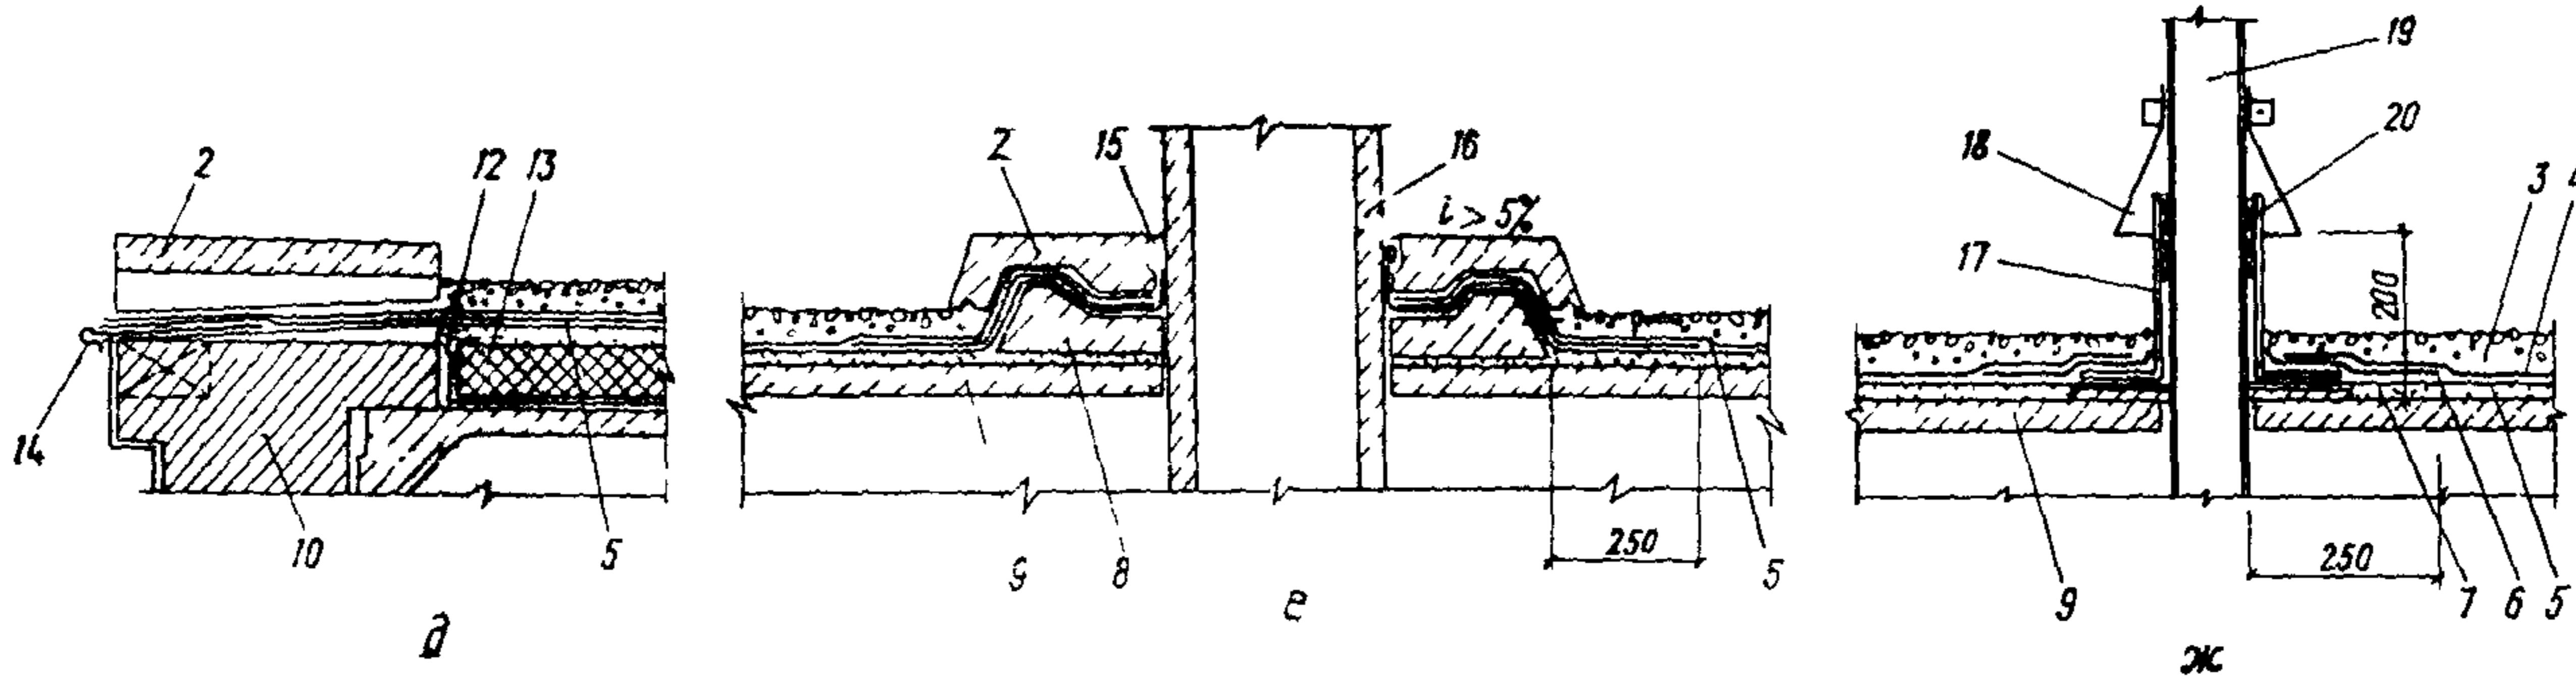


Рис. 2. Схема конструктивных решений примыканий кровли к конструкциям покрытия:
 а - к низкому кирпичному парапету; б - к внутренней кирпичной стене; в - в местах
 стыковки кровель на смежных захватках; г - к наружной кирпичной стене машинного помещения;
 д - к карнизу кирпичной стены машинного помещения; е - к вентиляционной шахте; ж - к фано-
 вым стоякам; 1 - металлическое ограждение; 2 - сборный прижимной элемент; 3 - пригрузочный
 слой; 4 - разделительный слой; 5 - сборный кровельный ковер; 6 - защитный фартук; 7 - под-
 стидающий слой; 8 - сборный подкладочный элемент; 9 - несущая плита покрытия; 10 - кирпич-
 ная стена; II - заделка цементным раствором; 12 - пароизоляция; 13 - теплоизоляция; 14 -
 слив из оцинкованной кровельной стали; 15 - герметизирующая мастика; 16 - вентиляционная
 шахта; 17 - сварной патрубок из стального листа; 18 - конусообразный фартук из оцинкован-
 ной кровельной стали с хомутом и прокладкой из резины; 19 - фановый стояк (труба);
 20 - пеньковое волокно

2.6. Монтаж подкладочных элементов по периметру участков водосбора (блок-секций), помещений машинных отделений лифтов и отверстий в местах выхода вентиляционных шахт ведется башенным краном с подъемом элементов с инвентарных поддонов. Укладку и горизонтальное выравнивание подкладочных элементов осуществляют по постели из песка или цементно-песчаного раствора.

2.7. Очистка основания включает удаление мелких острых предметов (кирпичного и бетонного боя, щебня и др.), заглаживание цементно-песчанным раствором острых выступов из бетона, раковин (глубиной более 20 мм) и откосов. Устройство подстилающего (выравнивающего) слоя по поверхности основания выполняется засыпкой и разравниванием скребками увлажненного песка толщиной не более 20 мм. Подача цементно-песчаного раствора и песка на покрытие осуществляется башенным краном в совковых бадьях и контейнерах для сыпучих материалов конструкции НИИСП Госстроя УССР.

2.8. Усиление кровельного ковра выполняется наклейкой на основание подкладок из гидробутила по слою мастики МБК (с расходом 1,2-1,5 м²). В местах установки водоприемных воронок наклеивают косынки размером 1x1 м, вдоль карнизов – полосы шириной 0,4 м после устройства карнизных свесов из оцинкованной кровельной стали.

2.9. К устройству сборной кровли разрешается приступать только после нанесения на основание покрытия маячных меток (направляющих линий) для привязки сборного ковра к площади его укладки. Маячные метки наносятся масляной краской, мелом или укладкой деревянных реек в местах привязочной установки траверсы с ковром в направлении укладки ковра. Метки наносятся по направлению продольной оси траверсы и по одной из граней рулона ковра. Привязка траверсы и направление укладки ковра устанавливаются проектом производства работ.

2.10. Укладку сборных ковров начинают с участков, отдаленных от мест подачи материалов, и, как правило, с торца здания. К укладке ковра следует приступать после проверки состояния подготовки основания с приемкой его по акту на скрытые работы.

На подготовленное место покрытия краном подается траверса с комплектом кровельных ковров на 3-4 блок-секции покрытия жилого дома суммарной массой до 3,0 т.

2.II. Укладку ковра кровли осуществляют с помощью башенного крана в следующем порядке: траверсу с кровельным ковром устанавливают на маячную метку, нанесенную на основание, с одновременной выверкой направления укладки ковра; ленту кровельного ковра укладывают по основанию покрытия; выполняют выверку ленты ковра после раскатки; ленту кровельного ковра развертывают от левой и правой линий его изгиба в стороны продольных парапетов с укладкой кромок на подкладочные сборные элементы в местах примыканий с установкой временных пригрузов.

Раскатку рулона ковра производят перемещением траверсы располагая ее поперек здания симметрично центральной (привязочной) продольной оси.

Подшипниковые узлы и тормоза на опорах сердечника траверсы обеспечивают свободное и плавное падение ленты ковра на основание, не допуская отклонения грузового каната от вертикальной оси. Передвижение траверсы регулируют два кровельщика; при укладке ленты ковра допустимое расстояние от низа опор траверсы до плоскости покрытия не должно превышать 0,5 м.

Движение траверсы осуществляется участками длиной по 10 м с выверкой направления раскатки ленты ковра по маячным меткам. Развертывание на стороны многослойной ленты ковра монтажники производят вручную следующим образом: складывают верхнее однослоиное полотнище ковра "гармошкой" так, чтобы его край (шириной не менее 1 м) был обращен к средней части, затем, начиная с середины, наружную верхнюю грань ковра (складку) сдвигают в направлении к парапету, выравнивая в несколько приемов, после чего с плоскости ковра отворачивают край полотнища на подкладочные сборные элементы. В местах расположения отверстий под вентиляционные шахты в ковре делают радиальные прорезы с целью осаживания ковра на подкладочные сборные элементы и укладывают по периметру отверстий локальные пригрузы, после чего продолжают укладку ковра

При укладке ковра над водоприемной воронкой на поверхность косынки из гидробутила (см.п.2.8) следует нанести слой мастики

(из расчета 1,5 кг/м²) и после накатки на него кровельного ковра выполнить тщательную притирку или прикатку этой поверхности, обеспечивающую надежную приклейку кровельного ковра в зоне водоприемной воронки.

Над местами выхода вентиляционных блоков и труб в ковре вырезают необходимые отверстия.

После разворачивания кровельного ковра необходимо тщательно осмотреть его поверхность и произвести в случае необходимости мелкий ремонт.

Укладка ковра оформляется актом на скрытые работы.

2.12. Монтаж вентиляционных шахт (труб) выполняется краном с установкой сборных элементов на коробах, размещенных в чердачном пространстве. Установка фановых стояков производится в заранее выполненные отверстия в плитах покрытия и патрубки, расположенные над отверстиями.

2.13. В местах размещения ковра над сборными подкладочными элементами (по периметру ковра и вокруг отверстий) укладывают насухо защищенные фартуки и косынки (рис. 2). Ленты фартуков (длиной от 6 до 20 м) по длине склеивают мастикой с шириной нахлеста 100 мм; ленты должны иметь выпуск на горизонтальную плоскость покрытия шириной 250 мм; выпуск защемляют пригрузочным слоем щебня. В местах примыканий кровельного ковра к фановым стоякам защитный элемент выполняют в виде заранее изготовленного сварного патрубка из стального листа (полимерного материала) с фланцем шириной 100 мм. Патрубок устанавливают на ковер и приклеивают фланец мастикой. Обустройство патрубка выполняют двухслойной косынкой из гидробутила и стеклосетки с приклейкой к фланцу патрубка и кровельному ковру. Поверхность косынки по фланцу и патрубок тщательно окрашивают кистью за два раза сусpenзией алюминиевой пудры ПАК-З в керосине (состав по массе 1:10). Верх полости паза между патрубком и стояком следует уплотнить на высоту 30–50 мм пеньковыми волокнами и защитить конусообразным фартуком из армогидробутила с поверхностью (нетканой основой вверх), окрашенной сусpenзией из алюминиевой пудры или краской БТ 177.

Водоприемные воронки оклеиваются двухслойными косынками из гидробутила и стеклосетки размером 1x1 м. Косынку наклеи-

вают над отверстием воронки с последующей крестообразной разрезкой её по центру и приклейкой полученных концов к внутренней полости патрубка воронки.

Косынки и стеклосетки приклеивают мастикой, ковер в месте склейки зажимают, устанавливая защитный сетчатый колпак водо-приемной воронки. После этого тщательно промазывают мастикой поверхность наклеенной косынки и стыка по периметру сетчатого колпака.

2.14. К устройству разделительного слоя следует приступить после проверки правильности укладки водоизоляционного ковра. Особое внимание уделяется сохранению целостности кровельного ковра за счет предупреждения воздействия на него острых предметов и ударных нагрузок. Рулонные материалы для разделительного слоя (рубероид, пергамин) необходимо доставлять на кровлю в контейнерах. Полотнища укладывают насухо от ендовы с нахлесткой на ширину 100 мм вверх по уклону водосброса кровли; раскатку рулона следует начинать от парапета торцовой стены здания в направлении на себя, укладывая полотнище вдоль здания делянками по всей ширине кровли. Работы необходимо вести с установкой временных пригрузов или совмещать их с укладкой пригрузочного щебня

Засыпка пригрузочного материала (гравия, щебня) производится из передвижного контейнера, подвешенного к крюку крана; равномерность укладки материала регулируется технологическим отвесом и скоростью передвижения контейнера; высота сброса должна быть не более 1 м. Посыпку в пределах делянки в дальнейшем разравнивают вручную скребками до толщины слоя 40 мм.

2.15. Монтаж прижимных элементов выполняется с помощью крана методом самофиксации и свободной укладки в гнезда подкладочных элементов с последующей разделкой стыков цементным раствором (см. рис. 2).

2.16. Устройство сборной крововой кровли над машинным помещением лифтов выполняют по аналогии с основным решением. При неорганизованном водоотводе сборный ковер на карнизе приклеивают мастикой к основанию на ширину 400 мм, а пригрузочный слой щебня ограничивают прижимными элементами (железобетонной плиткой),ложенными на карниз с разрывами шириной 100 мм.

2.17. При выполнении работ в зимних условиях необходимо применять цементно- песчаные растворы на основе ке-

рамзитового песка с противоморозной добавкой, обеспечивающей незамерзаемость до минус 25 °С, а в качестве подстилающего слоя - рулонные битуминозные материалы.

При укладке ковра допускается наличие инея, а на отдельных участках - ровной корки из снега и наледи толщиной до 5 мм. Установку подкладочных элементов следует выполнять на растворе или песке влажностью до 3 %. Отдельные зоны (стяжка у воронки и на карнизе) перед наклейкой подкладок из гидробутила должны быть высушены с применением радиационных способов сушки (световыми или инфракрасными лучами).

Подстилающий слой из полотниц рубероида (пергамина) следует укладывать насухо поперек ленты ковра во время его размотки с сердечника; укладка полотниц производится от места начала размотки ковра нахлестом шириной до 50 мм.

Работы по кровле допускается производить сначала на участке левого затем правого разворота ковра до полного завершения всего объема работ на этих участках. Рассыпать пригрузочный щебень в этом случае допускается по слову снега толщиной не более 50 мм; разравнивать посыпку под отметку следует после таяния снега.

Кровельные элементы и материалы на покрытие транспортируют башенным краном в контейнерах, сборный ковер - специализированной траверсой, мастику и растворители - в герметически закрытых емкостях. Материалы подают непосредственно в рабочую зону в количестве, необходимом для устройства кровли на захватке.

2.18. Работы по устройству сборной ковровой кровли выполняет звено кровельщиков и изолировщиков, входящих в комплексную бригаду, в составе кровельщика У разряда, кровельщика ІУ разряда, двух кровельщиков ІІ разряда и двух изолировщиков ІІІ разряда.

Затраты труда звена по у^чгрой тру кровли на одной захватке (574 м^2) составляют 8,78 цел.-смены. Калькуляция трудовых затрат приведена в табл. I.

2.19. Приемка законченных работ по устройству сборной ковровой кровли осуществляется на основании контрольной проверки и тщательного осмотра ее поверхности по площадям а в местах примыканий к выступающим конструкциям - на основании инструменталь-

ной проверки отдельных узлов и деталей в соответствии с правилами производства работ, перечнем пооперационного контроля, приведенным в табл. 2 и требованиями СНиП Ш-І-76.

2.20. При производстве работ, связанных с устройством сборной кровли, необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в СНиП Ш-4-80 и Правилах пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ ПБ-05-86, утвержденных ГУПО МВД СССР 26.02.86; правила техники безопасности, прилагаемые к инструкциям по эксплуатации соответствующих механизмов. Все рабочие и ИТР, занятые на устройстве сборных кровель, должны быть обучены безопасным правилам и приемам производственных работ, пройти вводный инструктаж по технике безопасности, а также производственный инструктаж на рабочем месте.

К работе с полимерными мастиками допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр.

2.21. Запрещается хранить и переносить летучие и легко воспламеняющиеся растворители и мастики в открытой таре. Доставка на крышу здания этих материалов должна осуществляться в герметически закрывающихся емкостях в составе комплекта элементов сборной кровли. Запрещается установка емкостей на незащищенный кровельный ковер; в качестве подкладки может быть применен деревянный щит с лицевой поверхностью из кровельной стали. При перерывах в работе емкости с полимерными материалами следует закрывать для предохранения от испарения растворителя.

Места производства работ должны быть укомплектованы средствами пожаротушения из следующего расчета: на 500 м² кровли – два личных огнетушителя и асbestosовое полотно площадью 3 м².

На кровле запрещается производить работы, ведущие к образованию искр без принятия мер по защите кровельного ковра, а также курить и пользоваться открытым огнем.

2.22. При устройстве сборной кровли рабочие должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты и спецодеждой.

2.23. При перемещении траверсы в процессе монтажа кровли расстояние между ней и выступающими конструкциями покрытия должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали – не менее 0,5 м. При монтаже (раскатке) ленты ковра по ходу движения башенного крана расстояние от оси сердечника траверсы до плоскости покрытия должно быть не более 1,5 м.

1. Калькуляция затрат труда на устройство 100 м² ковровой кровли
(ковер типа Т-1)

Основание	Наименование работ	Норма времени на единицу измерения, чел.-ч	Расценка на единицу измерения, р.-к.
Местные нормы ЦНиС Главкиевгорстроя от 1986 г.	Очистка основания, укладка сборных железобетонных подкладочных элементов на постель из песка толщиной 20 мм (или из раствора), выравнивание поверхности основания песком (при необходимости), разбивка привязочных меток ковра, укладка насухо защитных подкладок, наклейка подкладок из гидробутила в местах водоприемных воронок и на карнизе, укладка ленты ковра траверсой с последующим развертыванием ковра вручную, укладка защитных фартуков и косынок в местах примыканий насухо с обработкой в местах стыковки, устройство соединительных швов между коврами с обустройством воронки, мелкий ремонт ковра (при необходимости), устройство разделительного слоя из битуминозного материала с раскаткой рулонаов насухо с укладкой временных пригрузов, укладка пригрузочного щебня при помощи контейнера, укладка сборных прижимных элементов насухо при помощи башенного крана, заделка швов раствором, перемещение материалов на расстояние до 30 м вручную, подача на кровлю контейнеров с кровельными элементами, ковром и сыпучими материалами башенным краном	12,25	6-76

Т а б л и ц а 2. Перечень работ, подлежащих пооперационному контролю

Операции, подлежащие контролю производите- лем работ	мастером (бри- гадиром)	Контроль качества выполнения операций		
		Состав операций	Способ контроля	Время
Приемка и контроль качества материалов	-	Проверка сертификатов на материалы и паспортов на сборный кровельный ковер и доборные элементы; проверка качества материалов	Визуально, при необходимости - в лабораторных условиях	До начала работ
	-	Подготовка оснований, устройство подстилающего слоя, обустройство чаш водоприемных воронок	Проверка соблюдения уклонов, толщин слоев, отсутствия бугров, впадин, острых выступов	Визуально, уровнем, трехметровой рейкой
	-	Укладка сборного ковра кровли	Проверка правильности укладки ковра, устройство отверстий под вентиляционные шахты и трубы, наличия усилений над воронками	Визуально
	-	Укладка бронирующих фартуков, косынок	Проверка правильности укладки фартуков, склейки по длине; ширины выхода фартуков на горизонтальный участок; качества герметизации примыканий к трубам	"
	-	Устройство разделительного слоя, укладка пригруза	Проверка правильности укладки полотнищ из рулонных материалов, соблюдения толщин слоя, однородности и чистоты пригруза	" То же

2.24. Разворачивать ленту ковра на покрытии у парапета следует, укладывая полосу края ковра от себя (кровельщик ориентирован лицом к наружной стене здания). В зимнее время и при отсутствии ограждения рабочие должны применять предохранительные пояса. Места закрепления поясов должны быть указаны мастером.

2.25. Укладку ковров следует производить одновременно с их проектным закреплением или установкой временных пригрузов. Перерывы после укладки временных пригрузов и проектным закреплением ковра не должен превышать времени, отведенного на отдых, обеденный или технологический перерывы.

2.26. Запрещается совмещение на одной эахватке работ, не связанных с устройством кровли (установка механизмов люлек при отделочных работах и пр.), а также размещение посторонних грузов.

2.27. Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, снегопада, тумана, грозы и ветра скоростью 15 м/с и более. Работы по укладке сборного кровельного ковра следует прекращать при скорости ветра 10 м/с.

2.28. Технико-экономические показатели на 100 м² кровельного покрытия следующие:

Затраты труда, чел.-смены	1,53
Стоимость кровли, руб.	6,76
Выработка на одного работающего в смену, м ²	66,36

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

3.1. Потребность в основных конструктивных элементах и материалах на 100 м² кровельного покрытия приведена в табл. 3. Потребность в сборных подкладочных и прижимных элементах устанавливается проектом кровельного покрытия.

Таблица 3

Элемент, материал	ГОСТ, ТУ	Количество
Цементно-песчаный раствор, м ³	ГОСТ 5802-86	0,1
Песок (подстилающий слой), м ³	ГОСТ 8736-85	1,9
Кровельный ковер типа Т-І с защитными фартуками (развертка), м ²		128,6
Рубероид (разделительный слой), м ²	ГОСТ 10923-82	107,5
Шебень крупностью 5-25 мм, м ³	ГОСТ 8267-82	3,4
Бутилкаучуковая мастика, кг	ТУ 21-27-90-83	2,8
Уайт-спирит, кг	ТУ 3134-78	0,5
Подкладки и накладки, м ²	ТУ 21-27-96-85	1,7
Стеклосетка, м	ТУ 6-II-99-75	0,5

3.2. Потребность в машинах, инструментах, инвентаре и приспособлениях приведена в табл. 4.

Т а б л и ц а 4

Наименование	Марка, ГОСТ, изготовитель	Количе-ство	Основной па-метр
Оборудование для устройства кровли			
Широкозахватная тра-верса для монтажа сборного ковра*	НИИСП Госстроя УССР	По за-явке	Грузоподъемность 3,0 т
Контейнер для рулон-ных материалов*	КЗ-ІГ, ЦНИИОМП Гос-строй СССР	То же	Грузоподъемность 1,0 т
Контейнер для добор-ных элементов* (брони-рующих фартуков, косы-нок)	ОР 5660, СКБ "Кассетдеталь" Главмосстроя	-"-	Грузоподъемность 0,4 т
Контейнер для сыпучих материалов (песка, щебня)*	НИИСП Госстроя УССР	-"-	Вместимость 2,5 м ³
Скребок для разравни-вания сыпучих матери-алов	Оргтехстрой Комитяжстрой Минтяжстроя СССР	2 шт.	-
Лопата подбороочная	ЛП-2, ГОСТ 3620-76	3 шт.	-
Кисть малярная	КМ-65, ГОСТ 10597-80	2 шт.	-
Нож кровельный	-	2 шт.	-
Ведро с крышкой	-	2 шт.	Вместимость 13 л
Рулетка измерительная	РС-20, ГОСТ 7502-80	1 шт.	-
Предохранительные приспособления по охране труда и технике безопасности			
Предохранительный пояс	ГОСТ 14185-77	3 шт.	-
Защитные очки с боко-выми щитками	-	3 пары	-
Каска "Труд" с двух-слойным подшлемником	-	5 шт.	-
Хлопчатобумажный костюм	ГОСТ 12.4.109- 82	5 шт.	-
Костюм со стеганным утеплителем	ГОСТ 12.4.109- 82	5 шт.	-

Окончание

Наименование	Марка, ГОСТ, изгото-витель	Количе-ство	Основной па-раметр
Специальные рукавицы, тип Е	ГОСТ 12.4.010-75	5 пар	-
Бензиностойкие перчатки		2 пары	
Кожаные ботинки или полусапоги	-	5 пар	-
Респиратор	РПР-67А, ГОСТ 12.4.004-74	3 шт.	-
Пожарный инвентарь			
Пенный огнетушитель	ОХП-10	2 шт.	-
Асbestosовое полотно	-	1 коврик площадью 3 м ²	-

3.3. Приемка законченной сборной кровли производится после контрольной проверки и тщательного осмотра ее поверхности, особенно у воронок и в местах примыканий к выступающим конструкциям.

При окончательной проверке кровли предъявляются данные о результатах лабораторных испытаний материалов; журнал производства работ; исполнительные чертежи покрытия и кровли; акты промежуточной приемки выполненных работ и натурного испытания водонепроницаемости кровли.

*Оборудование для комплектной поставки элементов кровли (собственность базы УПТК)

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Область применения	3
2. Организация и технология строительного процесса.....	4
3. Материально-технические ресурсы	16

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ГОССТРОЯ УССР

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА УСТРОЙСТВО ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СБОРНЫХ
КОВРОВЫХ КРОВЕЛЬ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ШИРОКОЗАХВАТНОЙ ТРАВЕРСЫ

Редактор И.В.Рыбальская

Технический редактор А.Н. Ясева

Корректор Л.Г.Трофименко

Сдано в производство 16.03.88. Формат бумаги 60x84¹/16.
Бумага типогр.Офсетная печать.Усл.печ.л.1,25,Уч.-изд.л.0,9.
Тираж 295 экз. Заказ 408. Изд.№ 4 Цена 20 к.

Научно-исследовательский институт
строительного производства Госстроя УССР,
252180, Киев-180, Краснозвездный пр. 51.
Типография НИИСП Госстроя УССР.
252180, Киев-180, ул. И.Клименко, 5/2.
