

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
ПРЕДПРИЯТИЙ ТЯЖЕЛОЙ ИНДУСТРИИ СССР

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

"ОРГТАЖСТРОЙ"

Шифр I.4.77

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  
НА МОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОН-  
СТРУКЦИЙ СВЯЗЕВОГО КАРКАСА  
СЕРИИ ИИ-04

Главный инженер института В.С. Уваров

Главный технолог института А.Ф. Шевченко

Начальник отдела ТС-2 Л.И. Малый

г. Ростов-на-Дону  
1977 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

стр.

I. Типовая технологическая карта на монтаж железобетонных конструкций связевого каркаса серии ИИ-04:	2
I. Область применения.	8
2. Организация и технология строительного процесса:	8
а. антикоррозийная защита стальных деталей,	15
б. герметизация стыков наружных стеновых панелей,	17
в. организация и методы труда работы,	19
г. ведомость объемов и трудоемкостей работ,	20
д. календарный график монтажа элементов каркаса с применением 2 групповых кондукторов на 4 колонны,	21
е. калькуляция трудовых затрат,	22
ж. методы и приемы работ,	27
з. качество работ,	33
и. пооперационный контроль качества монтажа колонн и ригелей,	35
к. пооперационный контроль качества монтажа плит перекрытия и покрытия,	36
л. пооперационный контроль качества работ при монтаже панельных гипсокартонных перегородок,	37
м. пооперационный контроль качества монтажа железобетонных лестниц,	38
н. пооперационный контроль качества монтажа стеновых панелей зданий,	39
о. техника безопасности.	40
3. Технико-экономические показатели.	42
4. Материально-технические ресурсы:	43
а. потребность в основных конструкциях и материалах	43

	стр.
б. машины, оборудование, инструмент, приспособления,	44
в. потребность в эксплуатационных материалах .	49
5. Стройгендплан.	50
6. Последовательность перестановки 2-х групповых кондукторов в процессе монтажа.	51
7. Последовательность монтажа колонн, ригелей, диафрагм, связевых плит, перегородок и рядовых плит.	52
8. Шлан.	53
9. Схемы монтажа колонн, ригелей, плит перекрытия.	54
I0. Схема раскладки и план последовательности монтажа стенных панелей.	55
II. Схемы строповок колонн, ригеля, стенных панелей, диафрагм жесткости, лестничного марша, плит перекрытия.	56
I2. Схемы строповок перегородок, плит перекрытия, кондуктора, ящика с раствором.	57
I3. Схемы организации рабочих мест при монтаже колонн, ригелей.	58
I4. Схемы организации рабочих мест при монтаже связевых плит перекрытий, рядовых плит перекрытий.	59
I5. Схемы организации рабочих мест при монтаже диафрагм жесткости и лестничного марша .	60
I6. Схема организации рабочих мест при монтаже панели перегородки под ригель.	61
I7. Схема организации рабочего места при монтаже под связевые плиты.	62
I8. Схема организации рабочего места при монтаже перегородок.	63
I9. Схемы организации рабочих мест при установке ленточной панели, простеночной панели, угловой панели и при герметизации стыков панелей стен.	64

стр.

П. Типовая технологическая карта на полуавтоматическую и ручную электродуговую сварку монтажных стыков железобетонных конструкций серии ИИ-04;	65
1. Область применения.	66
2. Организация и технология процесса сварки .	67
а. технология полуавтоматической ванной сварки под слоем флюса стыковых соединений вертикальных стержней,	67
б. технология полуавтоматической и ручной ванной сварки горизонтальных стержней арматуры.	70
в. режимы ручной дуговой ванной сварки,	72
г. техника ручной дуговой ванной сварки стыковых соединений горизонтальных стержней арматуры,	71
д. техника полуавтоматической ванной сварки горизонтальных стержней арматуры,	72
е. технология ручной дуговой сварки протяженными швами .	80
ж. места прихваток и порядок наложения швов,	81
з. методы и приемы труда,	81
и. методы и приемы труда при ванной сварке вертикальных стержней арматуры.	82
к. методы и приемы труда при сварке горизонтальных стержней арматуры и сварке протяженными швами ,	83
л. калькуляция трудовых затрат.	84
м. правила приемки и контроль качества работ ,	86
н. техника безопасности.	90
3. Технико-экономические показатели сварочного процесса .	92
4. Материально-технические ресурсы.	94
5. Схема производства работ.	96

стр.

6. ванная сварка вертикальных стержней арматуры,	91
7. стык колонны с ригелем,	98
8. стык связевых плит,	99
9. узел примыканий диафрагм жесткости между собой,	100
10. узел опирания пристенной плиты перекрытия (ГК 8-58-9, ГКВ-28-9) на металлический столик.	101
<b>III. Технологическая карта на омоноличивание стыков колонн серии ИИ-04 самоуплотняющимся раствором;</b>	<b>104</b>
1. Область применения	106
2. Организация и технология строительного процесса:	107
а. организация и методы труда работы,	110
б. методы и приемы работ,	110
в. техника безопасности,	112
3. Технико-экономические показатели.	115
4. Машины, оборудование, инструмент, приспособления .	116
5. Калькуляция трудовых затрат.	118
6. Схема организации рабочего места при омоноличивании стыков колонн.	119
7. Стыки.	120
8. График производства работ.	121
<b>IV. Приложение к комплексной технологической карте на монтаж сборных железобетонных конструкций связевого каркаса серии ИИ-04 :</b>	<b>122</b>
1. Кондуктор на 4 колонны:	123
а. паспорт.	123
б. технические условия,	133
в. сборочный чертеж .	144
2. Приспособление для монтажа перегородок.	145
3. Описание изобретения к авторскому свидетельству 497397.	146

стр.

4. Упор для монтажа гипсобетонных перегородок Н-2500.	150
5. Опалубка термоактивная "Стык-400":	153
а. паспорт,	153
б. технические условия,	161
в. сборочный чертеж,	180
6. Инструкция по применению раствора М-300 для замоноличивания стыков колонн.	181

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
ПРЕДПРИЯТИЙ ТЯЖЕЛОЙ ИНДУСТРИИ СССР  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  
ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
"ОРГТАЕСТРОЙ"

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на омоноличивание стыков колонн серии ИИ-04  
самоуплотняющимся раствором (песчаным бето-  
ном) №-300 с применением греющей опалубки  
"Стык-400"

Главный инженер института *Уваров* В.С.Уваров  
Зам.главного инженера  
института *Шевченко* А.Ф.Шевченко  
Начальник отдела ТС-2 *Малый* А.Н.Малый

г.Ростов-на-Дону  
1977 г.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
ПРЕДПРИЯТИЙ ТЯЖЕЛОЙ ИНДУСТРИИ СССР  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
"ОРГТАСТРОЙ"

Тема: Разработка новых типов опалубки с  
опытным внедрением на объектах Мин-  
тяжстроя СССР

Результат I: Рабочие чертежи опалубок для  
замоноличивания стыков сборных  
железобетонных каркасных зданий

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на замоноличивание стыков колонн серии ИИ-04 самоуп-  
лотняющимся раствором (песчаным бетоном) №-300 с  
применением греющей опалубки "Стык - 400"

Главный инженер института Горбачев В.С.Уверов  
Зам.главного инженера Горбачев А.Ф.Шевченко  
Начальник отдела ТС-2 Малый А.Н.Малый

г.Ростов-на-Дону  
1977 г.

## Технологическая карта

106

Омоноличивание стыков колонн серии ИИ-04  
самоуплотняющимся раствором (песчаным бето-  
ном) М-300 с применением греющей опалубки  
"Стык - 400"

### I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

I.1. Технологическая карта разработана на омоноличива-  
ние стыков колонн серии ИИ-04 (связевый вариант) самоуплот-  
няющимся раствором (песчаным бетоном) М-200 + 300 в термо-  
активной (греющей) опалубке "Стык - 400" ("Стык - 300") при  
строительстве типовых каркасных зданий.

I.2. В работе используются 3 комплекта опалубки "Стык-  
-400" одновременно.

В комплект опалубки входят понижающие трансформаторы  
тока, количество которых зависит от числа используемых опа-  
лубок:

для одной опалубки используется трансформатор ТБС-320  
мощностью 400 ва, весом 13 кг;

для двух опалубок - ТБС - 410 мощностью 800 ва, весом  
21 кг;

для четырех опалубок - ТБС - 420 мощностью 160 ва, ве-  
сом 41 кг, Минского электротехнического завода.

I.3. Омоноличивание стыков выполняется звеном в составе  
2-х человек при темпе работ 9 стыков в смену, в летний пе-  
риод, при помощи агрегата СО-57 ГОСТ 14095-68 (раствороме-  
шалка с растворонасосом).

Разработана Цен- тральным проекти- онно-техническим институтом "Орг- тяжстрой" Мин- тяжстроя СССР	Утверждена Главным управлением Минтяжстроя СССР	Срок введения:
--	---	----------------

1.4. При привязке технологической карты к местным условиям уточняются объемы работ, средства механизации и потребность в материальных ресурсах.

## 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

2.1. До начала работ по омоноличиванию стыков колонн должны быть выполнены следующие работы:

- смонтированы колонны, которые будут омоноличиваться;
- сварены арматурные стержни колонн и приварены обвязочные хомуты со стержнями арматуры;
- проведены мероприятия по антикоррозийной защите;
- подготовлены и размещены в зоне работы: опалубка, установка СО-57 для приготовления и подачи раствора, инвентарь, приспособления,

2.2. Работы по омоноличиванию стыков ведутся в следующей последовательности:

- подготовка стыка к омоноличиванию;
- приготовление раствора (песчаного бетона);
- установка опалубки;
- омоноличивание стыка колонн;
- подключение опалубки и прогрев стыка;
- снятие опалубки и уход за стыком.

2.3. Перед установкой опалубки следует произвести очистку загрязненных полостей стыков с помощью металлических скребков и щеток с дальнейшей продувкой полостей струей сжатого воздуха или промывкой струей воды. Скопление воды после промывки и посторонние предметы должны быть удалены.

2.4. Для замоноличивания стыков колонн применяется инъекционный раствор М-300.

Рекомендуемый расход материалов на 100 литров раствора.

Портландцемент Ц-500	- 60 кг
Шеок речной с модулем крупности I	- 115 кг
Вода	- 35 л
Алюминиевая паста	- 0,01 кг
Сульфито-спиртовая барда	- 0,1 кг
Осадка конуса раствора	- II-II см

Алюминиевая паста получается путем смешивания алюминиевой пудры, воды и хозяйственного мыла (соотношение 1:1:0,1).

Порядок приготовления раствора (песчаного бетона) в построенных условиях описан в "Инструкции по приготовлению инъекционного раствора "М-300" для замоноличивания стыков колонн", прилагаемой к технологической карте.

2.5. Перед установкой опалубки её внутреннюю поверхность покрывают смазкой, не портящей конструкцию опалубки (известковое молоко, глина).

При установке опалубки её раздвигают по размеру колонны, охватывают стык, стягивая опалубку зажимами для предупреждения соскальзывания её вниз, далее имеющимися на опалубке приспособлениями затягивают её до необходимой плотности прилегания к поверхности колонны.

Во избежание вытекания раствора и цементного молока щели между бетоном и опалубкой снизу уплотняются резиновым жгутом.

2.5. Бодача раствора в опалубку осуществляется растворонасосом агрегата СО-57. Открывается заглушка на вводном штуцере опалубки и подключается к штуцеру шланг растворонасоса.

Заглушка штуцера закрывается при появлении раствора в контрольной трубке, находящейся в верхней части опалубки и одновременно выключается растворонасос. Через 0,5-1 минуту после первой закачки операция подачи раствора в стык повторяется.

2.6. Подключение опалубки к источнику питания осуществляется при помощи штепсельного соединения ИЭ-9903 ТУ-22. 175.004-75.

Электрический ток напряжением 36 в, проходя через углеродитовую ткань УУТ-2, проложенную между двумя слоями резины в стенке опалубки, разогревает стенки опалубки до температуры 70-80°С.

Температурный режим поддерживается периодическим включением и отключением электрического тока.

Время прогрева зависит от температуры окружающей среды и составляет в летнее время года 1,5 - 2 часа, в зимнее - 3-4 часа.

2.7. После снятия опалубки осматривается поверхность стыка, если имеются неровности стыка их заделывают цементным тестом (1 кг цемента и 0,34 воды по объему). Раковины, обнаруженные после снятия опалубки, расчищают и заделяют раствором состава 1:2 (цемент: песок) по объему.

Уход за стыком заключается в следующем:

- стык укрывается влажным полотенцем (рогожа, мешковина), которое периодически поливается водой.

2.8. Особенности заделки стыков в зимних условиях.

2.8.1. Очистку от снега стыкуемых поверхностей можно производить механическими щетками, например, типа МОН-17, выпускаемых Тульским заводом "Строймеханизации".

Удаление наледей рекомендуется осуществлять струей горячего воздуха, либо с помощью греющей опалубки. Использование пара и горячей воды запрещается.

**2.8.2.** Стыки колонн рекомендуется замоноличивать с предварительным отогревом стыкуемых элементов в греющей опалубке.

После установки опалубки вначале стык прогревается, затем полость стыка заполняется раствором, после чего осуществляется электропрогрев раствора заделки до приобретения раствором требуемой прочности.

### 2.9.. Организация и методы труда работы.

**2.9.1.** Состав звена по профессиям и распределение работы по исполнителям.

Состав звена	Кол-во человек	Перечень работ
Монтажники	2	Дозировка и разгрузка составляющих в растворомешалку, подготовка стыка к моноличиванию, установка и снятие опалубки, подключение и отключение опалубки, моноличивание стыка, уход за стыком, промывка шлангов, очистка опалубки
Машинист агрегата СО-57	I	Обслуживание агрегата

### 2.9.2. Методы и приемы работ

Звено, выполняющее моноличивание стыков колонн, состоит из 2-х человек.

Монтажник  $M_1$  - III р.

Монтажник  $M_2$  - IV р.

Агрегат СО-57 обслуживается машинистом M-IU разряда.

Монтажник  $M_1$  удаляет грязь, сварочный флюс и шлак с поверхностей колонны и арматуры, зачищает арматуру и полость

стыка металлической щеткой, скребком, промывает полость стыка струей воды, удаляет остатки посторонних предметов и воды.

Монтажники  $M_1$  и  $M_2$  занимаются приготовлением инъекционного раствора.

Монтажник  $M_1$  перед установкой опалубки покрывает внутреннюю поверхность смазкой.

Установивая опалубку монтажники  $M_1$  и  $M_2$  раздвигают её по размеру колонны, схватывают стык, стягивая опалубку зажимами.

Монтажник  $M_1$  открывает заглушку из водного штуцера опалубки, монтажник  $M_2$  подключает к штуцеру шланг растворонасоса. Машинист  $M$  включает растворонасос и закачивает раствор в опалубку. Монтажник  $M_2$  следит за контрольной трубкой, находящейся в верхней части опалубки, и при появлении в ней раствора закрывает заглушку штуцера, машинист  $M$  в это время выключает растворонасос. Через 0,5 - 1 минуту после первой закочки операция подачи раствора в стык повторяется.

Монтажник  $M_2$  подключает опалубку к источнику питания и все монтажники переходят для замоноличивания следующего стыка. Через 1,5 - 2 часа монтажник  $M_2$  отключает опалубку.

Монтажники  $M_1$  и  $M_2$  освобождают опалубку от зажимов, раздвигают стенки опалубки и осторожно, чтобы не повредить углы, снимают опалубку с колонны; осматривают поверхность стыка, устраняют дефекты и переносят опалубку к следующему стыку.

Монтажник  $M_2$  стык укрывает влажным полотенцем (рогожа, мешковина), которое периодически поливает водой.

## 2.10. Качество работ

2.10.1. После снятия опалубки качество омоноличенных стыков проверяется визуально на монолитность и соответствие основным геометрическим размерам. Дефектные места расчищаются, наплыты раствора должны быть удалены, раковины заделаны.

2.10.2. Контроль прочности бетона осуществляется путем контроля за выдерживанием температурного режима и проверки марочной прочности раствора путем выдерживания в нормально-влажностных условиях и испытания контрольных образцов в соответствии с ГОСТ 18105-72,

## 2.II. Техника безопасности.

2.II.1. При производстве работ необходимо выполнять правила по технике безопасности, предусмотренные СНиП Ш. А-II-70 и требования указанные ниже.

2.II.2. При установке опалубки на крайних колоннах использовать инвентарные навесные люльки.

2.II.3. Не работать у открытых проемов в перекрытиях без установки инвентарных щитов настила, в стенах - без установки щитов ограждений.

2.II.4. Здание по периметру должно иметь тросовое ограждение.

2.II.5. При затяжке винтов разрешается работать только исправным инструментом.

2.II.6. Перед установкой опалубки необходимо произвести осмотр для выявления дефектов изоляции, произвести проверку соответствия напряжения сети номинальному напряжению панелей опалубки.

2.II.7. При повреждении изоляции эксплуатация опалубки запрещена!

2.II.8. Эксплуатация и хранение панелей опалубки допускается при температуре окружающего воздуха от минус 60° до + 40°.

2.II.9. При эксплуатации греющей опалубки следует руководствоваться "Правилами технической эксплуатации и

правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

2.II.10. К работе с растворонасосом допускаются рабочие, достигшие 18 лет и прошедшие:

- медицинский осмотр;
- вводный инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и пожаробезопасности;
- инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

2.II.11. Машинист растворонасса комплексной бригады должен быть проинструктирован и обучен безопасным приемам по всем видам работ, выполняемых им.

2.II.12. Машинист растворонасса должен содержать в порядке рабочее место в течение всего рабочего дня. Запрещается произволить работы в неосвещенных или затменных местах.

2.II.13. Рабочее место машиниста растворонасса должно быть связано звуковой или световой сигнализацией с рабочими местами, куда подается раствор.

2.II.14. Машинист растворонасса и монтажник, который подключает шланг к опоре должны иметь очки с небьющимися стеклами и плотно прилегающие к лицу.

2.II.15. Машинист растворонасса перед работой обязан:

- осмотреть растворонасос и все болтовые соединения, особенно штуцера, подшипники, сальники;
- проверить затяжку всех гаек;
- залить воду (промежуточную жидкость) в полость насосной камеры;

- проверить исправность ограждений у вращающихся частей растворонасоса;
- проверить растворонасос;
- осмотреть линию растворопровода;
- устраниТЬ изломы шланга и петли;
- проверить плотность соединений в стыках шлангов;
- проверить герметичность соединения всасывающего шланга с емкостью для раствора;
- периодически смазывать трещицеся части растворонасоса;
- следить за показаниями манометра;
- своевременно устранять люфты в подшипниках производного механизма и не допускать износа частей растворонасоса;
- после окончания работ машинист обязан промыть насос и растворопровод водой или известковым молоком;
- механизмы растворонасоса необходимо постоянно осматривать, очищать от раствора, грязи, пыли;
- машинисту растворонасоса запрашивается устанавливать или заменять электролампы, а в качестве переносных ламп необходимо применять специальные светодиодники заводского изготовления напряжением не выше 36в;
- машинист растворонасоса должен иметь вторую квалификационную группу по технике безопасности.

2.11.1.6. Из силовых трансформаторах все выводы и вторичные обмотки должны быть закорочены и заземлены, корпус трансформатора тоже должен быть заземлен.

2.11.7. Перед включением опалубки проверить наличие

заземляющего провода в штепельном соединении (третья жила подводящего кабеля).

2.II.18. Присоединение переносных заземлений к заземляющей проводке должно выполняться сваркой или надежным болтовым соединением.

2.II.19. Трансформаторы подключаются к сети через рубильник. Опалубка отключается после выключения общего рубильника.

2.II.20. Трансформаторы следует отключать как со стороны высокого, так и со стороны низкого напряжения, чтобы предупредить обратное трансформирование низкого напряжения.

2.II.21. Отключение заземления должно производиться вначале с токоведущей части, а затем от заземляющего устройства.

2.II.22. Подключение трансформаторов и кабелей греющей опалубки к трансформаторам должно производиться электромонтерами с квалификационной группой по технике безопасности не ниже ІУ.

### 3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

Трудоемкость заделки I стыка - 0,22 чел.дн.

Выработка на одного рабочего в смену - 4,5 стыка

Потребность машин СО-57 - I маш-смена

Расход электроэнергии на подогрев I стыка - 0,8 - I квт - час

**4.1. Машины, оборудование, инструмент,  
приспособления**

**Таблица**


№ пп	Наименование	Тип	Марка, ГОСТ	Коли- чество во	Техническая характеристика машин
I	2	3	4	5	6
1.	Растворомешалка с растворонасосом		ГОСТ 14095-68 СО-57	I	
2.	Опалубка	грею- щая	"Стык-400" Институт "Оргтяж- строй" ОТС-2 118.00.000		
3.	Трансформатор тока		ТБС-410	I	Мощность 800ва, Минский электро- технический завод
4.	Шланг Ø 38			15 м	
5.	Штуцер для шланга			I	
6.	Зажимы для шланга			2	
7.	Провод силовой для подключения транс- форматора и опалуб- ки				3-я жила зазем- ляющая 100м
8.	Суспензатор для пе- ремещивания алюминие- вой пасты		институт "Оргтяж- строй"	I	
9.	Скребок для ухода за стыком			I	
10.	Зубило			I	
11.	Кувалда			I	
12.	Скребки			2	

п/п	Наименование	Тип	Марка, ГОСТ	К-во	Техническая характеристика
1	2	3	4	5	6
13.	Щетки металлические			2	
14.	Ведра			4	
15.	Лопата		ЛКО-2 ГОСТ 3620-63	2	
16.	Кельма		КШ ГОСТ 9533-71	I	
17.	Полутерка	деревян- ная	ПД- 350	I	
18.	Рогожа или мешковина				
19.	Метр складной		ГОСТ 7253-54	I	
20.	Пассатижи			I	
21.	Молоток слесарный			I	
22.	Ключи разные			I компл.	
23.	Конус для определения пластичности раствора			I	
24.	Монтажный пояс			2	
25.	Ящик для песка			I	
26.	Емкость для цемента			I	
27.	Емкость для алюминиевой пасты			I	

## КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ


Обосно- вание (ЕНИР и др.)	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Время- ты работ	Норма затра- ти на мост	Стои- ка на мост	Едини- ца из- мене- ния	Затрат
				еед.из-на работ	цца из- работ	на весь мост		
				мере- весь	мере- на весь			
§ 4-1-42 № 5	Очистка бетон- ной поверхности стыка стальными щетками	100 м <sup>2</sup>	0,04	1,95	0,08	0-96,1	0-038	
§ 8-5 № 2,2д	Срубка наплывов бетона	100 м <sup>2</sup>	0,04	26	1,04	12-42	0-50	
Местн. нормы	Установка опалуб- ки, омоноличива- ние стыка	стык	9	0,602	5,5	0-40	3-60	
Местн. нормы	Снятие опалубки	стык	9	0,12	1,08	0-10	0-90	
§ 4-1-42 № 7, 8,10	Уход за стыком, покрытие матами, полив водой, сня- тие матов	100 м <sup>2</sup>	0,07	0,58	0,1	0-27	0-10	
§ 4-1-48 № 9 к=0,5	Устранение дефек- тов на поверхнос- ти стыка	м <sup>2</sup>	4,0	0,09	0,36	0-05	0-20	
Местн. нормы	Подача материалов для приготовления раствора	стык	9	0,20	1,8	0-15	1-35	
§ 3-18 № 1а, 3а к= 2	Приготовление раст- вора с загрузкой ковша раствороме- шалки вручную, с дозировкой состав- ляющих	м <sup>3</sup>	0,5	3,32	1,66	1-71,4	0-80	
Местн. нормы	Промывка шлангов	100 м	0,75	2,3	1,7	1-20	0-90	
По хро- номет- ражу	Установка и переба- зировка оборудова- ния на новую стоян- ку	2	0,25	0,5	0-16	0-32		
	Итого на 9 стыков				13,82		8-77	
	Итого на 1 стык				1,54		0-97	

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА ПРИ ОМОНОЛИЧИВАНИИ СТЫКОВ КОЛОНН



M5, M6 - монтажники  
Ma - машинист агрегата  
1 - опалубка "Стандарт-400"  
2 - трансформатор ТБС-420;  
3 - агрегат CD-57;


СТЫК КОЛОНН

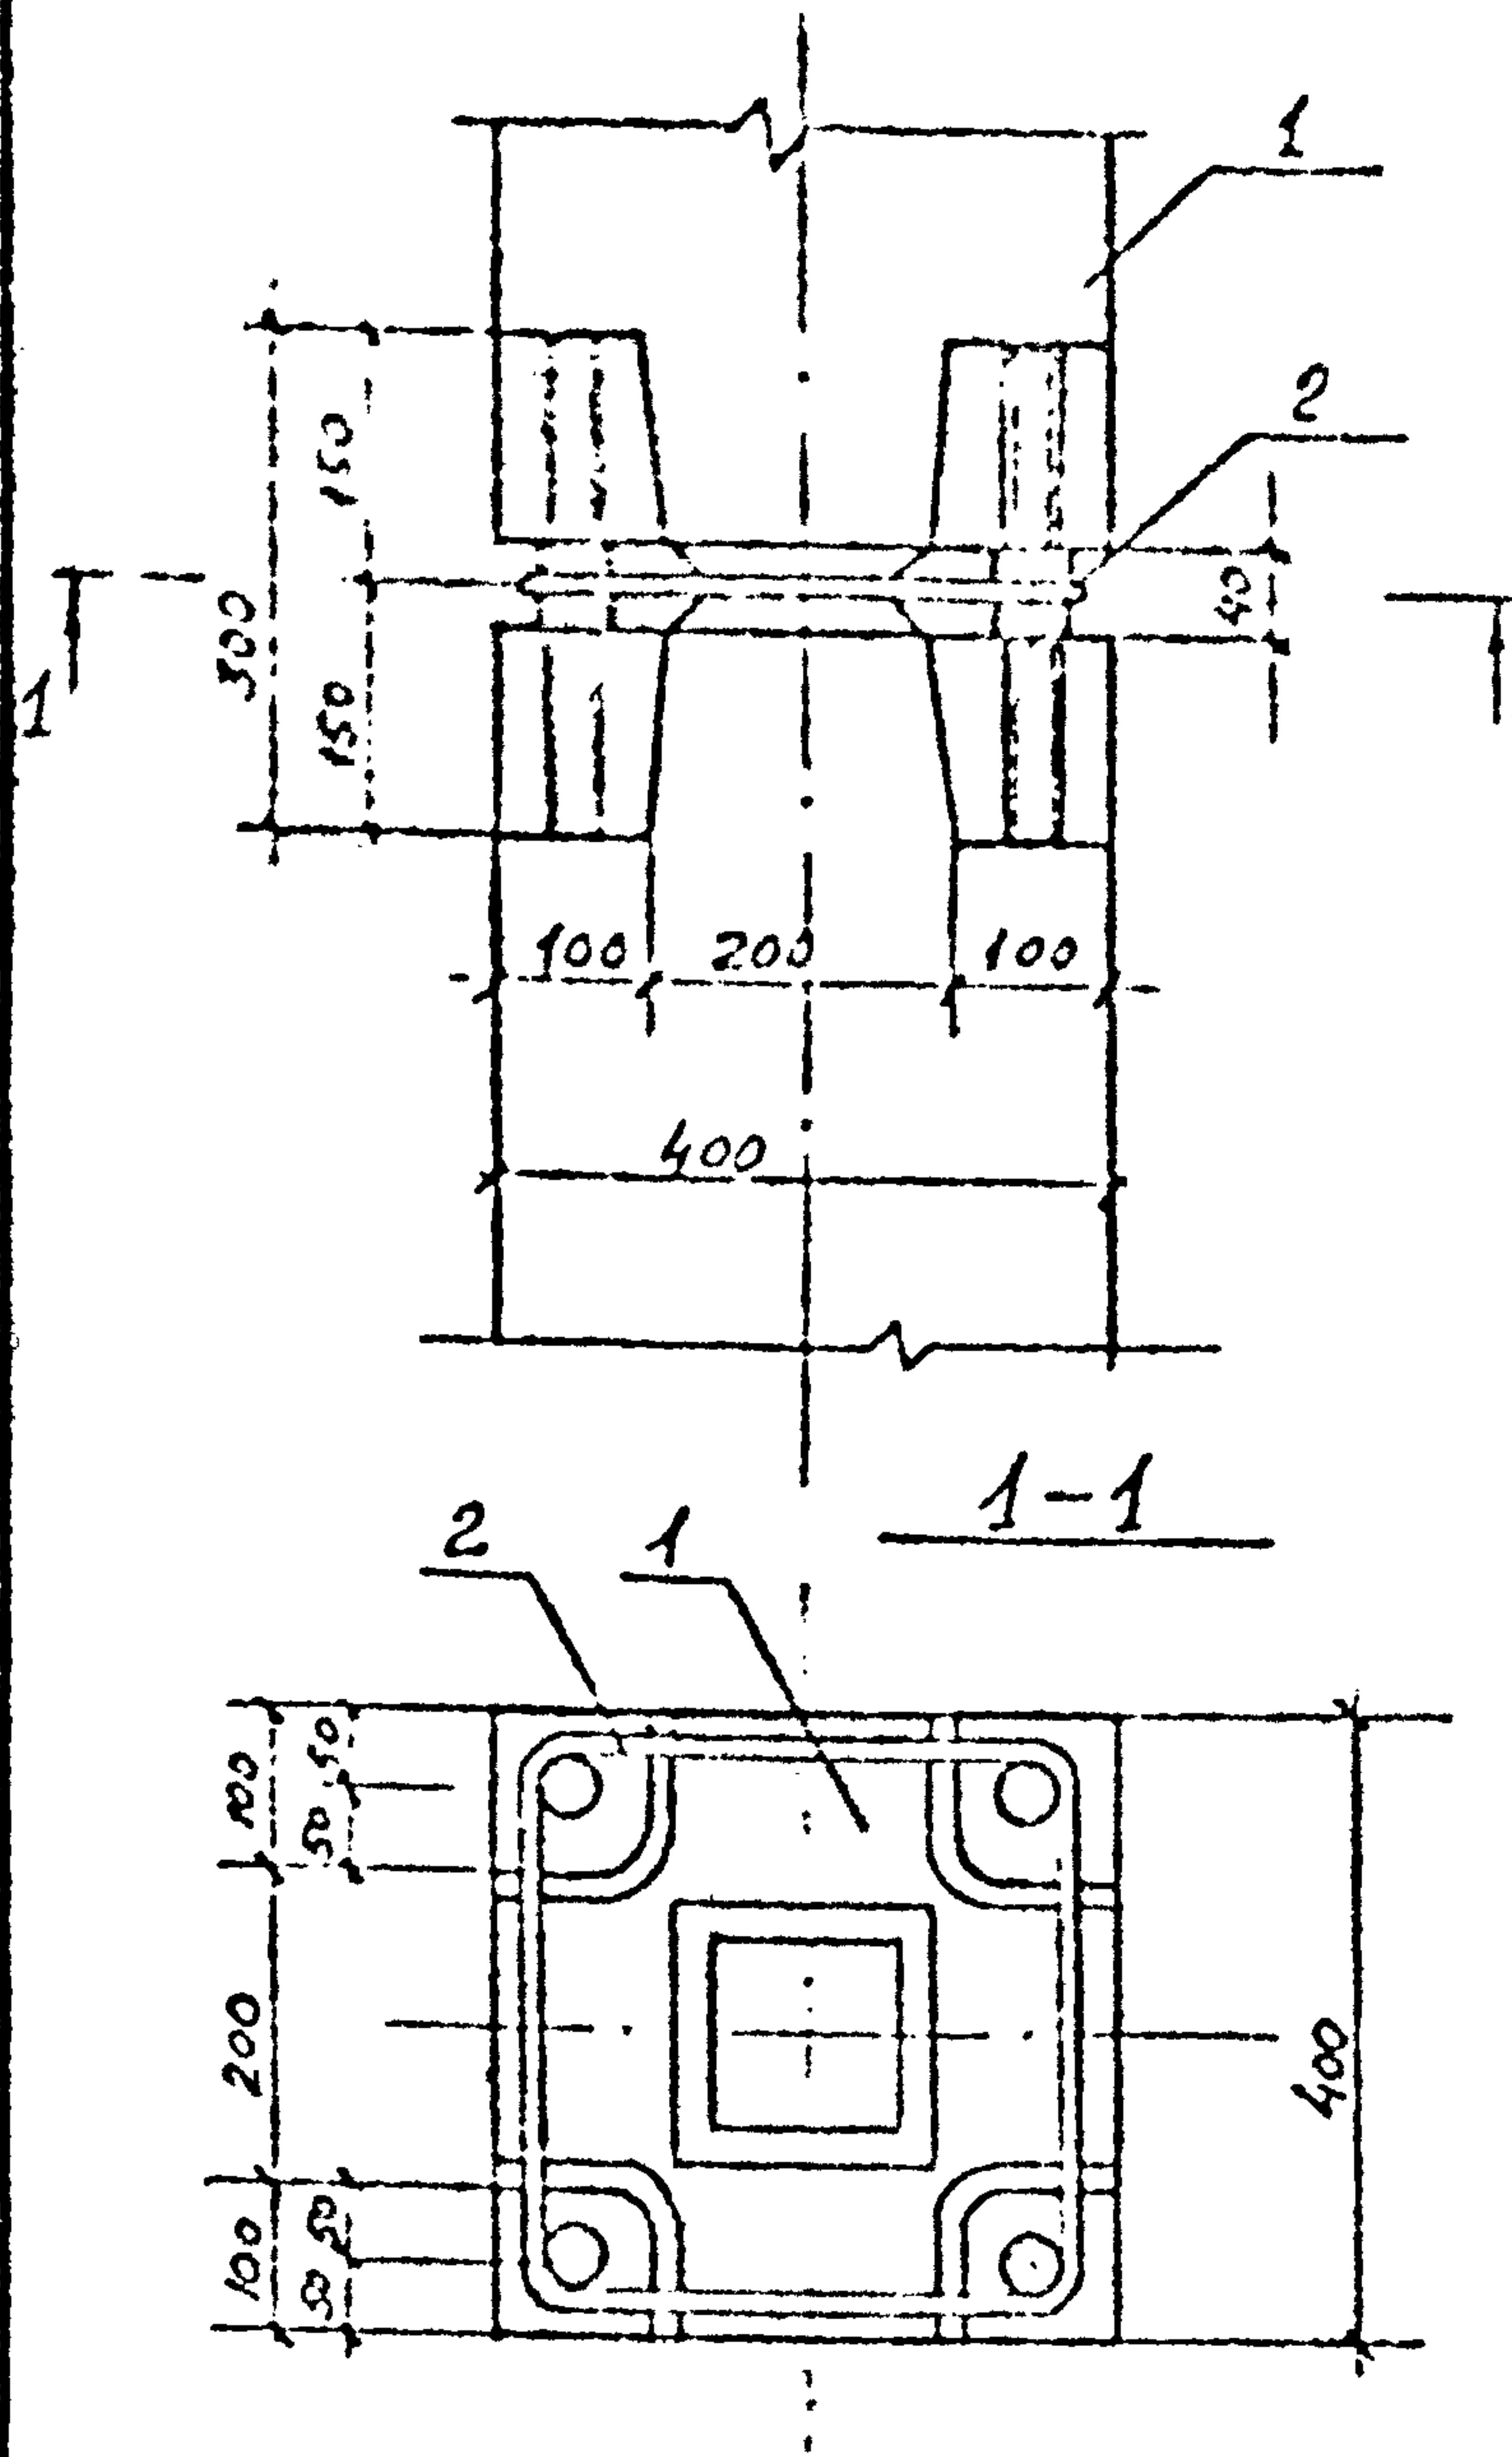ЭКСПЛИКАЦИЯ

- 1 - колонна
- 2 - хомут
- 3 - раствор омоноличивания

РИС. 2

ОПАЛУБКА

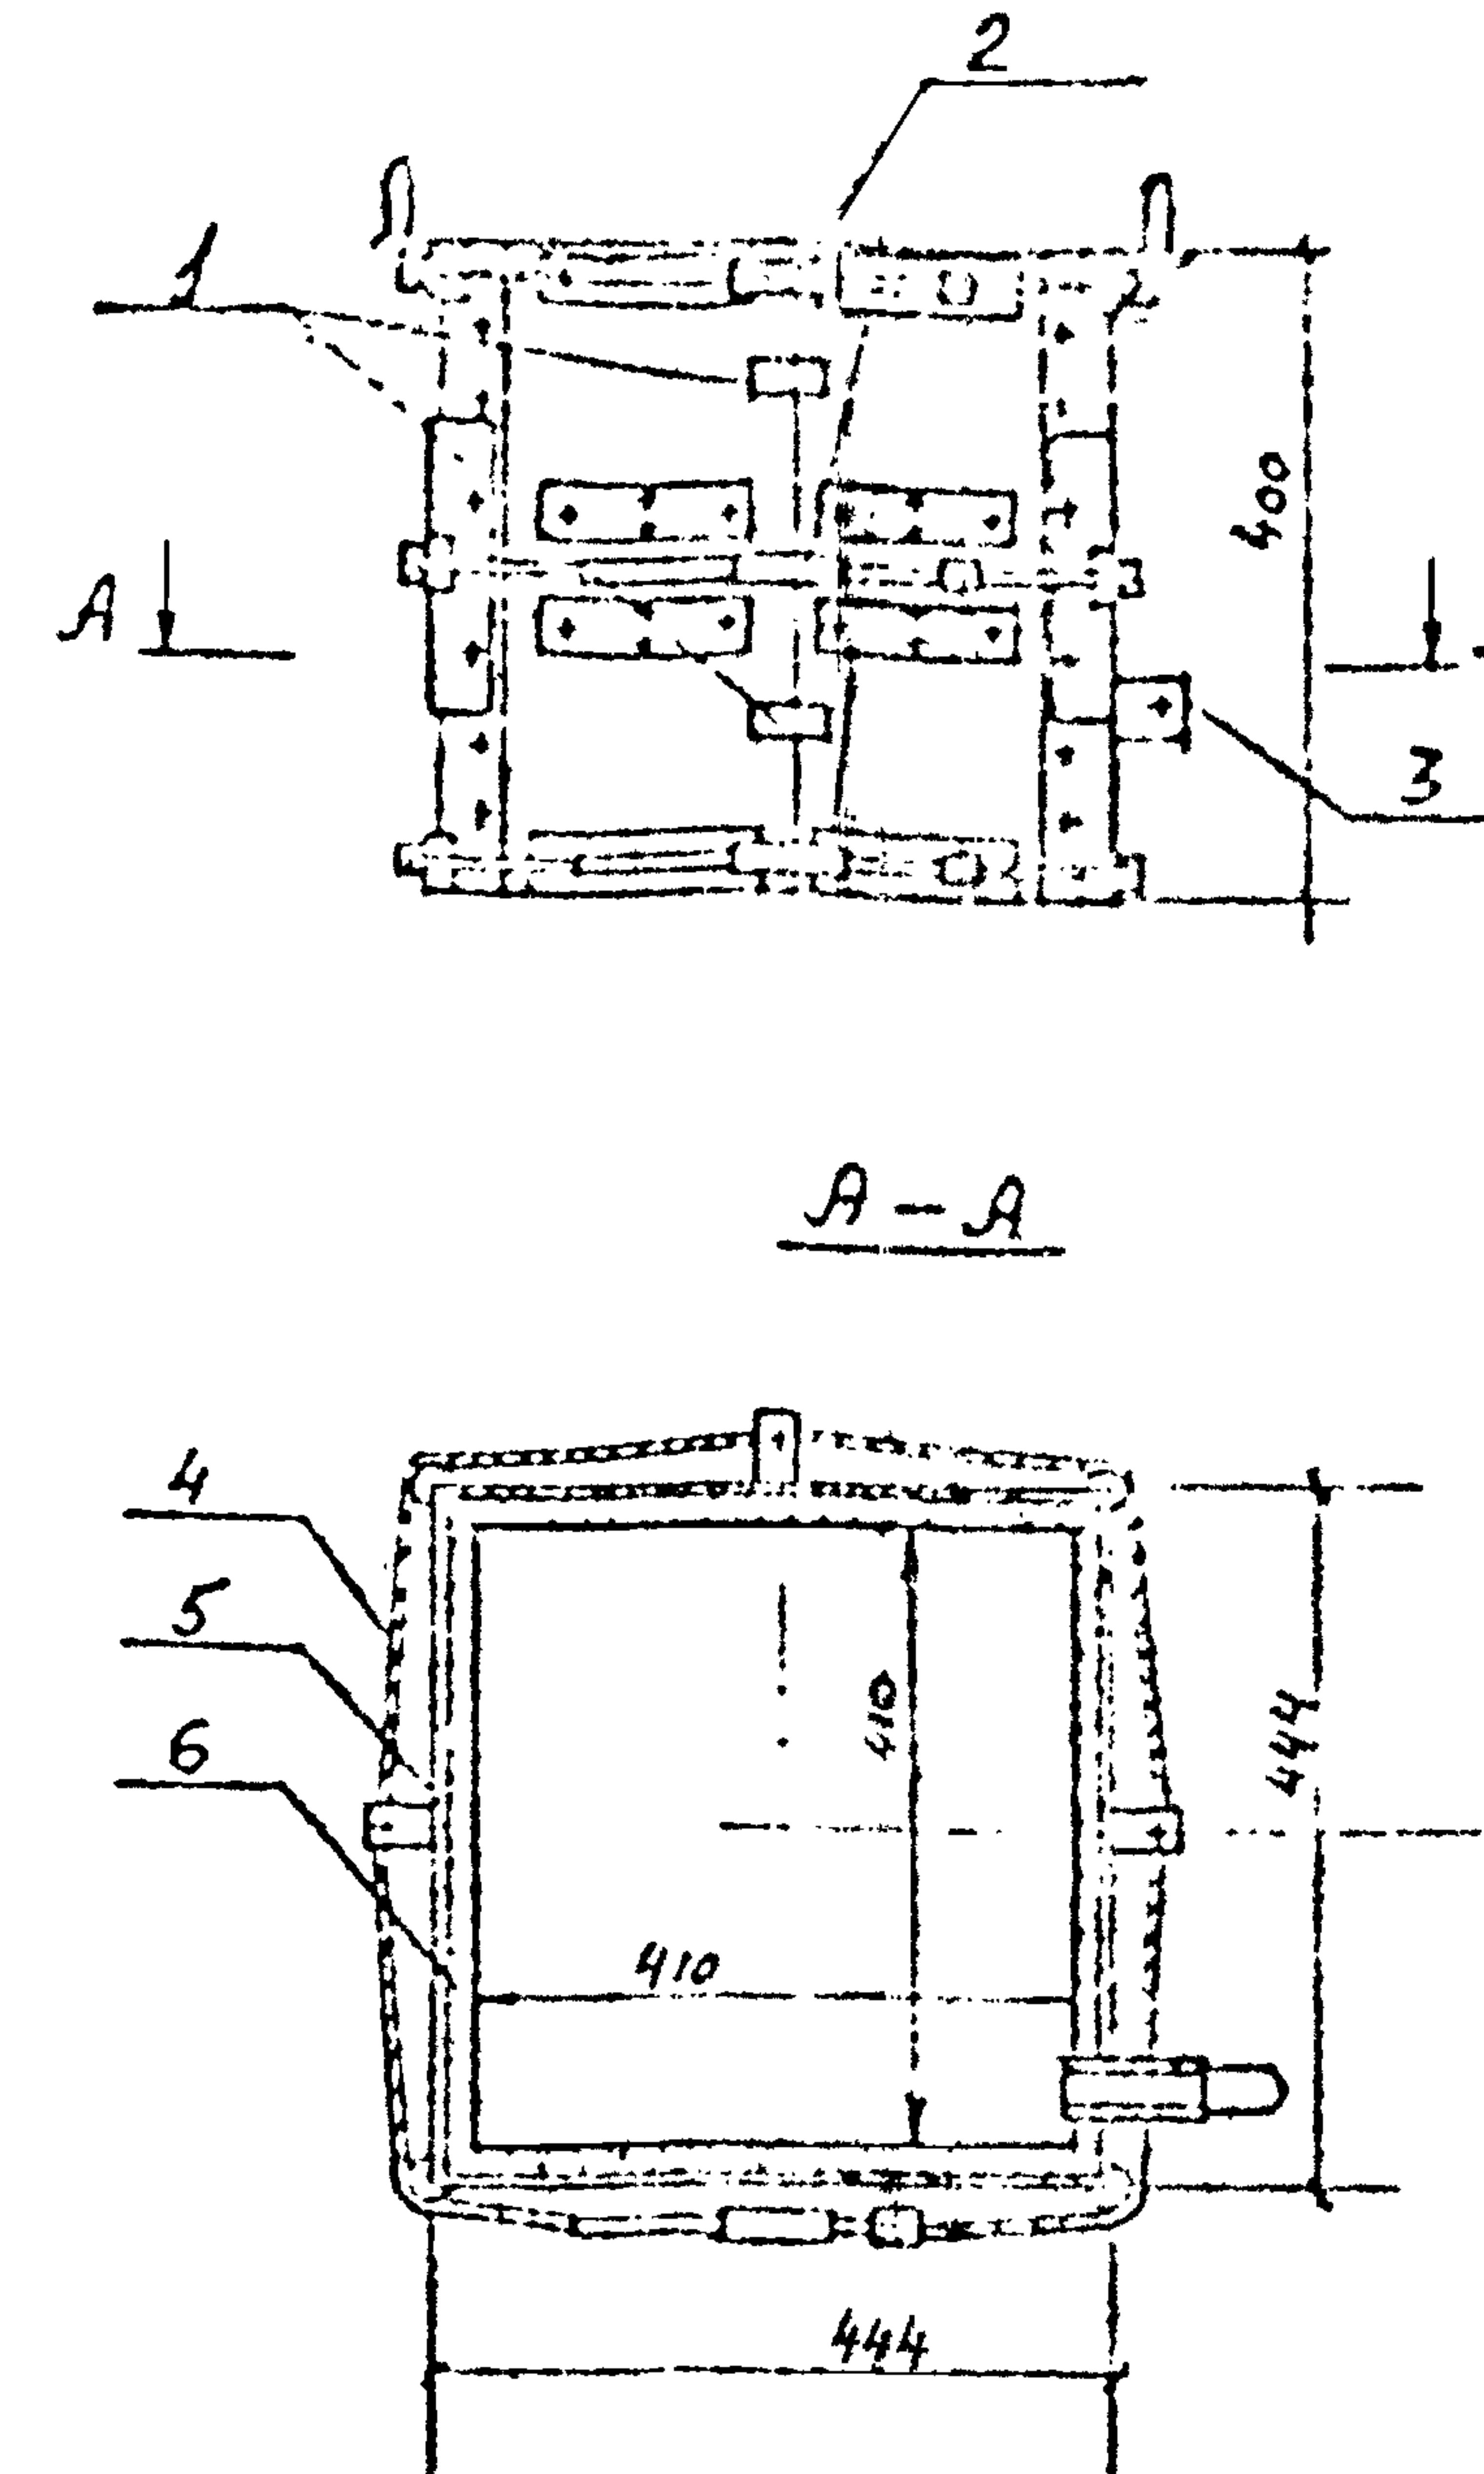ЭКСПЛИКАЦИЯ

- 1 - задний
- 2 - винт
- 3 - штыцер
- 4 - трос
- 5 - внешн. слой  
резины
- 6 - внутр. слой  
резины

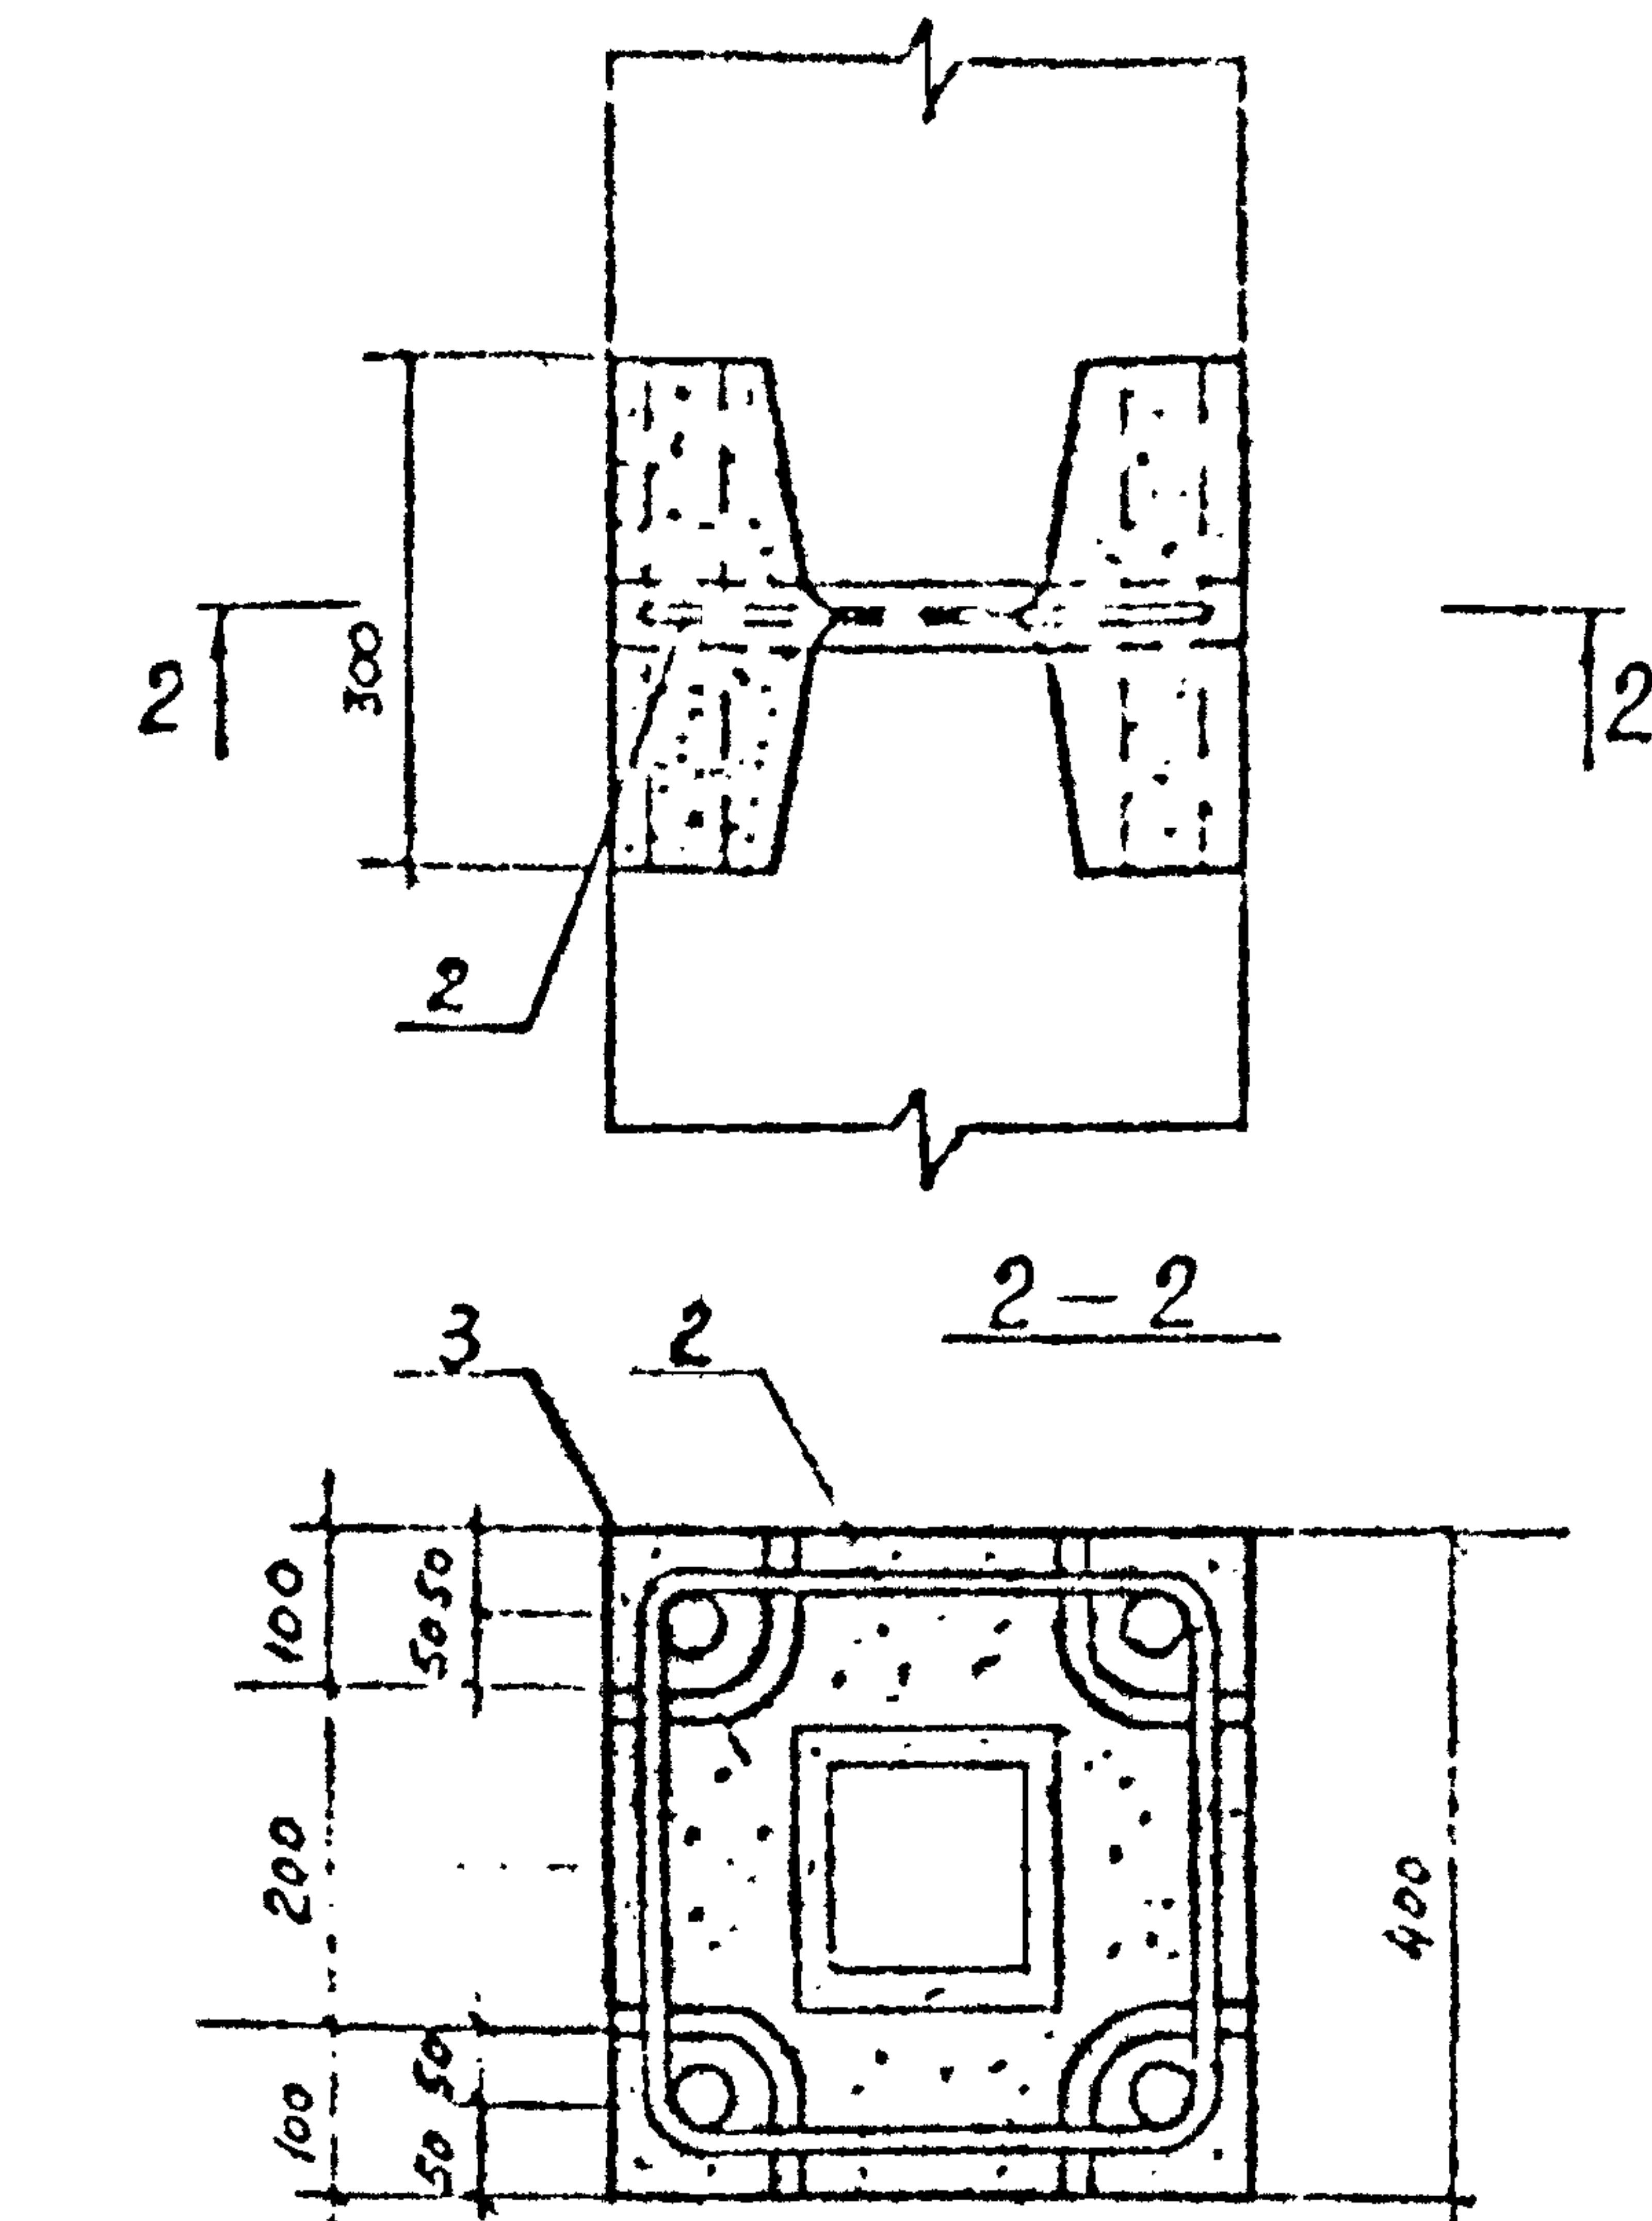
РИС. 3СТЫК КОЛОНН ПОСЛЕ  
ОМОНОЛИЧИВАНИЯРИС. 4

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА 9 СТЫКОВ ТРЕМЯ ОПАЛУБКАМИ

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕДИН. ИЗМЕР.	ОБЪЕМ РАБОТ	ТРУДОЕМ- КОСТЬ НА ОБЪЕМ В ч/ЧИС	СОСТАВ ЗВЕНА ЧИСЛ.	РАБОЧИЕ ЧАСЫ																	
					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
					10	20	30	40	50	60	10	20	30	40	50	60	10	20	30	40	50	60
Подготовка стыков к омоноличиванию, подача материалов	стык	9	3,42	Монтажники БР - 1 БР - 1																		
Установка опалубки, омоноличивание стыков с приготовлением раствора	-II-	9	7,16	-II-																		
Электроподогрев стыка	-II-	9	-	-II-																		
Снятие опалубки и уход за стыком	-II-	9	1,54	-II-																		
Обслуживание (поста) агрегата СО-57 и промывка шлангов	-II-	9	1,7	Монтажники БР - 1 БР - 1 Машинист БР - 1													Обеденный перерыв			Монтажники работают на других видах работ		
