ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

704-1-249с. 92

РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАЗУТА ЕМКОСТЬЮ 100 КУБ.М

АЛЬБОМ 6

ПМ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

25605-06

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

704-1-249с. 92

РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАЗУТА ЕМКОСТЬЮ 100 КУБ.М

АЛЬБОМ 6

ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ

АЛЬБОМ 1 ПЗ	Пояснительная записка
ТХ	Оборудование технологическое, электротехническое, автоматики
АЛЬБОМ 2 КМ	Конструкции металлические
АЛЬБОМ 3 КЖ	Основания и фундаменты
АЛЬБОМ 4 ТИ1	Тепловая изоляция
АЛЬБОМ 5 ТИ2	Основные положения по монтажу теплоизоляционных конструкций
АЛЬБОМ 6 ПМ	Основные положения по монтажу металлических конструкций
АЛЬБОМ 7 СО	Спецификации оборудования
АЛЬБОМ 8 ВМ	Ведомости потребности в материалах
АЛЬБОМ 9 С	Сметы

Разработан
ГИПРОНЕФТЕСПЕЦМОНТАЖОМ
главный инженер института /И.С. Гольденберг/
главный инженер проекта /А.В. Рохин/

Утвержден и введен в действие
протоколом Сантехниипроекта от 13 октября 1992 года №35

Альбом 6

Типовой проект 704-1-249 с. 92

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
6	Ведомость оборудования, инструмента и материалов для производства сварочных работ резервуара.	
7	График производства работ	
8	Схема строительного генерального плана	
9	Общий вид резервуара	
10	Монтаж днища	
12	Разметка днища	
13	Сборка конического рулонированного покрытия резервуара	
15	Монтаж площадок обслуживания и ограждений резервуара	
16	Подъем рулона стенки	
19	Развертывание полотнища стенки резервуара	
24	Замыкание вертикального монтажного стыка стенки резервуара	
26	Установка крыши в проектное положение	
27	Испытание резервуара	
30	Сварка стенки	
32	Сварка люков на стенке	
34	Сварка крыши, люков и ограждений	
37	Сварка днища	

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Типовой проект „Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб. м." выполнен по плану типового проектирования Госстроя СССР на 1991 г, тема ТФ7-3-13 в соответствии с заданием, утвержденным Сантехниипроектом.

Стадия разработки — рабочий проект.

В типовом проекте:

альбом 6 — „Основные положения по монтажу металлических конструкций"

— содержит технологические схемы монтажа и сварки резервуара емкостью 100 куб.м. из элементов, поступающих на монтаж с завода-изготовителя.

1.1. В основу альбома 6 при разработке настоящего проекта положены следующие материалы:

1) задание на проектирование, утвержденное Сантехниипроектом;

2) альбом 2 „Конструкции металлические"

1.2. Альбом 6 разработан на основе положений следующей нормативно-технической документации:

1) СНиП 3.03.01-87 „Несущие и ограждающие конструкции";

2) СНиП III-4-80* „Строительные нормы и правила Техника безопасности в строительстве".

2. ПОСТАВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

2.1. Металлоконструкции резервуара емкостью 100 куб.м. с рулонированной конической крышей поставляют на монтажную площадку с завода-изготовителя в следующем виде:

1) полотнища днища, стенки, крыши — свернутыми в рулон на каркасе или шахтной лестницы;

2) площадки обслуживания — сварными транспортабельными секциями;

3) люки, патрубки — с ответными фланцами (заглушками) и комплектом болтов.

3. ПРИЕМКА ОСНОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К НЕМУ

3.1. При приемке основания проверяют:

1) общее состояние основания, соответствие его проекту, наличие актов на скрытые работы;

2) правильность разбивки осей резервуара на основании, шахтной лестницы, наличие репера, определяющего центр основания;

3) соответствие толщин, технологического состава гидроизолирующего слоя и степень его уплотнения;

4) обеспечение отвода поверхностных вод от основания.

3.2. Разность отметок любых нестежных точек основания 20 мм.

3.3. Устройство проектного бетонного поддона вокруг основания следует выполнять после монтажа металлоконструкций резервуара.

4. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКЕ

4.1. До начала монтажа металлоконструкций резервуара должны быть выполнены следующие работы:

1) построено и принято основание под резервуар;

2) устроены временные подъезды (не менее двух) к основанию для транспортировки металлоконструкций;

3) спланирована и уплотнена кольцевая площадка вокруг основания для работы крана и других механизмов.

Площадка должна быть уплотнена до несущей способности, отвечающей паспортным характеристикам применяемого механизма;

4) произведена общая планировка территории монтажной площадки с уклоном для отвода поверхностных вод;

5) подведена электроэнергия для обеспечения работы грузоподъемных механизмов, сварочного оборудования, ручного механизированного инструмента и освещения;

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами

Главный инженер проекта А.В. Рохин.

Привязан

Инв. №

ГИП САН ТЕХНИПРОЕКТА	Мысякин		
Нач. отд.	Ларионов		
Гл. спец.	Рохин		
Н. контр.	Панова		
Инж.	Лак		

ТП 704-1-249 с. 92 ПМ

Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб. м.

Общие данные (начало)

Стадия	Лист	Листов
РП	1	37

ГИПРОНЕФТЕСПЕЦМОНТАЖ г. Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

6) уложен трубопровод для подачи и слива воды при гидроиспытании резервуара;

7) устроены площадки для складирования металлоконструкций резервуара и сборки;

8) установлены все временные здания и сооружения, необходимые для нормальной работы производственного персонала.

5. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Раздел содержит краткое описание процессов монтажа резервуара в их технологической последовательности:

5.1. Монтаж днища:

1) днище резервуара, поставляемое с завода-изготовителя полотнищем, разворачивают на основании с с помощью двух тракторов;

2) укладывают днище с помощью трактора в проектное положение, ориентируя его относительно осей I-III и II-IV.

После установки днища в проектное положение на нем собирают крышу резервуара.

5.2. Сборка конической рулонированной крыши.

Сборку рулонированной крыши производят на днище резервуара, используя его как стена для сборки.

После сборки и сварки крыши производят разметку и установку на ней всех люков, патрубков и площадок обслуживания. Приваривают к крыше строповочные скобы и с помощью крана снимают с днища. Установленную на подставки высотой 1м крышу сваривают с внутренней стороны.

5.3. Подъем рулона стенки в вертикальное положение.

Рулон с полотнищем стенки поднимают с одной стоянки крана изменением вылета стрелы, при этом нижний конец рулона опирается на грунт. Кран устанавливают на площадке, имеющей несущую способность не менее 0,5 МПа (5кгс/см²), с уклоном не более 1° в любую сторону.

Подъем рулона производят, чередуя операции:

1) подъем рулона до отклонения грузового полиспаста крана от вертикали на допустимый угол с контролем по рискам на угловом секторе, закрепленном на рулоне;

2) разворот стрелы крана до отклонения полиспаста на допустимый угол с контролем по отвесу и установленным шнуром.

При достижении рулоном положения неустойчивого равновесия включают в работу тормозной канат, закрепленный на тракторе. Трактором плавно устанавливают рулон в вертикальное положение на грунте. Переместив кран в положение 2в2, устанавливают рулон на днище резервуара.

5.4. Развертывание рулона стенки.

Развертывание рулона стенки производят с помощью трактора за тяговую скобу. По мере развертывания рулона на верхней кромке полотнища устанавливают элементы обрамляющего уголка.

Развернув полотнище стенки, приступают к сборке и сварке вертикального монтажного стыка.

5.5. Монтаж крыши.

Собранную и сваренную крышу устанавливают краном на обрамляющий уголок стенки, ориентируя относительно осей I-III, II-IV.

Собирают и приваривают крышу к обрамляющему уголку.

5.6. Испытания резервуара

По окончании всех сборочных и сварочных работ, а также контроля сварных соединений приступают к испытаниям резервуара.

На днище резервуара производят контроль всех 100% заводских швов на герметичность.

До начала испытаний выполняют все подготовительные работы:

1) монтируют подводящие трубопроводы для подачи и слива воды;

2) производят нивелировку наружного контура днища, выполняют замеры геометрических размеров и отклонений корпуса резервуара.

Испытания резервуара на прочность и устойчивость производят в следующей последовательности:

1) корпуса на прочность - гидравлическим испытанием наливом воды до проектной отметки и выдержкой под нагрузкой 24 часа;

2) крыши на герметичность - пробным избыточным давлением воздухом 100 мм. вод. ст.

После проведения прочностных испытаний производят необходимые измерения металлоконструкций и основания резервуара. Допустимые отклонения от геометрических размеров корпуса резервуара даны на соответствующих технологических листах альбома.

6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО СВАРКЕ

Технология сварки резервуара емкостью 300 куб. м. для мазута разработана на основании чертежей альбома 2 и настоящего альбома 6 проекта, СНиП 3.03.01-87.

Металлические конструкции резервуара изготовлены из стали класса С245 марки ВСт3пс6 и ВСт3пс2 по ГОСТ 380-88*.

Сварные монтажные соединения элементов резервуара выполнять ручным электродуговым способом электродами марки УОНИ-13/45 типа Э42А по ГОСТ 9467-75 диаметром 3 и 4 мм.

6.1. Подготовка узлов резервуара к сварке.

6.1.1. Перед сборкой необходимо проверить:

1) качество изготовленных конструкций внешним осмотром;

2) соответствие металла требованиям проекта (по сертификатам и маркировке на стальных листах);

3) отсутствие расслоений на кромках;

4) соответствие собираемых элементов монтажной схеме, проектным размерам и геометрической форме;

5) правильность подготовки кромок под сварку.

Обнаруженные отклонения должны быть устранены.

6.1.2. В случае возникновения необходимости подгонки листовых элементов по месту, обрезку производить механическим способом или газовой резкой.

Альбом 6

Типовой проект 704-1-249с. 92

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

						ТП 704-1-249с. 92 ПМ	
Привязан:						Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб.м	Стадия: РП; Лист: 2; Листов:
			Нач.отд.	Ларионов			
			Гл.спец.	Рохин		Общие данные (продолжение)	Гипронефтеспецмонтаж г. Москва
			Н.контр.	Панова			
Инв.№			Инж.	Пак			

с последующей зачисткой шлифмашинками.

6.1.3. Сборку конструкций производить с использованием сборочных приспособлений в соответствии с настоящим проектом и с помощью прихваток.
Минимальная длина прихватки должна быть не менее 30÷50 мм. Расстояние между прихватками - не более 400÷500 мм. Катет шва прихватки должен быть не менее половины катета шва.

6.1.4. Форма скоса кромок и размеры зазоров при сборке сварных соединений показаны на чертежах.

6.1.5. Перед сваркой следует зачистить свариваемые кромки и прилегающие к ним зоны металла на ширину не менее 20мм от грязи, масла и других загрязнений, осушить от влаги.

6.1.6. После удаления сборочных приспособлений, остатки швов в местах их приварки следует зачистить заподлицо с поверхностью основного металла и подрезы глубиной более 1мм подварить и зачистить.

6.1.7. К сварке резервуара допускаются сварщики не ниже 4 разряда, аттестованные в соответствии с „Правилами аттестации сварщиков," утвержденными Госгортехнадзором СССР, и сварившие контрольные образцы.

6.1.8. Перед началом сварочных работ сварщики должны заварить контрольные пластины и стали ВСт3пс6 и ВСт3пс2 размером 400×200×4 в вертикальном положении с разделкой кромок, тождественной при сварке на монтаже.

6.1.9. Из сваренных контрольных пластин после просвечивания или УЗК изготовить и испытать образцы для механических испытаний по ГОСТ 6996-66:

1) для испытания на статическое растяжение при температуре +20°С - 2 образца (типа XII, XIII или XIV);

2) для испытания на статический изгиб (загиб) при температуре +20°С - 2 образца (типа XXVII, XXVIII)

Временное сопротивление сварных соединений должна быть не ниже минимального значения временного сопротивления основного металла, угол загиба не менее 120°.

При получении неудовлетворительных результатов механических свойств производится повторное испытание удвоенного количества соответствующих образцов.

6.1.10. Все сварочные материалы должны соответствовать стандартам и иметь сертификаты завода-изготовителя.

6.1.11. Сварочные материалы перед сваркой необходимо прокалить:

электроды марки УОНИ-13/45 - при температуре 350°-370°С в течение 1,5-2 часов.

6.1.12. Электроды после прокалки по вышеприведенному режиму рекомендуется хранить в печи хранения при температуре 70-100°С.

6.1.13. Прихватки выполнить теми же электродами, что и сварку. После зачистки прихваток произвести проверку их качества. Дефектные прихватки вышлифовать и выполнить вновь.

6.1.14. При сварке производить тщательную зачистку каждого слоя, остатки шлака между слоями недопустимы.

6.1.15. В стыковых соединениях с разделкой кромок обязательна вышлифовка корня шва перед сваркой с обратной стороны разделки и подварка.

6.1.16. Перед сваркой рекомендуется отработать режимы на пробных пластинах в условиях, тождественных с теми, в которых будет выполняться сварка на монтаже.

6.1.17. Для выполнения сварочных работ электроды выдаются сварщику в количестве, необходимом для полусменной работы. Полученные электроды следует содержать во влагонепроницаемом закрытом пенале. После работы все оставшиеся электроды подлежат возврату на склад и затем эти электроды подвергаются вторичной прокалке, тем же методом для повторного использования.

6.1.18. Удаление прихваток и корня шва, а также снятие усиления, зачистку шва, удаление дефектных мест и т.д. рекомендуется осуществлять с помощью высокооборотных электрических шлифмашинок.

6.1.19. Процесс сварки необходимо вести на стабильном режиме. Допускаемые отклонения принятых значений силы тока и напряжения дуги не должны превышать ± 5 %.

6.1.20. После окончания сварки электросварщики должны проставить присвоенные им клейма на расстоянии 40÷50мм от оси шва в начале и конце стыка.

6.2. Рекомендации по организации сварочных работ

6.2.1. Сварочный участок необходимо укомплектовать сварочным оборудованием, инструментом и материалами в соответствии с ведомостью.

6.2.2. Сварочными работами должен руководить квалифицированный специалист по сварке.

6.2.3. Для производства сварочных работ необходимо следующий численный состав исполнителей (в одну смену), чел.:

1) мастер по сварке - 1
2) электросварщики по ручной дуговой сварке (не ниже 4 разряда) - 2
3) газорезчики (не ниже 4 разряда) - 1
4) оператор по контролю качества сварных швов неразрушающими методами - 1
5) слесарь-монтажник - 1

6.2.4. К началу производства сварочных работ следует:

1) обеспечить объект всей необходимой документацией по сварке;

2) установить силовые пункты питания электроэнергией („сборки") и проверить работу всего сварочного оборудования;

3) в непосредственной близости от места производства сварочных работ установить переносные металлические будки с размещенными в них сварочной аппаратурой и источниками питания;

4) оборудовать кладовую для хранения сварочных материалов и установить в ней печь с температурой до 500° для прокалки и просушки;

5) опробовать оборудование, электроды и подобрать режимы сварки на контрольных образцах;

Альбом 6

Типовой проект 704-1-249с 92

						ТП 704-1-249с. 92			ПМ
Привязан:						Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб.м.	Стадия	Лист	Листов
			Нач. отд	Ларионов			РП	3	
			Гл. спец	Рохин					
			Н. контр.	Панова		Общие данные (продолжение)	Гипронефтеспецмонтаж г. Москва		
Инв №			Инж	Пак					

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

б) оградить свариваемые поверхности конструкций и рабочее место сварщика от атмосферных осадков и ветра;

г) проверить состояние изоляции сварочных кабелей и правильность присоединения их к клеммам источников постоянного тока;

д) проверить арматуру газовых баллонов, рукава для кислорода и горючих газов, а также инструмент для газоплазменной обработки металлов.

6.2.5. Сварочные посты должны быть снабжены контрольно-измерительной аппаратурой.

6.2.6. Источники сварочного тока рекомендуется устанавливать в закрытых переносных машинных залах не далее 50 м от места сварки.

6.2.7. Разделку кромок вертикального монтажного стыка производить газовой резкой с применением специальных приспособлений.

6.3. Контроль качества сварных соединений

6.3.1. Контроль качества сварных соединений должен выполняться в соответствии с требованиями глав 4 и 8. СНИП 3.03.01-87.

6.32. Все 100% сварных швов должны быть подвергнуты внешнему осмотру и измерению шаблонами по ГОСТ 3240-79. При внешнем осмотре рекомендуется применять лупу с 5-10-кратным увеличением.

6.3.3. По внешнему виду швы сварных соединений должны удовлетворять следующим требованиям:

1) иметь гладкую или равномерночешуйчатую поверхность (без наплывов, прожогов, сужений и перерывов) и не иметь резкого перехода к основному металлу;

Угловые швы должны выполняться с плавным переходом к основному металлу;

г) наплавленный металл должен быть плотным по всей длине шва, не иметь трещин и дефектов, выходящих за пределы, указанные в п. 6.4;

3) подрезы основного металла допускаются глубиной не более 0,5мм при толщине стали от 4 до 10 мм;

4) все кратеры должны быть заварены.

6.3.4. Объем и методы контроля указаны на чертежах.

6.4. Допустимые дефекты швов при радиационном контроле следующие.

6.4.1. Для соединений, допустимых для сварки с двух сторон и соединений на подкладках допускаются непровары в корне шва высотой до 5% толщины свариваемого проката, но не более 2мм и длиной не более удвоенной длины оценочного участка;

6.4.2. Для соединений без подкладок, доступных для сварки с одной стороны, допускаются непровары в корне шва высотой до 15% толщины свариваемого проката, но не более 3мм;

6.43. Для всех соединений.

Удлиненные и сферические дефекты:

1) одиночные - высотой не более 0,8 мм;

2) образующие цепочку или скопление пор высотой не более 0,4мм. и длиной не более длины оценочного участка;

3) удлиненные - протяженностью не более 3.75 мм;

4) непровары, цепочки и скопления пор, соседние по длине шва, суммарные в продольном сечении шва с расстоянием между близлежащими концами не менее 200мм и суммарной площадью на оценочном участке не более 3мм².

Чувствительность контроля радиографией устанавливается по третьему классу согласно ГОСТ 7512-82.

6.4.4. Сварные соединения днищ резервуара должны быть проверены на непроницаемость вакуумированием.

Браковочным признаком является появление воздушных пузырьков воздуха на шве, смоченном мыльным индикаторным составом, при перепаде давлений под вакуумной рамкой 500÷600мм. рт. ст.

6.4.5. Непроницаемость сварных соединений стенок резервуара с днищем должна быть проверена керосином или вакуумированием.

Браковочным признаком является появление пятен керосина на обмыленной поверхности швов.

6.4.6. Сварные соединения покрытия резервуара следует контролировать на герметичность при избыточном давлении до 200 мм. вод. ст.

Браковочным признаком негерметичности швов является появление воздушных пузырьков на смоченной мыльным индикаторным составом поверхности швов.

6.4.7. Сварные соединения люков и патрубков на вертикальной стенке резервуара должны быть проверены на герметичность смачиванием керосином до сварки усиливающих колец.

Сварочные соединения люков и патрубков покрытия резервуара должны быть проверены на герметичность при испытании резервуара избыточным давлением по пункту 6.4.6.

6.5. Исправление дефектов сварочных соединений.

6.5.1. Недопустимые дефекты, обнаруженные в сварных швах, устраняются под наблюдением мастера по сварке.

6.5.2. Выявленные неразрушающими методами контроля внутренние дефекты удаляются из шва при помощи шлифмашинок с последующей сваркой и повторным контролем исправленных участков сварного шва.

6.5.3. Исправление одного и того же дефектного места допускается не более 2х раз.

Сведения об исправлении дефектов и количества исправлений заносятся в сварочный журнал.

6.5.4. Швы неполного сечения должны быть доварены до проектного размера.

6.5.5. Участок шва с порами, непроварами и.т.п. удалить на длину дефектного участка плюс 15мм. с каждой стороны и заварить вновь.

6.5.6. В швах с трещинами начало и конец трещины засверлить, удалить на длину дефектного места плюс 15мм. с каждой стороны и заварить вновь.

6.5.7. Дефекты сварных соединений заварить с применением электродов меньшего диаметра и на минимальных режимах сварки, установленных технологическим процессом.

Альбом 6

Типовой проект 704-1-249с. 92

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							

Привязан:

Инв. №

Нач. отд.	Ларионов		
Гл. спец.	Росин		
Н. контр.	Панова		
ГИП	Пак		

ТП 704-1-249с. 92 ПМ

Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб.м.

Стадия	Лист	Листов
РП	4	

Общие данные (продолжение)

ГИПРОНЕФТЕСПЕЦМОНТАЖ г. Москва

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

7.1. Требования безопасности труда при монтаже.

При выполнении монтажных работ необходимо руководствоваться следующими основными положениями:

1) до начала работ необходимо подробно ознакомиться с данным проектом;

2) при перекатывании рулона, как впереди, так и сзади него не должны находиться люди;

3) при подъеме рулона в зоне подъема (в радиусе 25м) не должны находиться люди. Опасную зону оградить предупредительными знаками;

4) в процессе развертывания рулона стенки люди не должны находиться в непосредственной близости от освобождающегося витка полотнища. Запрещается пребывание людей вблизи каната, с помощью которого производится развертывание;

5) запрещается пребывание людей под поднимаемым грузом и в зоне действия стрелы грузоподъемного механизма;

6) при подъеме и спуске по лестнице монтажнику необходимо закрепиться предохранительным поясом за скобу ПВУ-2, установленную на верхней части лестницы;

7) все колодцы, лотки траншей и другие коммуникации, находящиеся на пути грузоподъемных транспортных машин, должны быть ограждены хорошо видимыми указателями;

8) лица, выполняющие работы на высоте трех метров и более, обязаны пользоваться ящиками или сумками для инструмента и крепежных материалов; опускать все необходимые для работы предметы веревкой;

9) вновь изготовленные леса, подмости и т. п. должны быть испытаны и приняты комиссией с участием представителей органов техники безопасности и устанавливаются под наблюдением ответственного лица.

7.2. Требования безопасности труда при сварке

При выполнении сварочных работ необходимо руководствоваться следующими основными положениями:

1) сварщик перед началом сварочных работ должен пройти инструктаж по безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.3.003-75 и главой СНиП по технике безопасности в строительстве;

2) металлические части основного и вспомогательного электросварочного оборудования (источники питания, сушильные печи и др.), не находящиеся под напряжением, а также сваривается изделия должны быть заземлены;

3) присоединение и отключение от сети источников питания дуги и другого оборудования выполняет электрик, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже III;

4) при сварке в резервуаре сварщик, кроме обычной рабочей одежды, обязан использовать диэлектрические перчатки, галоши и коврик;

5) сварочные кабели, шланги, подведенные к рабочим местам, должны быть защищены от возможных повреждений. Сварочные провода должны быть изолированы. Соединять концы сварочного кабеля следует с помощью специальных муфт. Подключение проводов к сварочному оборудованию выполнять через кабельные наконечники;

6) источники сварочного тока должны быть вынесены за пределы резервуара.

7.3. Дополнительные меры по электробезопасности

7.3.1. При внесении внутрь монтируемого резервуара напряжения 220/380 В необходимо принять дополнительные меры от поражения рабочих недопустимо большим током согласно ПУЭ.

7.3.2. Для снижения токов однофазного замыкания необходимо применять разделяющие трансформаторы, причем каждый трехфазный электроприемник, вносимый внутрь резервуара, должен присоединяться к отдельному трансформатору.

7.3.3. Для защиты от двухфазного замыкания необходимо применять быстродействующие отключающие устройства типа УЗКИ или АЗАК.

7.3.4. При невозможности обеспечить выполнение вышеуказанных требований электробезопасности необходимо:

1) освещение внутри резервуара обеспечить светильниками напряжением 12В, питающихся от трансформаторов с раздельными обмотками первичного и вторичного напряжения. Один из выводов вторичной обмотки должен быть заземлен.
Применение автотрансформаторов внутри резервуара запрещается;

2) электроинструмент на напряжение выше 12В. заменить на пневматический.

7.3.5. Все металлические леса, электрооборудование и механизмы, которые могут оказаться под током, должны быть надежно заземлены.

8. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Во всем остальном, неоговоренном в предыдущем разделе, необходимо руководствоваться следующими нормами, правилами и инструкциями по технике безопасности:

1) СНиП III-4-80* „Строительные нормы и правила. Техника безопасности в строительстве";

2) ГОСТ 12.1.046-85 „Нормы электрического освещения строительных и монтажных работ";

3) „Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов";

4) „Типовая инструкция для стропальщиков (такелажников, зацепщиков), обслуживающих грузоподъемные краны;

5) „Руководство по производственной санитарии на строительно-монтажных работах", разделы 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10;

6) ВСН 311-89 „Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов".

Альбом 6

Типовой проект 704-1-249с. 92

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Привязан:

Инв. №

Нач.отд	Ларионов		
Гл. спец.	Рохин		11.9
Ст. контр	Панова		
Инж.	Пак		

ТП 704-1-249с. 92 ПМ

Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб. м

Общие данные (окончание)

Стадия	Лист	Листов
РП	5	

ГИПРОНЕФТЕСПЕЦМОНТАЖ г. Москва

Альбом 6

Типовой проект 704-1-249 с. 92

Ведомость оборудования, инструмента и материалов для производства сварочных работ.

Номер	Наименование	Марка, тип	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Сварочное оборудование				
1	* Сварочный выпрямитель или	ВДМ-1001; ПСМ-1001	шт	1	либо ВКСМ-1000 с РБ-300
	преобразователь				
2	Балластные реостаты	РБ-301	"	4	В случае применения ВКСМ-1000
3	Устройство для снижения напряжения	УСНП-1	"	1	ТУ 16-739-184-77
	холостого хода сварочных ист. питания				
	Сварочные кабели и провода				
1	Кабель силовой	КГ 3×70+1×25 мм²	м	50	Для подключения машинных помещений
		КГ 3×50+1×16 мм²	"	100	Для подключения выпрямителя ВДМ-1001
2	Кабель сварочный	КГ 1×35	"	240	
		КГ 1×50	"	20	
3	Шнур с резиновой изоляцией	ШРПС 2×4+1×1,5 мм²	"	100	Для подключения шлифмашинок
4	Кабельные наконечники	К-7; К-4	шт.	10	
5	Клемма заземления	КЗ-9; КЗ-1	"	10	
	Вспомогательное оборудование и инструмент				
1	Эл. печь для прокалки сварочных	СНОП 3,5.3,5.3,5/3 м	шт.	1	
	материалов на 500°С				
2	Электрические высокооборотные	WS8A-1400; Ш-230	"	2÷4	или Ш-178; И9-210РА
	шлифмашинки				
3	Круги (диски) абразивные, армированные	Д-230 мм; Д-180 мм	"	300	S 3,6 мм
4	Электрододержатель на 500 А	ЭД-12; ЭЗР-4	"	4	ГОСТ 14651-78* Е
5	Щитки для защиты электросварщика	НН	"	4	ГОСТ 12.4.035-78*
6	Очки защитные	ОД	"	2	ГОСТ 12.4.013-85 Е
7	Светофильтры	С-2; С-3	"	20	ОСТ 21-6-87
8	Стекла покровные (простые)	ТС-3	"	50	ГОСТ 111-78

Продолжение

1	2	3	4	5	6
9	Щетка стальная		шт.	10	ОСТ 21-6-87
10	Молоток для очистки от шлака		"	4	ГОСТ 111-78
11	Набор шаблонов для проверки швов		"	4	
12	Слесарный инструмент		компл.	1	
13	Клейма сварщиков		шт.	4	
14	Пенал для электродов		"	4	
15	Коврик резиновый диэлектрический		"	4	
16	Лупа 10-ти кратного увеличения		"	2	
17	Вакуум-камера с вакуум-насосом	РВН-20	"	1	
	на 600 мм рт. ст.				
	Газорезательная аппаратура				
1	Резак для пропан-бутановой смеси	„Ракета-1"	"	1	Кировоканский завод „Автогенмаш"
2	Резак для ручной кислородной резки	„Маяк-1"	"	1	Кировоканский завод „Автогенмаш"
3	Горелка ацетиленовая	ГАО-2-12	"	1	Кировоканский завод „Автогенмаш"
4	Редуктор пропан-бутановый	ДПП-1-65	"	2	ГОСТ 6268-78*
5	Редуктор кислородный	ДКП-1-65	"	1	ГОСТ 6268-78*
6	Рукав резиновый (кислородный)	III-9-20	м	40	ГОСТ 9356-75*
7	Рукав резиновый (пропан-бутановый)	I-9-63	"	40	ГОСТ 9356-75*
8	Баллон для кислорода	40-150Л	шт.	5	ГОСТ 949-73*
9	Баллон для пропан-бутана	3-50	"	3	ГОСТ 15860-84
	Сварочные материалы				
1	Электроды металлические	УОНИ 13/45, 2 гр. качества	кг	31,5	ф 3,0 мм
			"	9,5	ф 4,0 мм
2	Рентгеновская пленка	РТ 4М или РТ-5	п.м	2,0	в пересчете на 35 мм кинопленки
			шт.	6	размером 300×400

*Примечание. Допускается использование других источников питания дуги, имеющих крутопадающую вольтамперную характеристику.

Нач. отд.	Ларионов			
Гл. спец.	Рохин			1:91
Гл. спец.	Чернышев			
Н. контр.	Панова			
Инж.	Яшина			

Привязан

Инв. №

ТП 704-1-249 с. 92 ПМ

Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб. м.

Ведомость сварочного оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	6	

Гипронефтеспецмонтаж г. Москва

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Альбом 6

Типовой проект 704-1-249с. 92

Обоснование §§ ЕНиР	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Норма времени, чел.-ч	Затраты труда чел. ч / чел. дн	Численность рабочих, чел.	Продолжительность, дн.	Рабочие дни 5	Рабочие дни 10
5-1-1	Сортировка металлоконструкций (75% от общей массы)	Т	6.7	0.65	4.36 / 0.5	3	0.2	—	
5-2-1	Монтаж днища	Резервуар	1	2.3	2.3 / 0.3	3	0.1	—	
22-1-6 К=1.4	Сварка днища	10 м	0.5	1.1	0.77 / 0.1	2	0.1	—	
* Толщины 2.16	Контроль сварных швов	1 м	0.5 / 4.5	2.37 / 0.82	4.9 / 0.6	1	0.3		
5-2-1 К=1.5	Сборка конического рулонированного покрытия	Резервуар	1	2.3	3.45 / 0.4	3	0.2	—	
22-1-6 К=1.4	Сварка покрытия	10 м	0.24	1.1	0.4 / 0.1	2	0.1	—	
22-1-6 К=1.4	Сварка люков и патрубков в покрытии	10 м	1.5	1.1	2.31 / 0.3	2	0.2	—	
5-2-13 К=0.7	Монтаж площадок и ограждений на крыше	Резервуар	1	2.5	1.75 / 0.2	3	0.1	—	
22-1-6 К-1.4 К=1.25	Сварка площадок и ограждений	10 м	1.3	1.1	2.5 / 0.3	2	0.2	—	
5-2-2	Установка рулона стенки на днище в вертикальное положение	Резервуар	1	4	4 / 0.5	4	0.2	—	
5-2-4	Развертывание рулона стенки	Резервуар	1	21	21 / 2.6	5	0.5	—	
22-1-6 К=1.4 К=2	Сварка таврового шва	10 м	1.5	1.1	4.62 / 0.6	2	0.3	—	
* Таблица 15; 16	Контроль двухстороннего таврового шва керосином и вакуумированием	1 м	15	0.7 / 0.82	22.8 / 2.8	1	2.8		
5-2-4	Соединение вертикальной кромки	Резервуар	1	11.5	11.5 / 1.4	5	0.3	—	
22-1-2; 22-1-9 К=1.4; К=1.5; К=2	Сварка вертикального монтажного стыка	10 м	0.6	2.2	5.54 / 0.7	2	0.4	—	
* Таблица 2	Контроль сварного шва радиографией	1 м	6	2.37	14.22 / 1.7	1	0.9		
22-1-2 К=1.4	Сварка люков и патрубков в стенке	10 м	1.4	1.5	2.94 / 0.4	2	0.2	—	
* Таблица 15	Контроль сварных швов на герметичность керосином	1 м	14	0.7	9.8 / 1.2	1	1.2		
5-1-6	Установка покрытия в проектное положение	шт / Т	1 / 1.04	7.6 / 0.87	8.8 / 1.1	4	0.3	—	
22-1-6 К=1.4 К=1.5	Сварка покрытия со стенкой	10 м	1.5	1.1	3.5 / 0.5	2	0.3	—	
* Таблица 16	Контроль сварных швов люков, патрубков в покрытии, швов покрытия на герметичность при гидроиспытании	1 м	30	0.2	6 / 0.8	1	0.8		
5-2-6	Испытание резервуара	Резервуар	1	12	12 / 1.5	2	0.8	—	
	Прочие неучтенные работы (10% от общего объема работ)	Резервуар	1	15	15 / 1.8	2	0.9	— — — — — — — — — — — —	—

График движения рабочей силы



ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Общие затраты труда. — 20.4 чел.дн.
2. Общая продолжительность сооружения резервуара — 5.4 дн.
3. Средняя численность рабочих $\frac{20.4}{5.4} = 4$ чел.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. График составлен на основании действующей нормативной документации.
2. График рассчитан на работу в одну смену, кроме рентгеноконтроля, который производится во вторую смену, а испытание резервуара - круглосуточно.

* Нормативы для планирования работ по контролю качества сварных соединений.

Нач. отд	Ларионов		
Гл. спец	Рохин		11.91
Н. контр	Панова		11.91
Инж.	Пак		

Привязан:

Инв. №

ТП 704-1-249с. 92 ПМ

Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб.м.

График производства работ

Стадия	Лист	Листов
РП	7	

ГИПРОНЕФТЕСПЕЦМОНТАЖ г. Москва

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

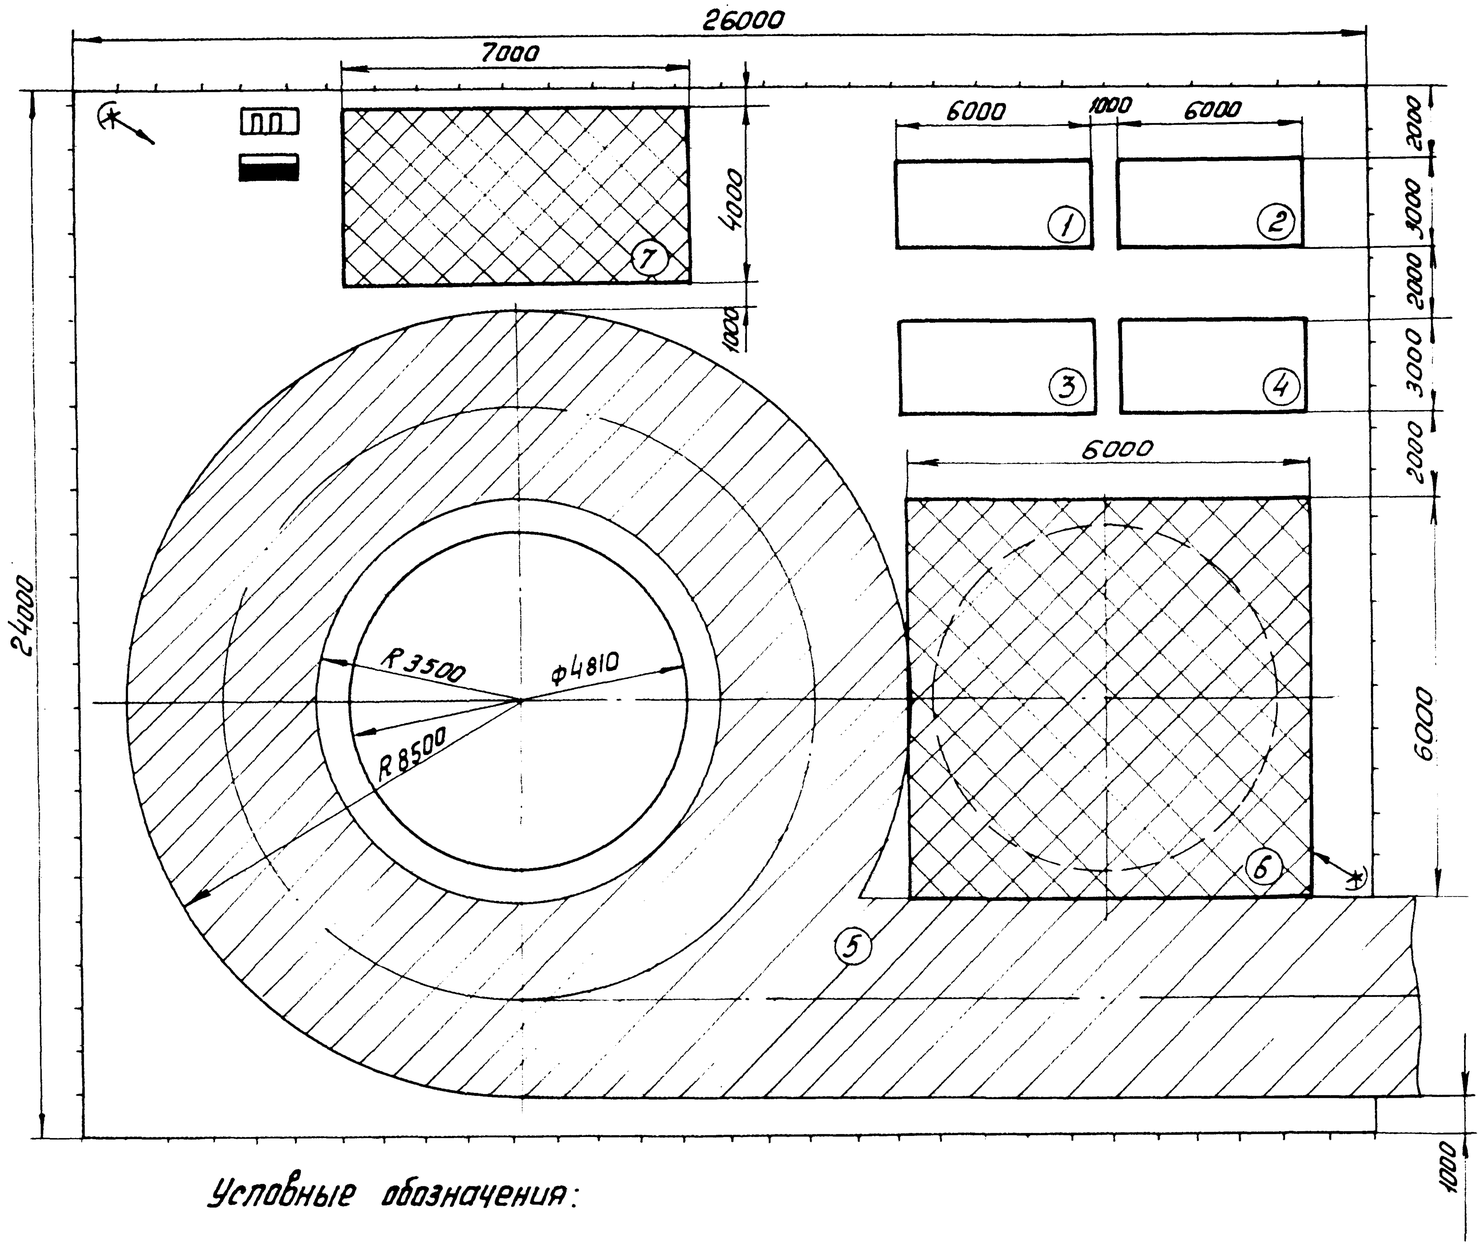

Технические требования

До начала монтажных работ необходимо выполнить следующие работы:

1. Установить временный забор и вывесить предупреждающие знаки по периметру монтажной площадки;
2. Произвести устройство площадок для временного складирования поступающих конструкций с несущей способностью 4 кгс/см^2;
3. Произвести устройство площадки для работы монтажного крана из железобетонных плит с несущей способностью в соответствии с ВСН 274-88 не менее 4 кгс/см^2, а уклон не более 1°;
4. Установить инвентарные здания для рабочих и ИТР, занятых на монтаже;
5. Установить прожекторные мачты со светильниками.

Ведомость временных сооружений и площадок для временного складирования конструкций

Поз.	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Краткая характеристика	Примечание
1	Прорабская	шт.	1	$S_{пл.}$=18,0м^2	Инвентарные здания ММСС СССР
2	Склад	-"-	1	$S_{пл.}$=18,0м^2	
3	Раздевалка для рабочих	-"-	1	$S_{пл.}$=18м^2	
4	Комната приема пищи	-"-	1	$S_{пл.}$=18,0м^2	
5	Площадка для работы крана	-"-	1	$S_{пл.}$=224м^2	
6	Площадка для складирования крыши.	-"-	1	$S_{пл.}$=36м^2	
7	Площадка для складирования металлоконструкций.	-"-	1	$S_{пл.}$=28м^2	

Условные обозначения:

- — площадка для работы крана из ж/б плит
- — площадка для складирования металлоконструкций
- — временный забор для ограждения монтажной площадки
- — прожектор
- — распределительный электрощит
- ПП — пожарный пост

Альбом 6

Типовой проект 704-1-249с. 92

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан:				ТП 704-1-249 с. 92 ПМ		
Нач. отд.	Лорионов			Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб. м	Стадия	Лист	Листов
Гл. спец.	Рахин				РП	8	
Н. контр.	Панова			Схема строительного генерального плана	Гипронефтеспецмонтаж г. Москва		
Вед. инж.	Чиспова						
Инв. №							

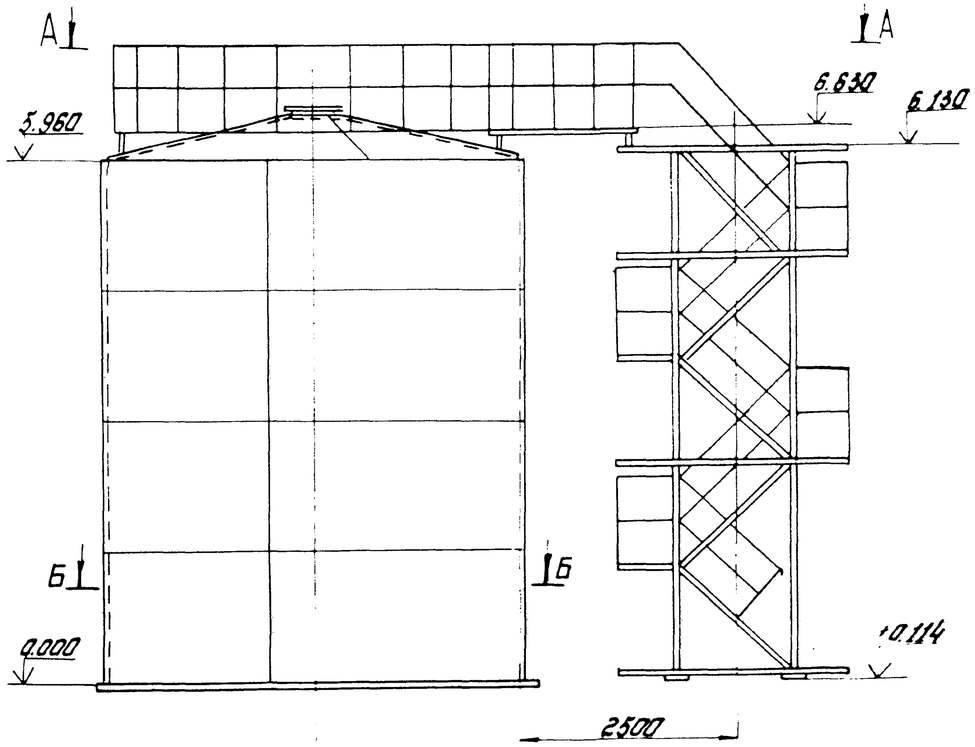

А-А

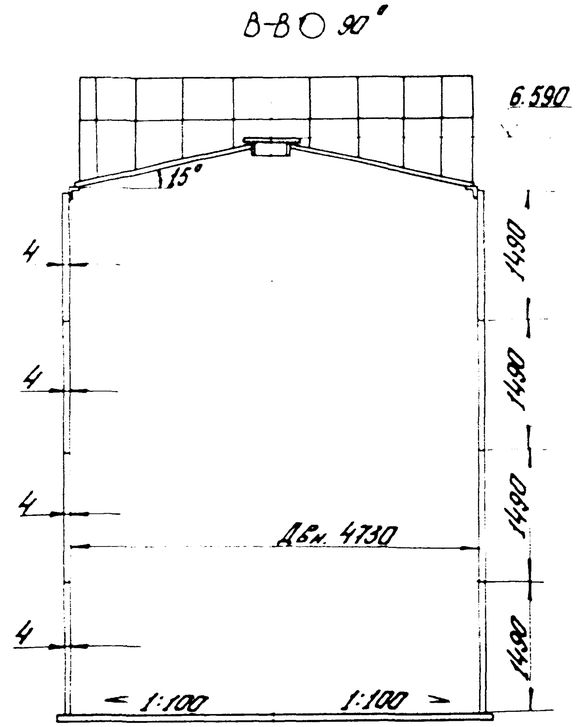

Б-Б

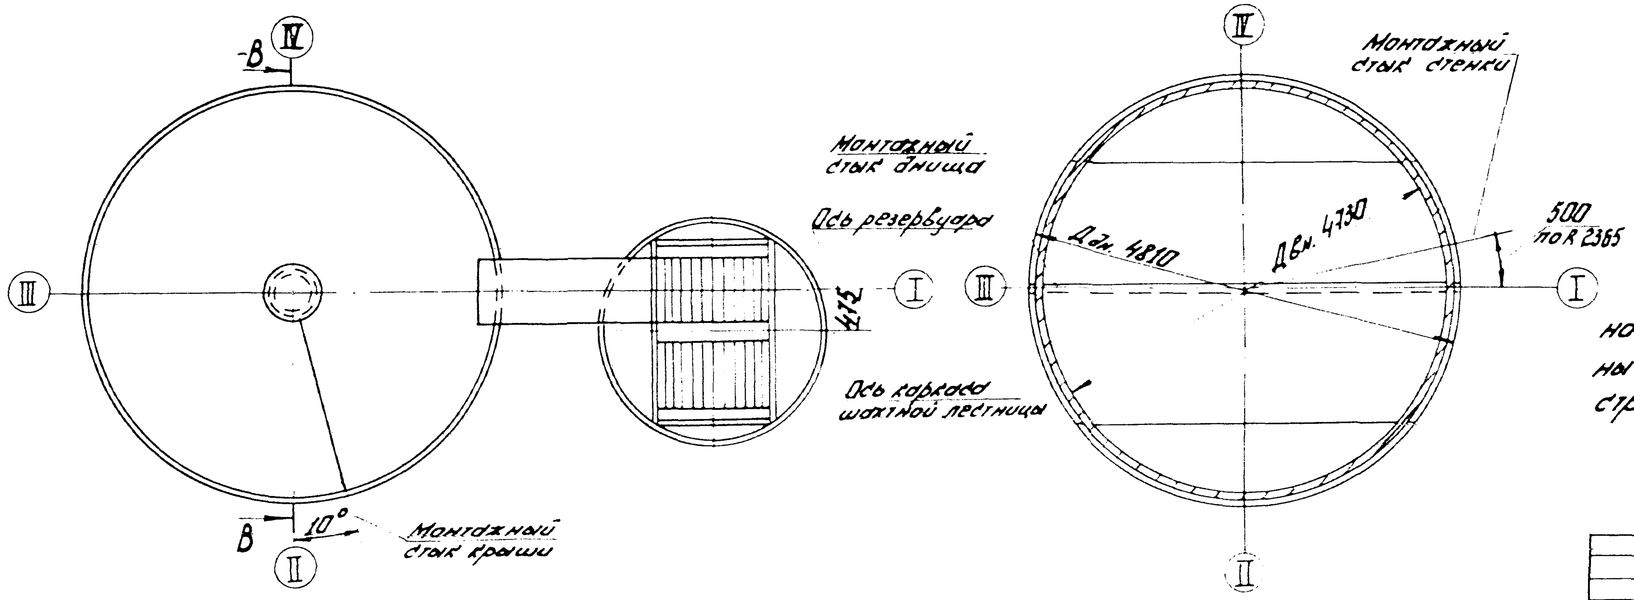

Основные монтажные механизмы

Таблица 1

Наименование работ	Необходимый механизм	Кол
1. Монтаж днища	Трактор С-100 или тракторная лебедка ТЛ-16/12,50	2
2. Подъём рулона стенки	Кран МКА-16 Трактор С-100	1 1
3. Развертывание стенки	Трактор С-100 АГП-12	1 1
4. Монтаж покрытия	Кран МКА-16 Трактор С-100	1 1
5. Установка крыши в проектное положение	Кран МКА-16	1

Основные монтажные элементы резервуара

Таблица 2

Наименование	Вид поставки м/констр.	Кол. шт.	Масса, т
Днище	Полотнище	1	0,59
Стенка	Полотнище	1	2,83
Крыша	Полотнище	1	0,69
Площадки и ограждения	Комплект	1	0,35
Шахтная лестница с переходной площадкой	Комплект	1	1,91
Люки-лазы	Комплект	1	0,32
Общая масса резервуара			6,69

Указания

1. Механизмы, указанные в табл. 1, являются оптимальными для данных операций.

2. При разработке проекта производства работ на основании данного альбома монтажные краны и другие механизмы подбираются из условий строительства конкретного объекта.

Привязан.				ТП 704-1-249 с. 92 ПМ			
				Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб. м	Стадия	Лист	Листов
			Нач. отд. Ларионов		РП	9	
			Гл. спец. Рогин	К. 91	Общий вид резервуара	Гипронефтеспецмонтаж г. Москва	
			Н. контр. Панова	11.91			
Инв. №			Инж. Пак				

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Альбом 6

Типовой проект 704-1-249с. 92

Схема 1 Разворачивание полотнищ днища

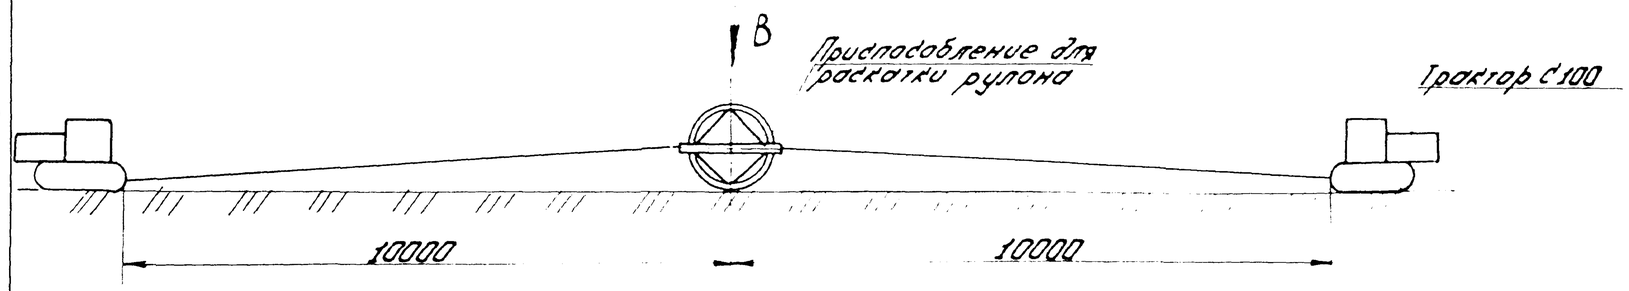

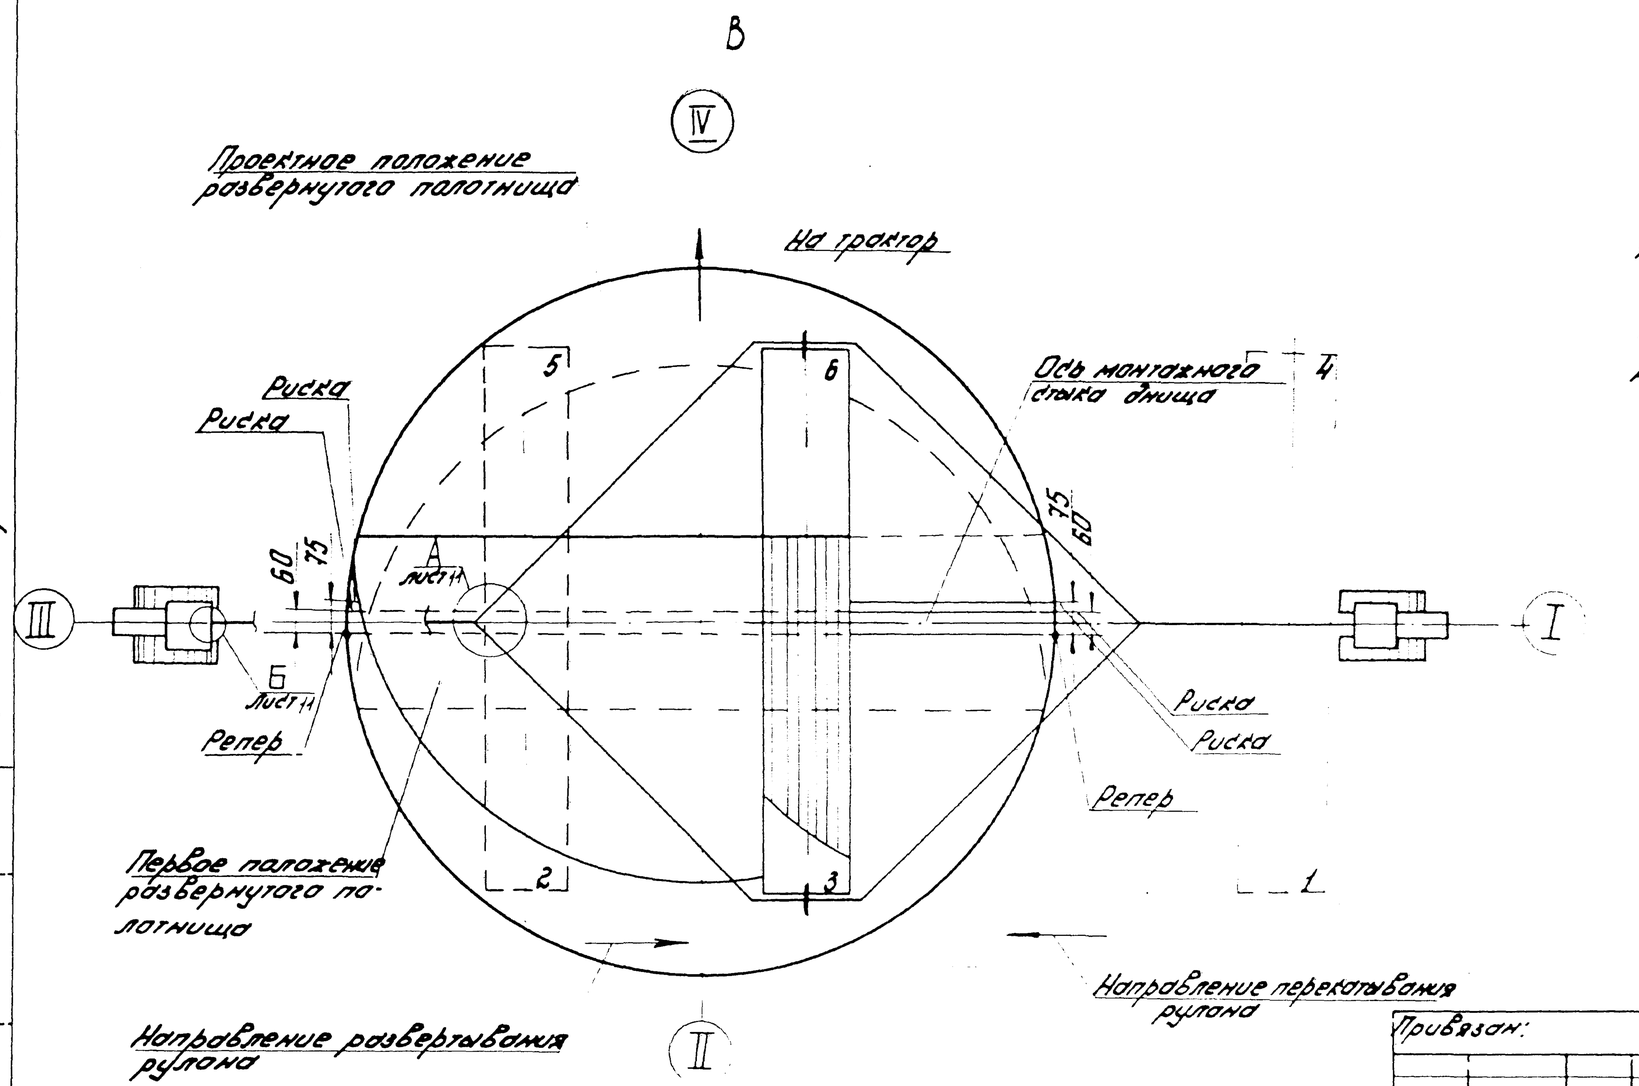

Порядок работ

1. Произвести строповку рулона (схема 1, вид В, узел А, узел Б).

2. Установить рулон в исходное положение для развертывания (положение 2) (перпендикулярно оси монтажного стыка днища) при этом начальный участок полотнища должен быть прижат рулоном (схема 2).

3. Перерезать планки, удерживающие кромки полотнища и перекатывая рулон, развернуть первый элемент днища. Перекатить рулон в положение 4.

4. Перетащить развернутое полотнище с помощью трактора в проектное положение (схема 3) и уложить его таким образом, чтобы продольная кромка совпала со струной, натянутой между реперами (вид В), а середина продольной кромки находилась на оси II-IV.

5. Нанести на кольцевых участках развернутого полотнища риски, первую на расстоянии 60 мм - для укладки полотнища, вторую на расстоянии 75 мм - для контроля величины нахлеста.

6. Перекатить рулон в положение 5 и произвести операции, указанные в п.п 2; 3.

7. Уложить второе полотнище, проверить проектные размеры днища и произвести прихватку элементов между собой швом Н1-Δ4-20/100.

Привязан:

Инв. №

Нач.отд.	Ларионов				ТП 704-1-249с. 92 ПМ		
Н.контр.	Панова		11.91	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб. м	Стадия	Лист	Листов
Гл.спец.	Рохин		11.91	Монтаж днища резервуара (начало)	РП	10	
Ведущ. инж.	Числова				Гипронефтеспецмонтаж г. Москва		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Альбом 6

Типовой проект 704-1-249с. 92

А (1:10) лист10

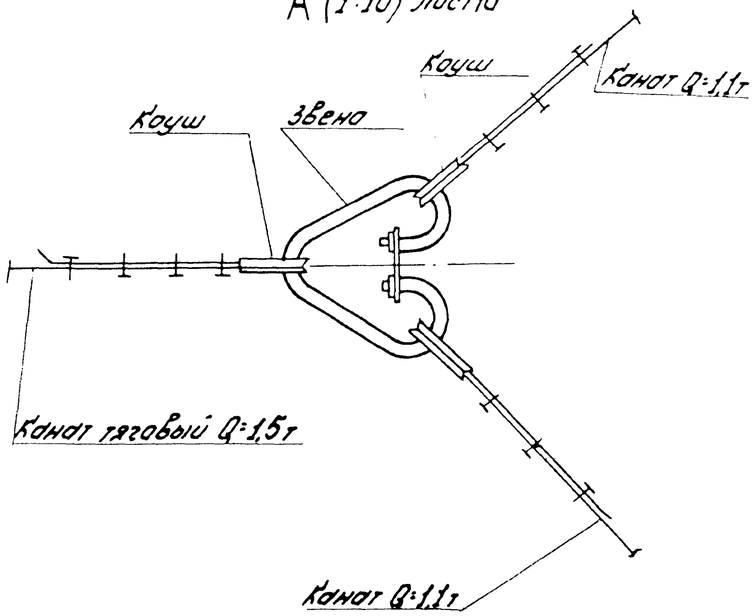

Схема 2. Положение рулона перед срезкой планок

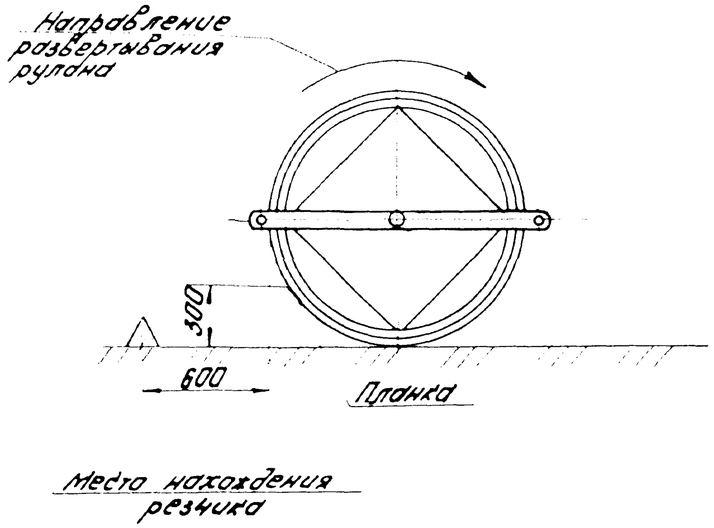

Схема 3. Крепление каната трактора к полотнищу днища при укладке его в проектное положение

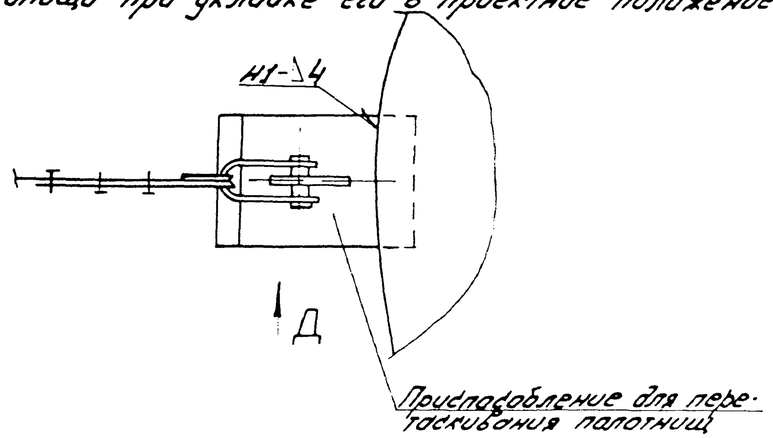

Б (1:10) лист10

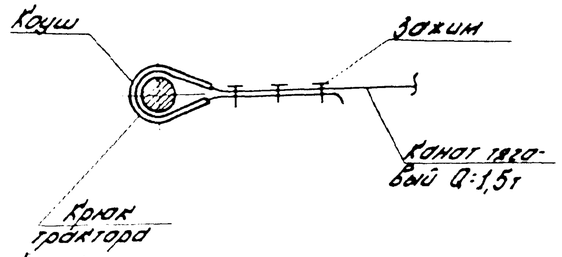

Схема 4. Крепление канатов трактора к приспособлению для раскатки рулона

Д (1:5)



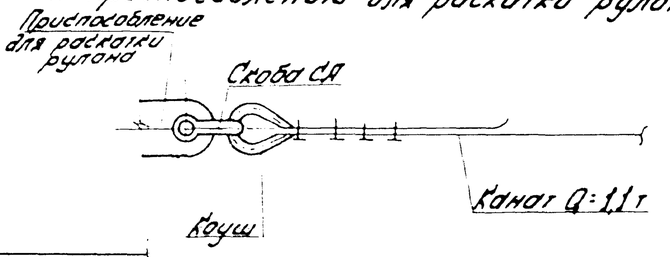

Порядок работ (продолжение)

8. Произвести сварку монтажного стыка днища.

9. Произвести проверку всех заводских и монтажных швов на плотность.

Требования безопасности труда

1. Срезку скрепляющих планок производить при натянутых канатах приспособления.

2. Оставлять рулон в стадии развертывания на длительный срок (обеденный перерыв, окончание смены) запрещается.

3. Рулон, не находящийся в стадии развертывания, должен быть закреплён 2^мя клиньями с каждой стороны.

4. Перед началом работ четко отработать систему сигнализации между бригадиром и трактористами.

5. Команды по перекатыванию рулонов даёт только руководитель работ.

Привязан:						ТП 704-1-249с. 92 ПМ		
			Нач. отд.	Порфонов		Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб. м	Стадия	Лист	Листов
			Н. контр.	Панова	11.91		РП	11	
			Гл. спец.	Разин	11.91	Монтаж днища резервуара (окончание)	Гипронефтеспецмонтаж г. Москва		
Инв. №			Ведущ.	Числова					

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

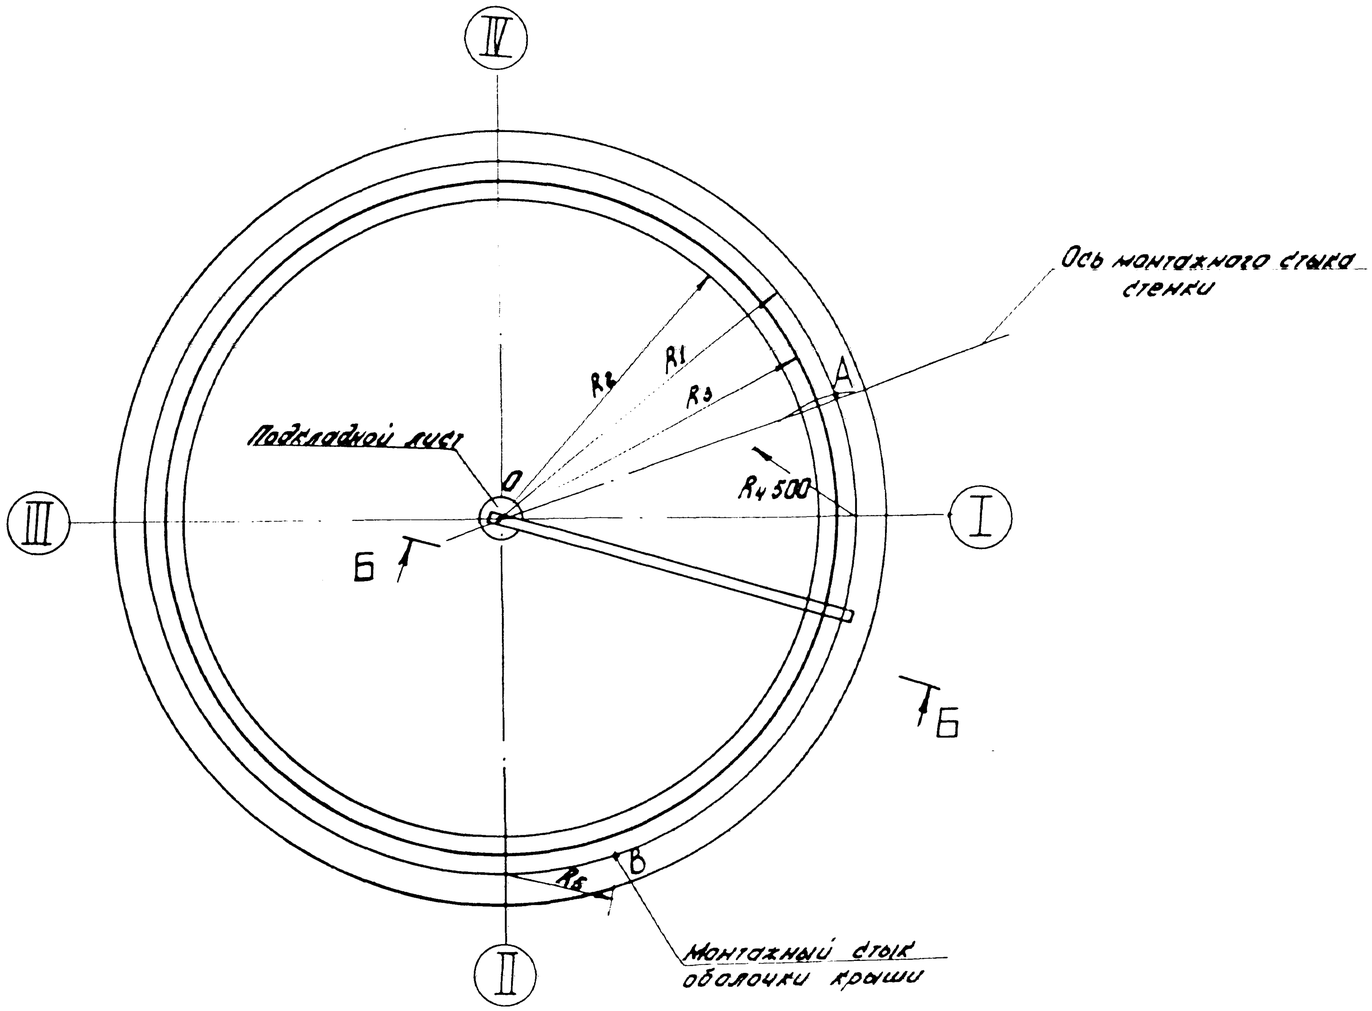

Б-Б

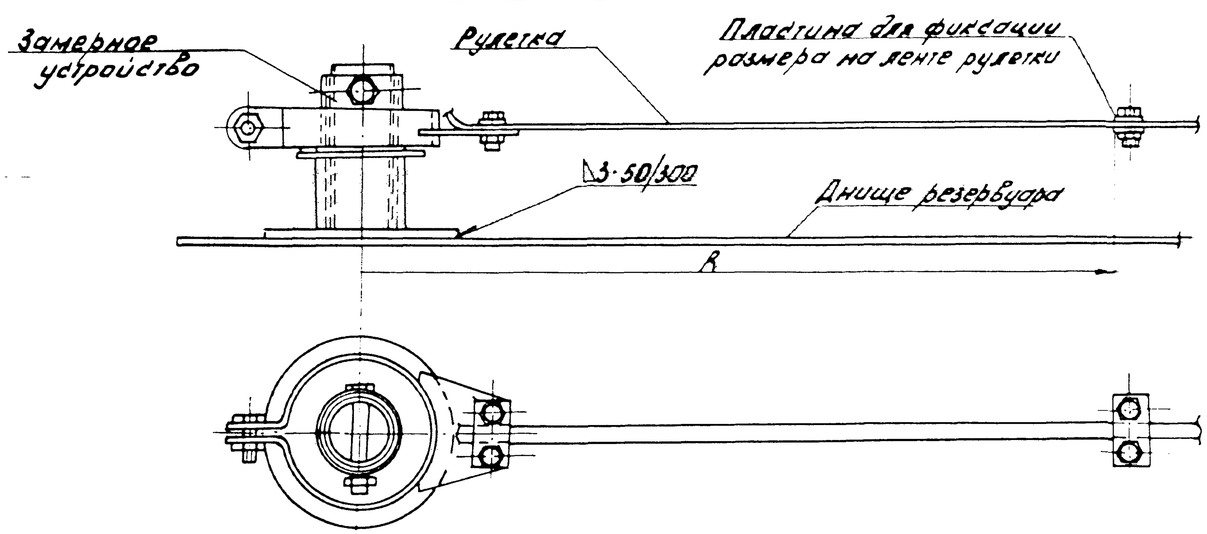

Порядок работ

1. Нанести оси I-III, II-IV и центр O на днище резервуара.
2. В центре подкладного листа просверлить отв. ф10мм.
3. Установить и приварить в центре днища резервуара подкладной лист ф 100
4. Приварить в центре резервуара ось замерного устройства.
5. С помощью замерного устройства на днище резервуара нанести кольцевые риски радиусами
   - R_1 2369 мм - для приварки ограничительных уголков;
   - R_2 2169 мм - для проверки вертикальности стенки резервуара по отвесу.
   - R_3 2335 мм - для приварки упоров при сборке конического рулонированного покрытия
6. Отметить радиусом R_4 500 мм на кольцевой риске по R_1 2369 мм точку „А" ось вертикального монтажного стыка стенки.
7. Отметить радиусом R_5 413 мм на кольцевой риске R_1 2369 мм точку „В" - монтажный стык оболочки крыши.

Указания

1. Все риски и точки, указанные на схеме, должны быть отмечены кернением.
2. Подкладной лист с отмеченным на нём центром резервуара оставить на все время его эксплуатации.
3. Приварку подкладного листа к днищу резервуара производить электродами типа Э42А ГОСТ 9467-75. Сварной шов выполнять по ГОСТ 5264-80.

Альбом 6

Типовой проект 704-1-249с. 92

Привязан:				ТП 704-1-249с. 92 ПМ			
				Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб. м	Стадия	Лист	Листов
			Нач. отд. Карионов		РП	12	
			Гл. спец. Розин	11.91	Разметка днища	Гипронефтеспецмонтаж г. Москва	
			Н. контр. Панова	11.91			
Инв. №			Вед. инж. Числова				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 6

Типовой проект 704-1-249 с. 92

Схема 1. Расположение упоров на днище

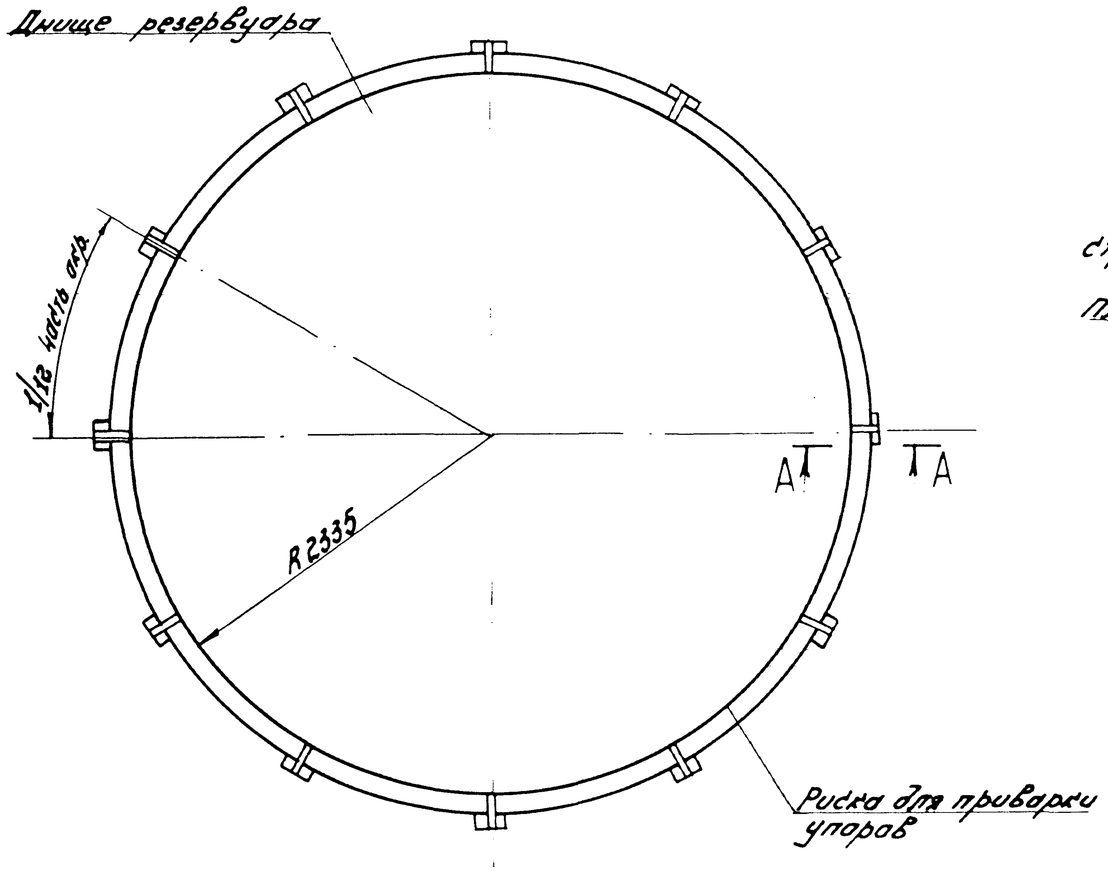

Схема 2. Установка строповочных скоб

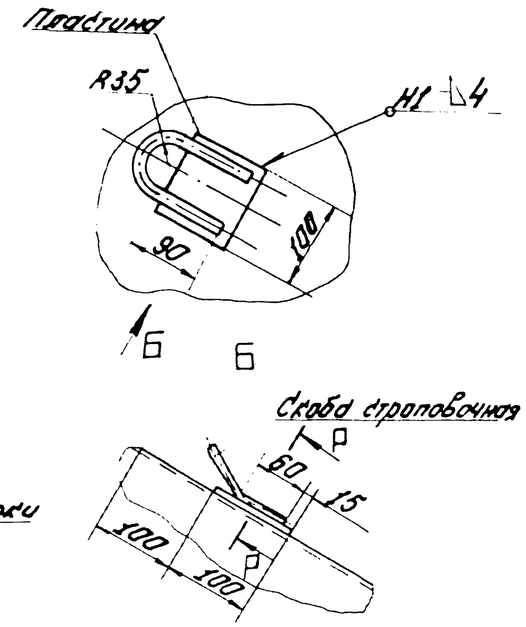

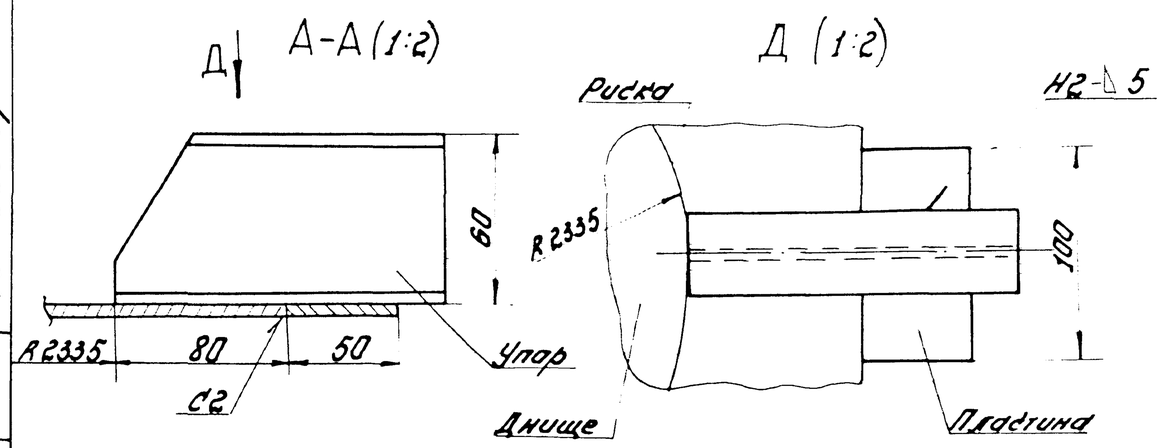



Порядок работ

1. Работы по разворачиванию полотнища крыши резервуара производить аналогично работам по разворачиванию полотнища днища резервуара (см. листы „Монтаж днища").
2. Отметить кольцевую риску R 2335 на днище резервуара (схема 1).
3. Установить и приварить 12 шт. пластин встык к днищу, расположив их равномерно по окружности. На эти пластины установить и приварить упоры (схема 1, сеч. А-А, вид В).
4. Натащить полотнище крыши резервуара на днище.
5. Разметить и вырезать в центре крыши отверстие R 150 мм.
6. Приварить верхние фиксаторы с наружной стороны на одной кромке собираемого стыка и нижние фиксаторы с внутренней стороны на другой кромке (сеч. Г-Г, схема 3, лист 14).
7. Приварить уголки на расстоянии 70 мм от края стыка крыши (сеч. Г-Г, лист 14).
8. Приварить строповочные скобы (схема 2) и застропить полотнище 4-х ветвевым стропом.
9. Приподнять полотнище крыши и завести нижнюю кромку полотнища в упоры по мере образования конуса.
10. Завести радиальные кромки крыши в фиксаторы, образовав конус и собрать стык на шпильках.

Привязан:

Инв. №

				ТП 704-1-249 с. 92 ПМ			
Нач. отд.	Марионов			Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб. м	Стадия	Лист	Листов
Н. конт.	Попова		11.94		РП	13	
Гл. спец.	Рогин		11.94	Сборка конического рулонирования покрытия резервуара (Начало)	Гипронефтеспецмонтаж г. Москва		
Вед. инж.	Чиклова						

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Альбом 6

Типовой проект 704-1-249с. 92

Схема 3. Установка ловителей на полотнище крыши

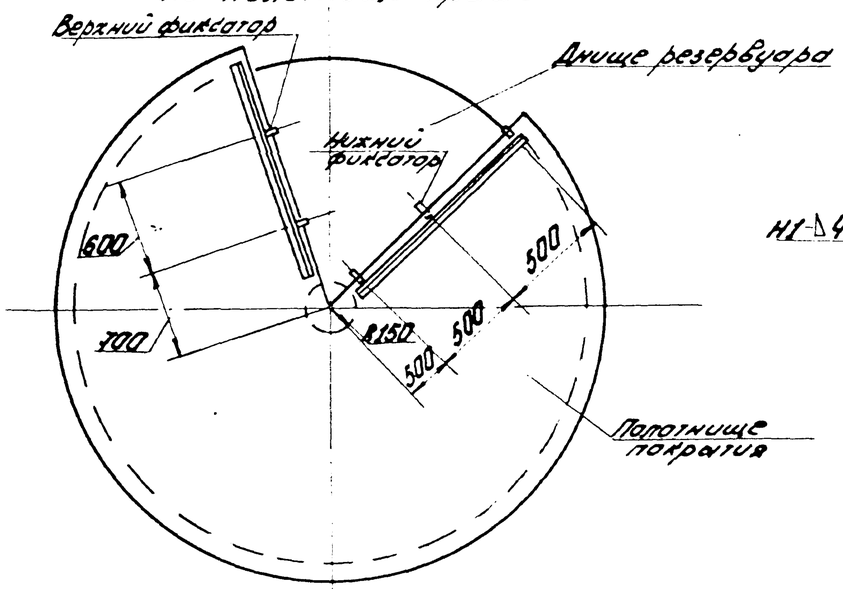

Схема 4. Сборка полотнища крыши в конус.

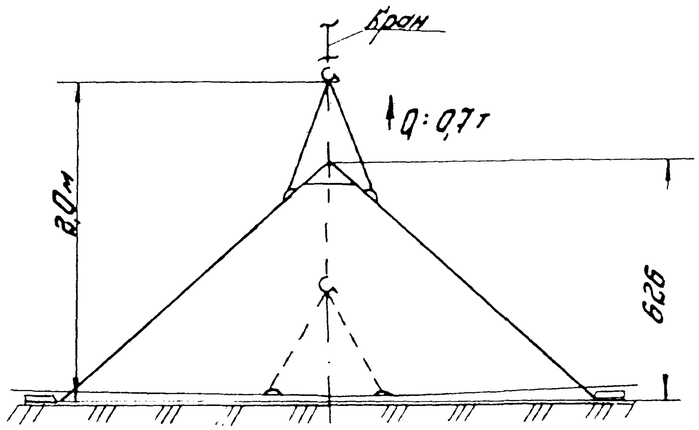

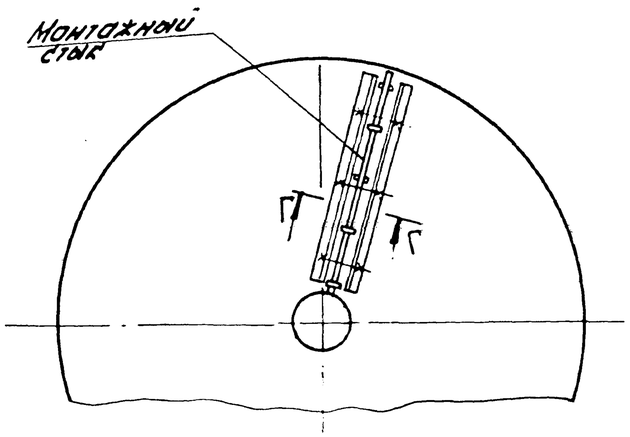

Г-Г (1:2)

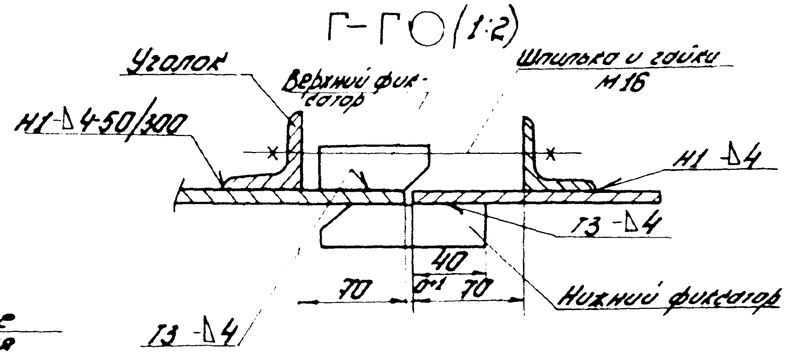

В (1:2) лист

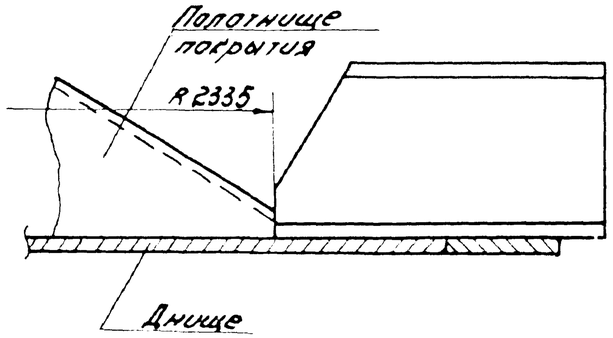

Порядок работ (продолжение)

11. После сборки стыка расстропить полотнище и сварить стык прерывистым швом Δ4-50/300 с наружной стороны.

12. Срезать все монтажные приспособления и заварить стык с наружной стороны проектным швом.

Указания

1. Сборку и сварку стыка с наружной стороны производить с приставных инвентарных монтажных лестниц.

2. Удаление шпилек производить только после сварки стыка покрытия с двух сторон.

3. Приварку монтажных приспособлений к днищу и покрытию резервуара производить электродами типа Э42А ГОСТ 9467-75. Сварной шов выполнять по ГОСТ 5264-80.

Привязан:				ТП 704-1-249с. 92 ПМ				
				Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб. м		Стадия	Лист	Листов
			Нач.отд. Ларионов			РП	14	
			Н.контр. Панова		11.91	Сборка конического рулонированного покрытия резервуара (окончание)		
			Гл.спец. Ролин		11.91	Гипронефтеспецмонтаж г. Москва		
Инв.№			Вед.инж. Чистова					

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Альбом 6

Типовой проект 704-1-249с. 92

А-А

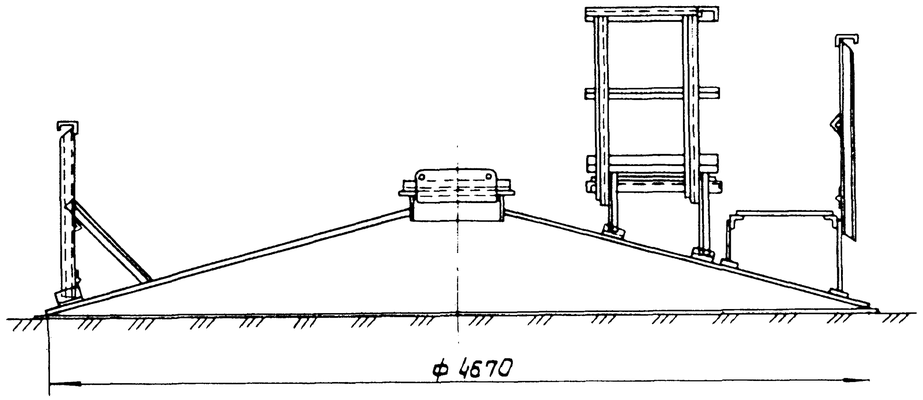

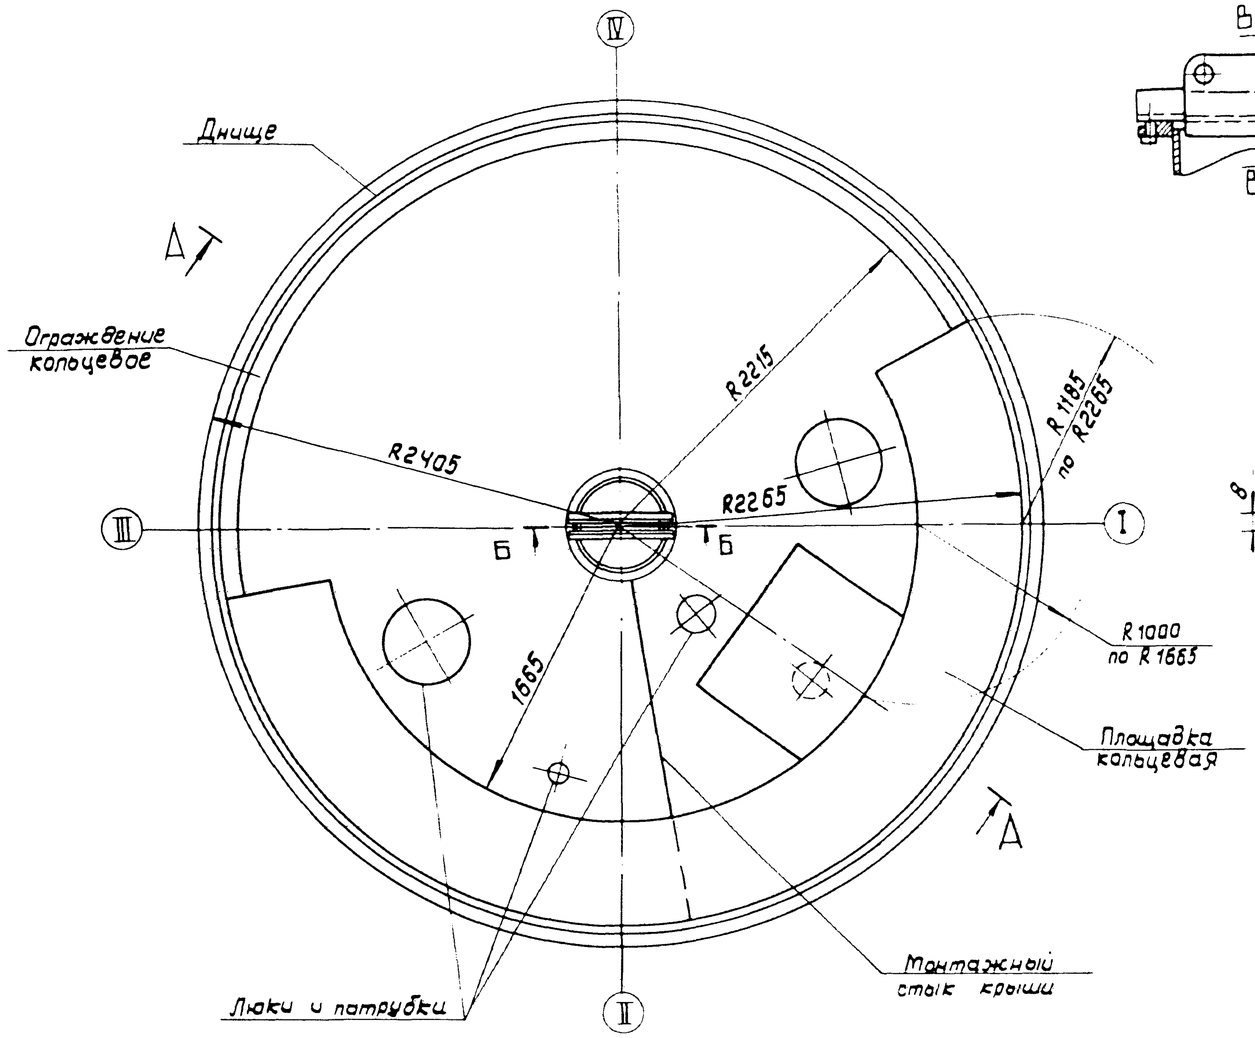

Б-Б



В-В (1:5)



ПОРЯДОК РАБОТ

1. Установить и приварить на крыше ограждение кольцевое.
2. Произвести разметку крыши под вырезку отверстий люков и патрубков.
3. Вырезать отверстия, установить и приварить люки и патрубки.
4. Установить и приварить на крыше площадки обслуживания с ограждениями.
5. Установить строповочное устройство на центральном световом люке, закрепив 4-мя болтами (сеч. Б-Б).
6. Снять крышу с днища краном и установить на подставки в стороне от резервуара.

Строповку крыши см. стр. 14

УКАЗАНИЕ.

Разметку крыши под вырезку отверстий, установку люков, патрубков, площадок обслуживания производить согласно разметке, указанной на чертежах КМ альбома 2.

Привязан:						ТП 704-1-249с. 92, ПМ		
						Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб. м	Стадия	Лист	Листов
				Нач. отд	Ларионов		РП	15	
				Гл. спец	Рохин	11.91	Монтаж площадок и ограждения на крыше	ГИПРОНЕФТЕСПЕЦМОНТАЖ г. Москва	
				Н. контр	Панова	11.91			
Инв №				Инж.	Пак				

Инв № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Альбом 6

Типовой проект 704-1-249с. 92

Схема 1. Установка рулона перед подъемом

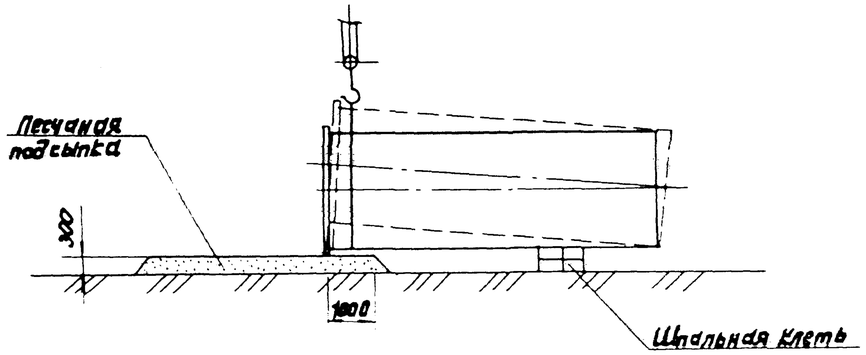

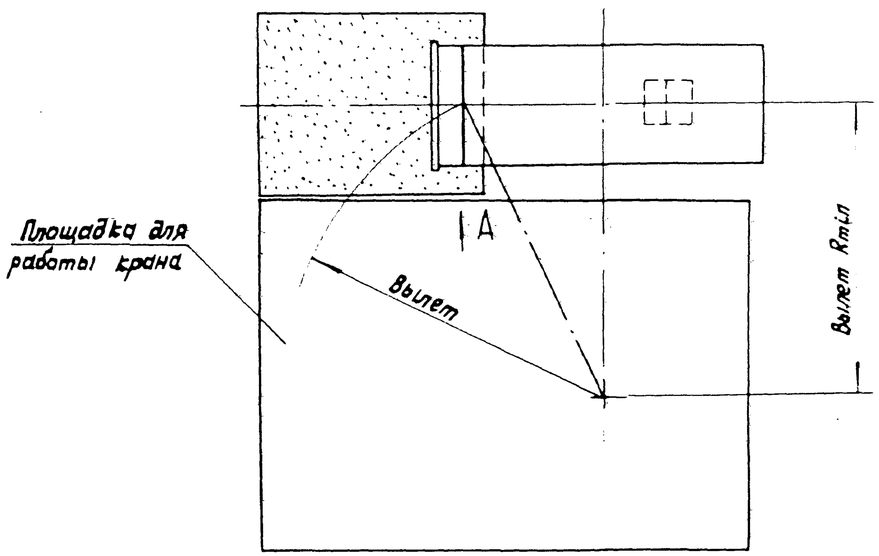

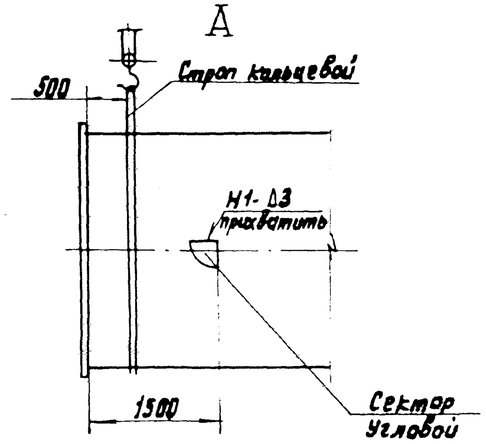

Схема 3. Строповка рулона



В-В

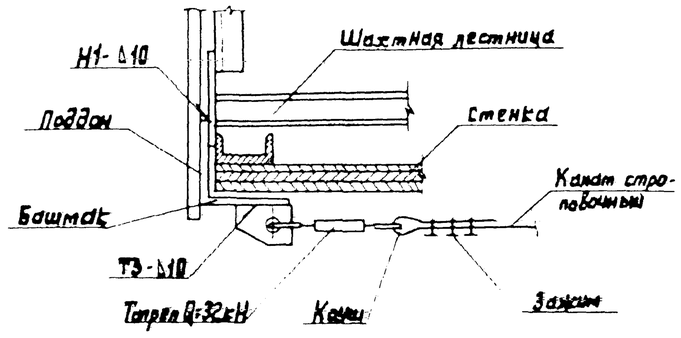

Б. (1:10)

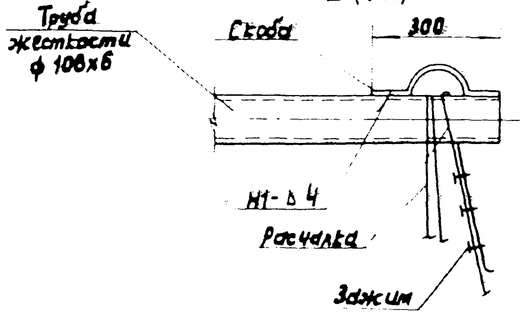

Схема 2. Крепление трубы жесткости к рулону.

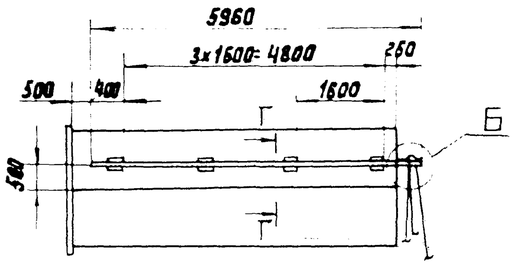

Г-Г (1:10)

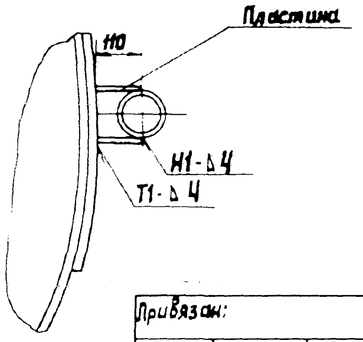

ПОРЯДОК РАБОТ

1. Подготовительные работы.

1.1. Подготовить площадку для установки и перемещения крана, а также площадку для укладки рулона с последующей установкой его в вертикальное положение, обеспечив:

1) горизонтальность площадки (допустимое отклонение не более 1°);

2) несущую способность площадки не менее 0,5 мПа (5кГс/см²).

Проверку производить ударником ДОРНИИ. В случае необходимости площадку укрепить гравием или железобетонными дорожными плитами с песчаной подсыпкой толщиной 50-100 мм.

1.2. Отметить места установки рулона перед подъемом. I и II стоянки крана (схема 4).

1.3. Уложить рулон краном с помощью кольцевого стропа на песчаную подсыпку и шпальную клеть в исходное положение перед подъемом (Схема 1. Вид А).

1.4. Разметить угловой сектор согласно схемы 7 и укрепить его на рулоне (Вид А).

1.5. Установить опорный башмак и произвести строповку рулона (Схема 3. В-В).

1.6. Установить и закрепить на нижнем торце рулона поддон согласно схемы 6.

1.7. Установить трактор на продольной оси рулона (схемы 4).

1.8. Согласно разметки (схема 8) установить шнур для контроля поворота стрелы крана.

1.9. Установить кран в исходное положение I (схема 4). На стреле крана на расстоянии 2 м. от оси рулона подвесить отвес.

1.10. Приподнять верхний конец рулона на 100-150мм. и выдержать в таком положении в течении 10минут, после чего опустить и осмотреть такелажную оснастку при отсутствии неисправностей - продолжить подъем.

2. Подъем рулона стенки.

2.1. Подъем рулона стенки в вертикальное положение осуществлять краном с одной стоянки поэтапно:

I этап. Подъем рулона полиспастом крана с одновременным контролем допустимого отклонения полиспаста от вертикали по соответствующей риске на угловом секторе. Подъём прекратить, когда стрелка совместится с очередной риской на угловом секторе.

Привязан:				ТП 704-1-249с. 92 ПМ				
Инв. №				Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб.м.	Стадия	Лист	Листов	
					РП	16		
Нач. отд. Ларионов; Гл. спец. Рохин; Н. контр. Панова; Инж. Яшина				Подъем рулона стенки краном (начало)	ГИПРОНЕФТЕСПЕЦМОНТАЖ г. Москва			

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Альбом 6

Типовой проект 704-1-249с. 92

Схема 4. Подъем рулона стенки

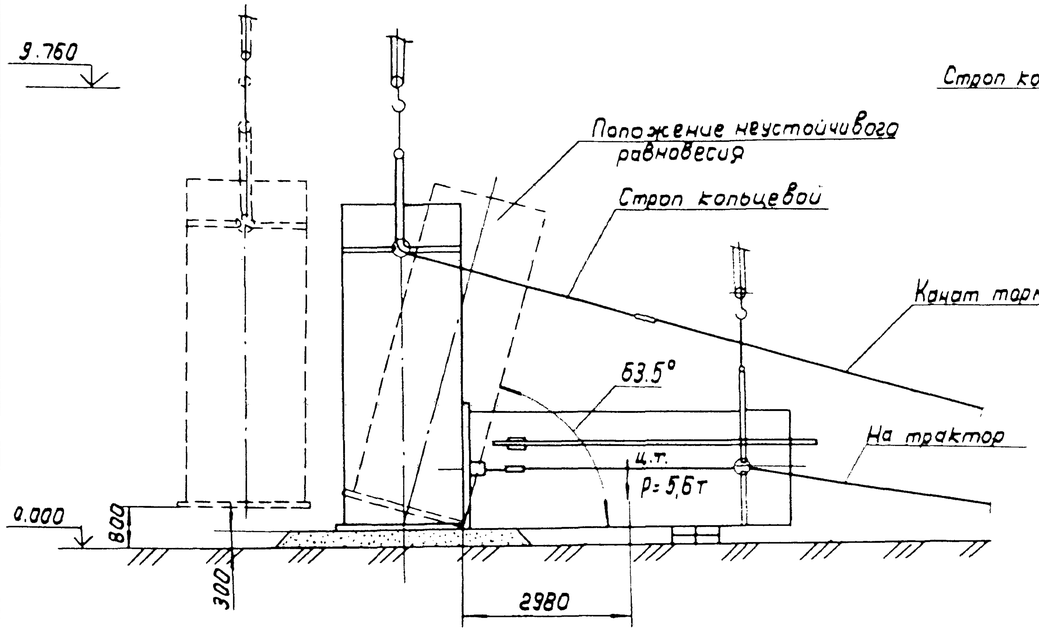

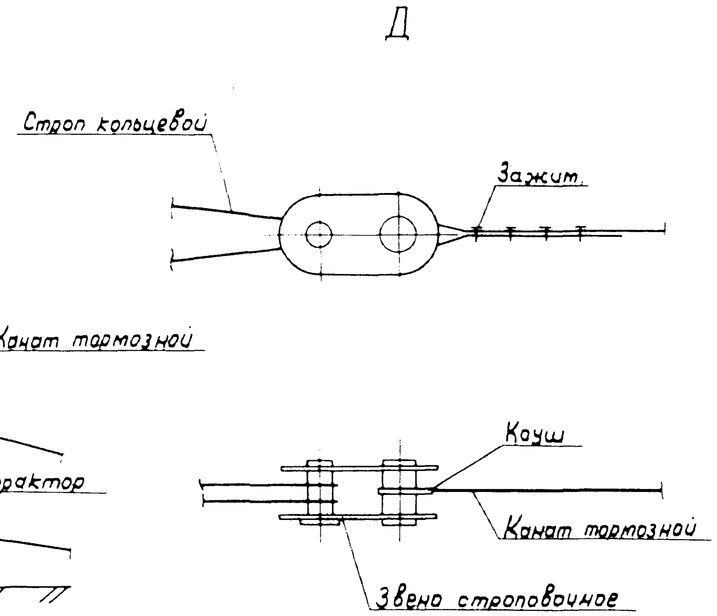

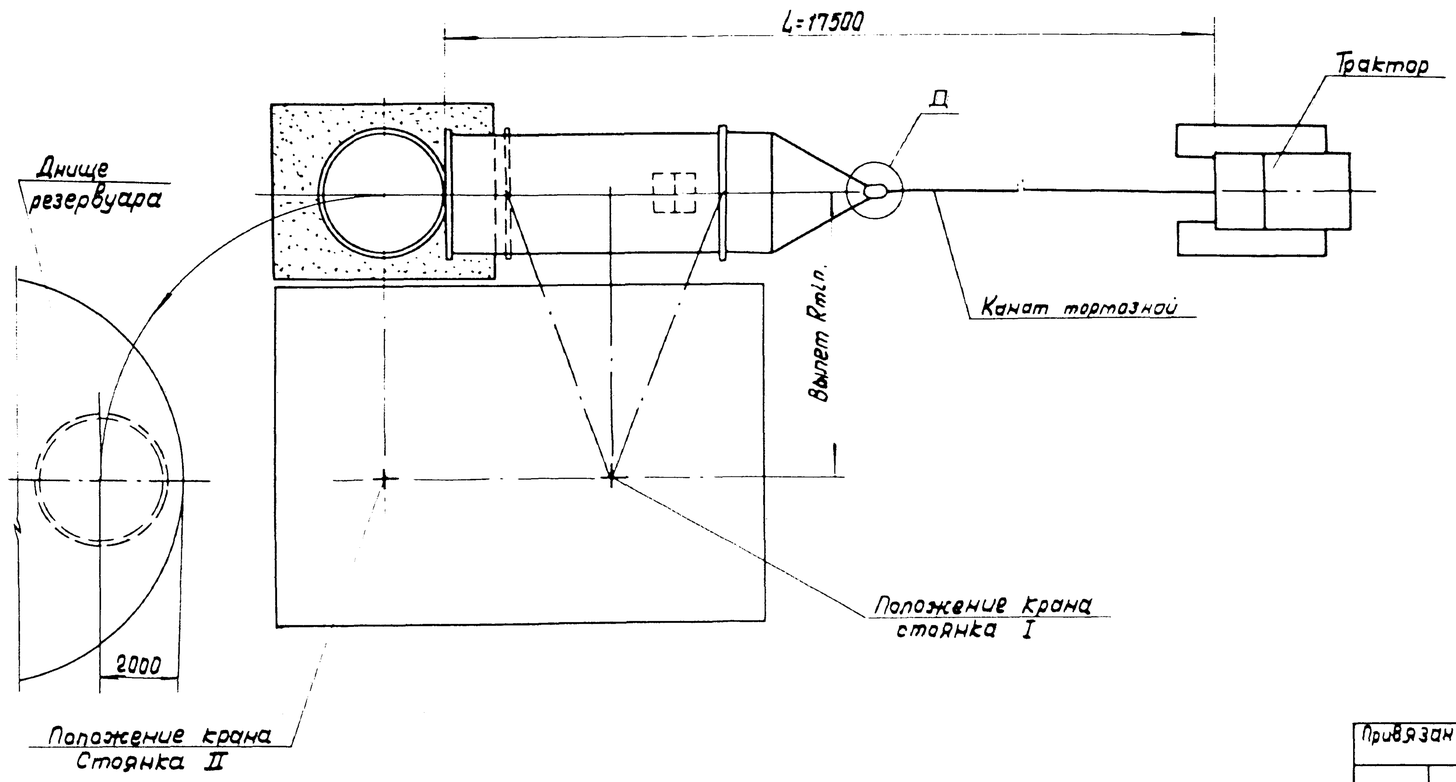

ПОРЯДОК РАБОТ /продолжение/

II этап. Поворот стрелы крана с изменением вылета на очередной угол, соответствующий расстоянию между реперами. Контроль производить по отвесу.

2.2. В процессе подъема руководитель монтажа попеременно дает команду крановщику на очередной этап подъема рулона, прекращая его после получения сигнала от наблюдателя, стоящего напротив углового сектора. После этого он дает сигнал крановщику на поворот стрелы крана до следующей риски.

2.3. При достижении рулоном угла наклона 50° канат тормозного трактора должен иметь провисание.
На дальнейших этапах подъема провисание каната уменьшить до минимума. При достижении рулоном угла наклона $\alpha^{\circ}_{кр.}$ 63.5°, соответствующего положению неустойчивого равновесия, включить в работу тормозной канат, натяжение грузового полиспаста крана ослабить. Перемещением трактора установить рулон в вертикальное положение (схема 4).

3. Установка рулона стенки резервуара.

3.1. Установить кран на II стоянку согласно схемы 4.

3.2. Поднять рулон на 100-150 мм, выдержать в этом положении 10 минут, опустить его и осмотреть такелажную оснастку. При отсутствии неисправностей продолжить подъем на 500 мм. выше днища резервуара и поворотом стрелы плавно установить рулон на днище.

3.3. Произвести расстроповку рулона.

УКАЗАНИЯ

1. Учитывая трудности определения неустойчивого равновесия из-за отсутствия точных данных (силы ветра и др.). после достижения рулоном угла наклона 50° следует уделить особое внимание контролю за провисанием тормозного каната во избежание рывка при включении в работу тормозного трактора.

2. Сварку производить по ГОСТ 5264-80, электродами типа Э-42А, ГОСТ 9467-75

Привязан:				ТП 704-1-249с. 92 ПМ				
				Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб.м	Стадия	Лист	Листов	
			Нач.отд. Ларионов		РП	17		
			Гл.спец. Рохин	11.91	Подъем рулона стенки краном (продолжение)	ГИПРОНЕФТЕСПЕЦМОНТАЖ г. Москва		
			Н.контр. Панова	11.91				
Инв №			Инж. Яшина					

Взам. инв. | Подпись и дата | Инв. № подл.

Альбом 6

Типовой проект 704-1-249с. 92

Схема 5.

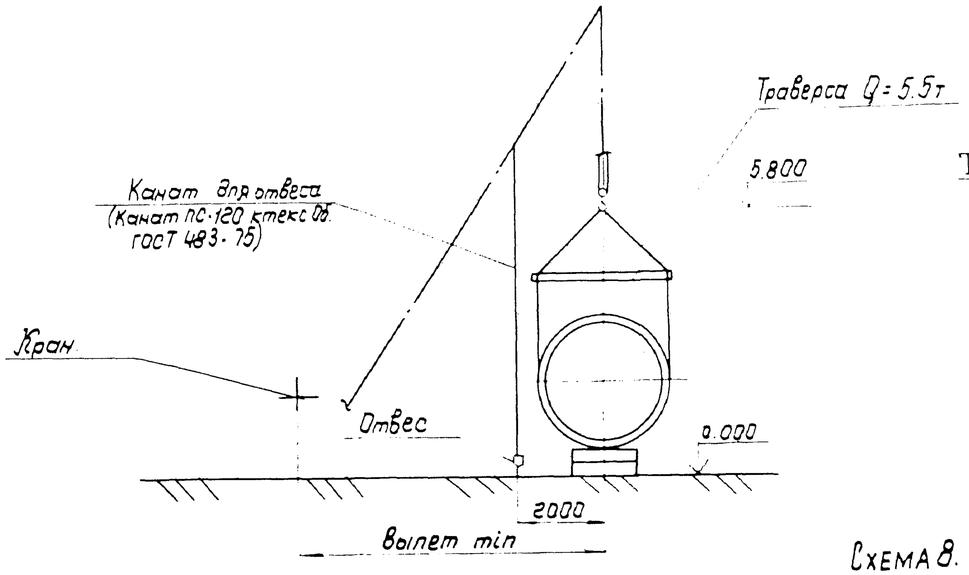

Схема 6. Крепление рулона к поддону

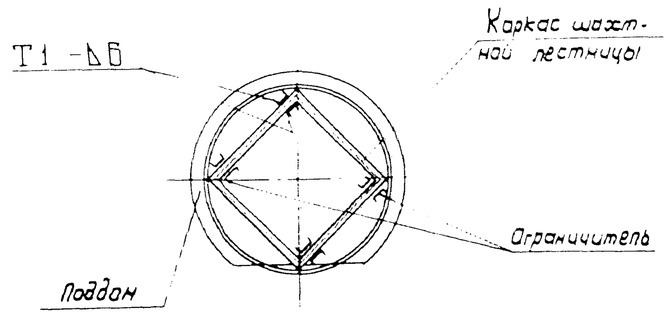

Схема 8. Разметка шнура для поворота стрелы.

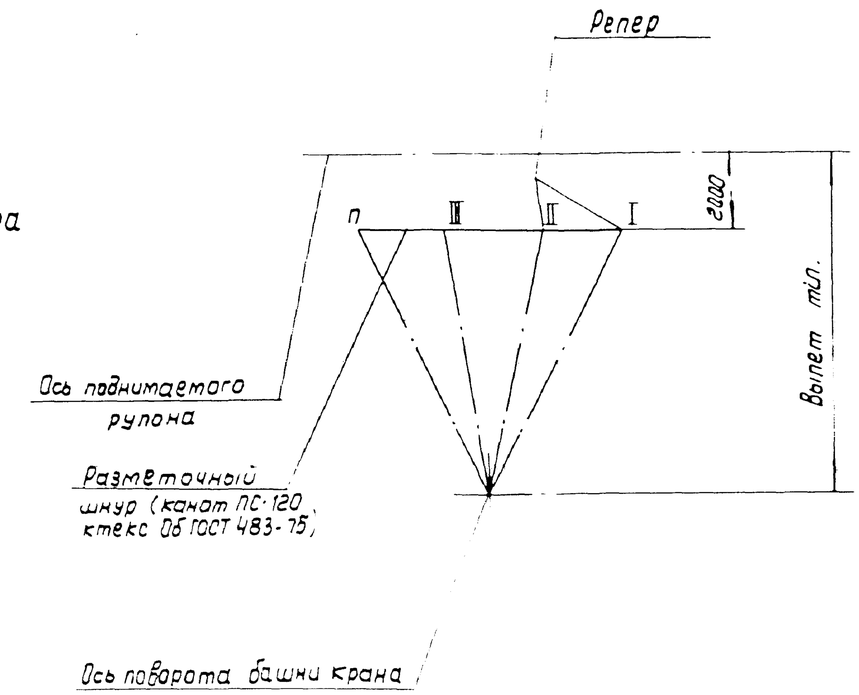

Схема 7. Разметка углового сектора резервуара

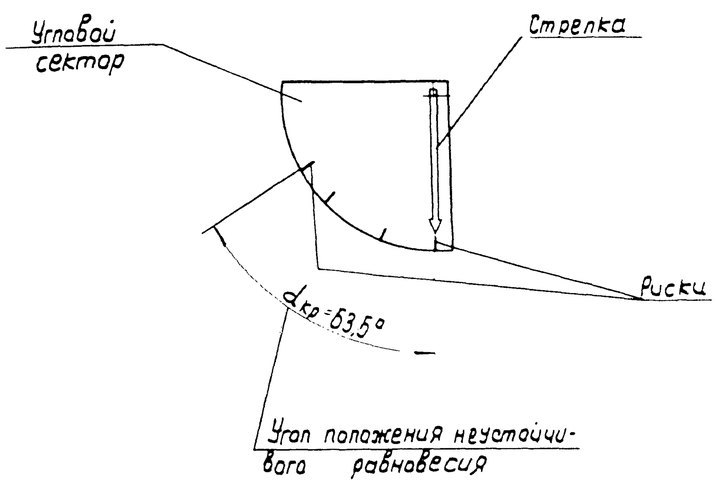

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

1. Подъем рулона запрещается производить в гололедицу, при сильном тумане, снегопаде или ветре более 10 м/с.
2. Перед подъемом необходимо проверить исправность крана. Площадка для передвижения и маневрирования крана должна полностью просматриваться.
3. Руководитель подъема должен постоянно находиться в поле зрения машиниста крана, который должен видеть его сигналы, а также слышать команду. Команды машинисту крана и трактористу подает только руководитель подъема.
4. При подъеме рулона стенки в вертикальное положение в зоне подъема (в радиусе L от нижнего края рулона и под канатом) не должны находиться люди.
5. Опасную зону оградить сигнальным стоечным ограждением согласно ГОСТ 23407-78.

				ТП 704-1-249с. 92 ПМ				
Привязан:				Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб.м	Стадия	Лист	Листов	
			Нач.отд. Ларионов		РП	18		
			Гл.спец. Рохин	11.91	Подъем рулона стенки краном (окончание)	ГИПРОНЕФТЕСПЕЦМОНТАЖ г. Москва		
			Н.контр. Панова	11.91				
Инв. №			Инж. Яшина					

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

25605-06 20

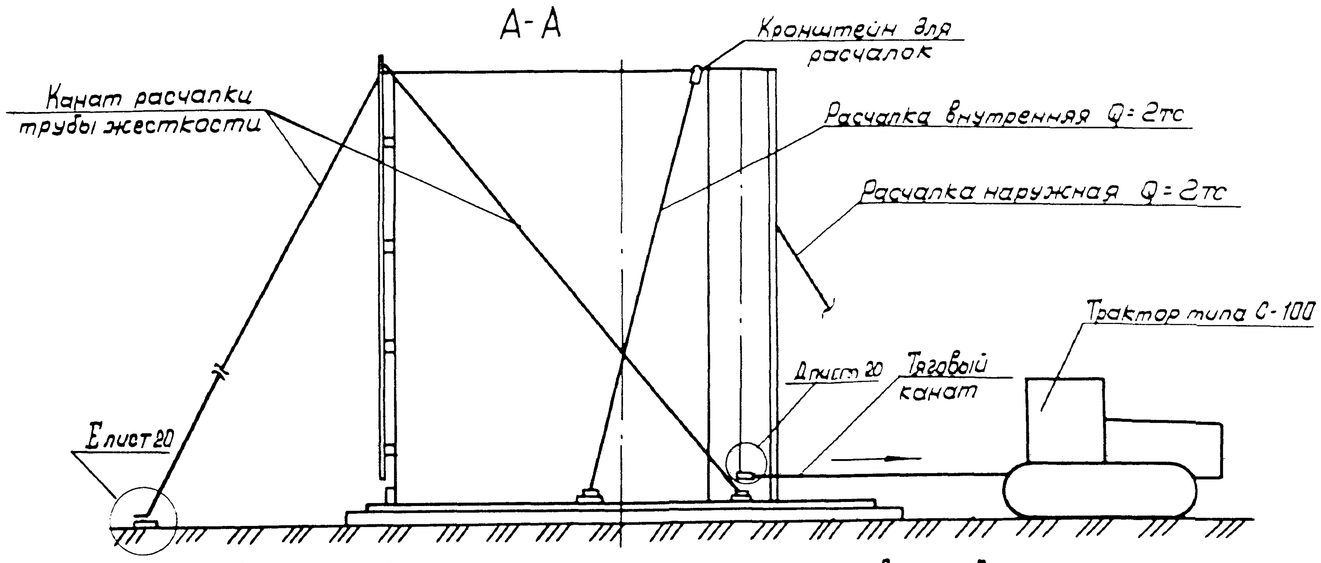

Схема 1. Расположение оснастки при разворачивании рулона.

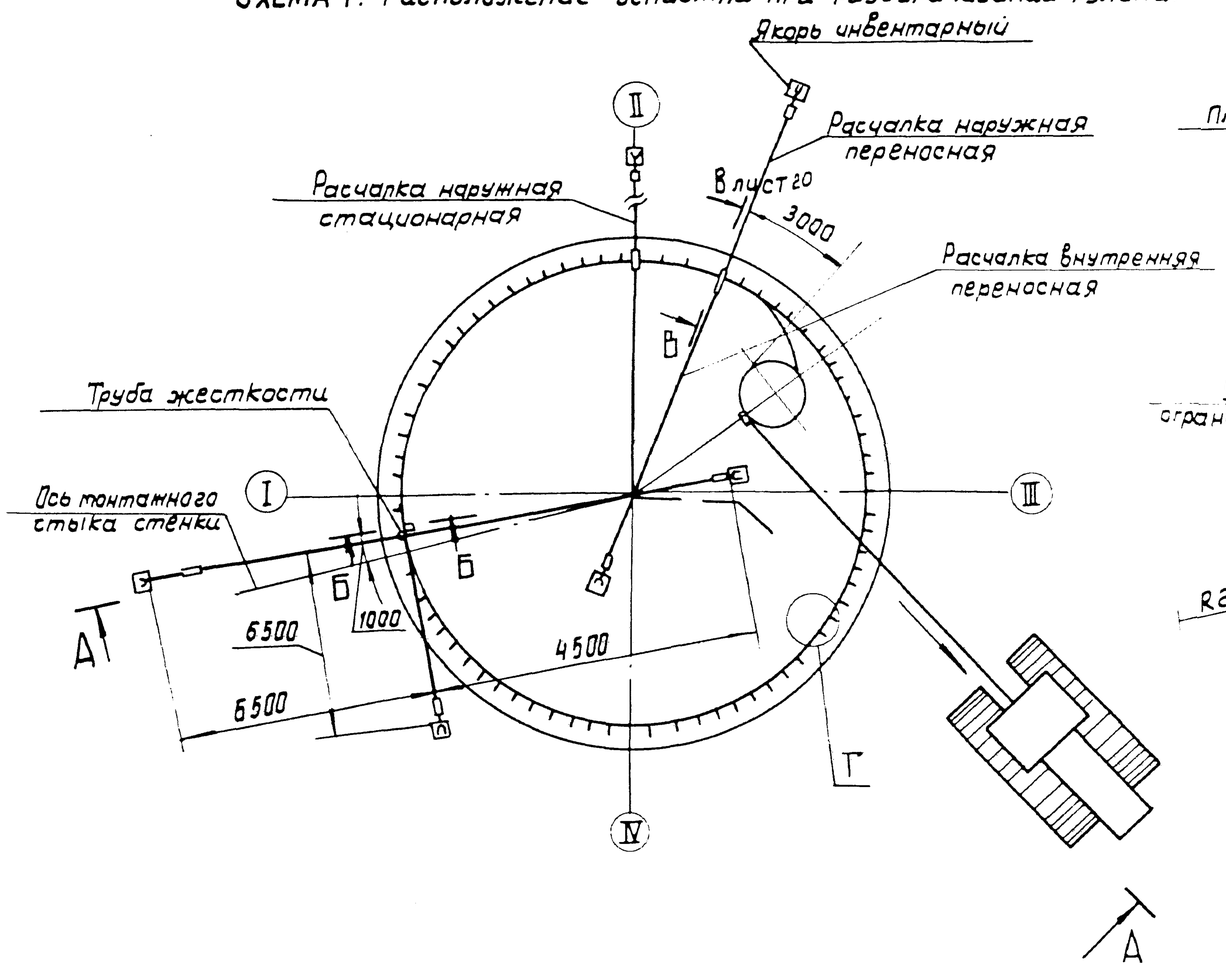

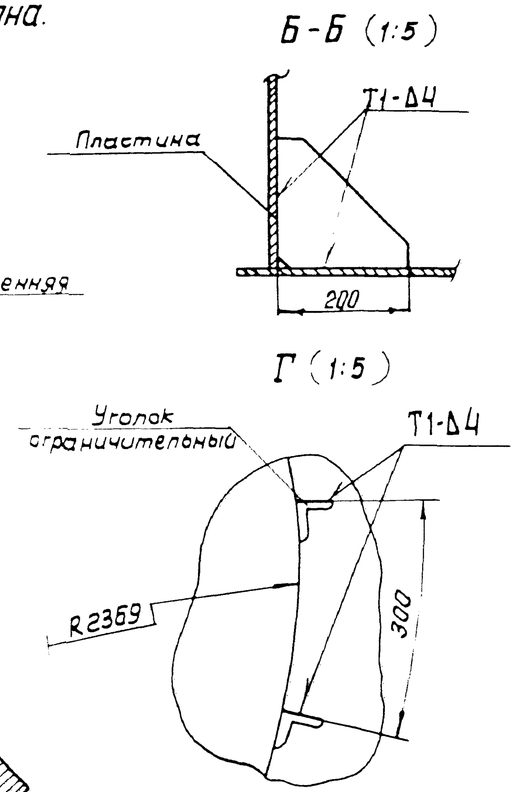

ПОРЯДОК РАБОТ

1. Приварить на днище по кольцевой риске R2369мм ограничительные уголки с шагом 300мм (узел Г).
2. Установить рулон на днище так, чтобы после срезки удерживающих планок вертикальная кромка расположилась согласно разметке.
3. До срезки удерживающих планок, для предотвращения самопроизвольного распушивания, рулон обтянуть несколькими витками каната (удлиненная расчалка трубы жесткости), прикрепить его к крюку трактора и натянуть.
4. Произвести срезку удерживающих планок с автогидроподъемника АГП-12 (схема 6). До срезки последних двух нижних планок приварить к рулону тяговую скобу с канатом для развертывания рулона.

   Последние планки срезать, стоя на днище со стороны, противоположной развертыванию.
5. Ослабляя натяжение каната, дать возможность рулону распушиться.
6. Начальный участок полотнища временно закрепить к днищу приваркой косынки (сеч. Б-Б) на расстоянии 1000мм от вертикальной кромки.
7. Проверить вертикальность начальной кромки полотнища по отвесу, закрепленному к трубе жесткости, и зафиксировать полотнище в этом положении тремя расчалками.
8. По мере развертывания рулона производить прихватку полотнища стенки к днищу швом 3-40/400 (в местах неплотного прилегания стенки к ограничительным уголкам произвести прижатие стенки с помощью клина или реечного домкрата). Схема 2.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан:				ТП 704-1-249с.92			
				Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб.м	Стадия	Лист	Листов
			Нач.отд. Ларионов		РП	19	
			Гл.спец. Рохин				
			Н.контр. Панова	Разверывание полотнища стенки резервуара (начало)	Гипронефтеспецмонтаж г. Москва		
Инв.№			Инж. Пак				

Альбом 6

Типовой проект 704-1-249с. 92

Д лист 19

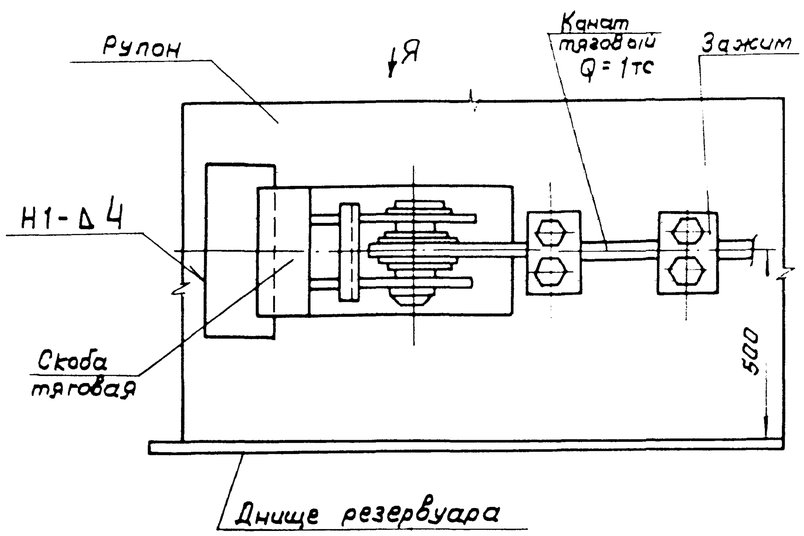

Я

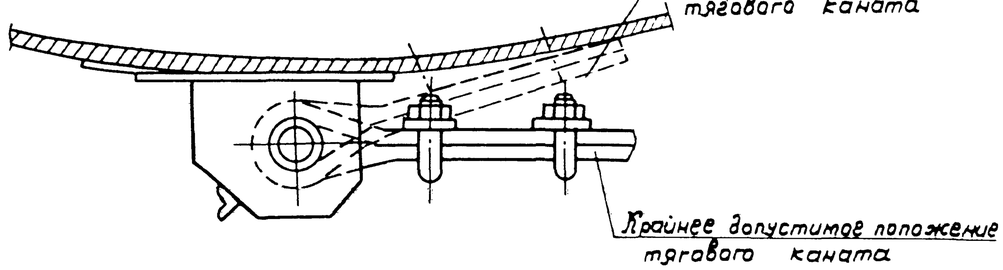

В-В ↻ лист 19

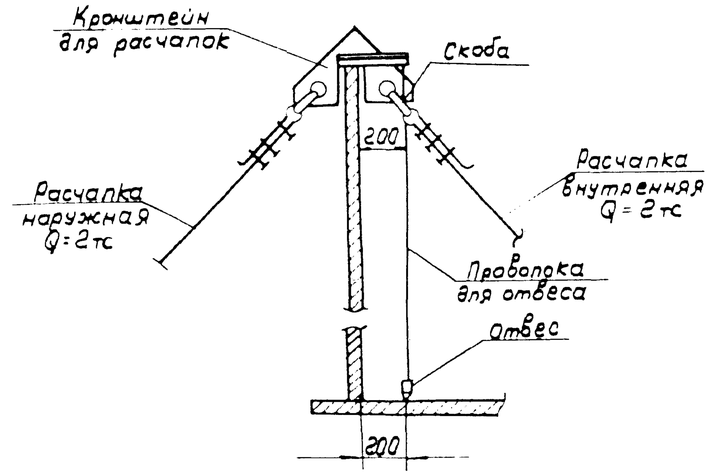

ПОРЯДОК РАБОТ (продолжение)

9. В процессе всего развертывания стенки производить постоянный контроль ее вертикальности по отвесу (сеч. В-В). При необходимости стенку выводить в вертикальное положение с помощью переносных расчалок.

10. При развертывании полотнища стенки по осям II и IV устанавливаются стационарные расчалки. Переносная расчалка находится на расстоянии 3м от перемещаемого рулона (схема 1).

11. Установку и прихватку обрамляющего уголка производить по мере развертывания рулона.

12. После развертывания полотнища стенки производить замыкание вертикального монтажного стыка стенки.

13. Сварку стенки с днищем, покрытия к стенке и вертикального монтажного стыка производить в соответствии с технологией сварки.

Схема 2. Прижатие полотнища стенки к ограничительным уголкам

1) домкратом

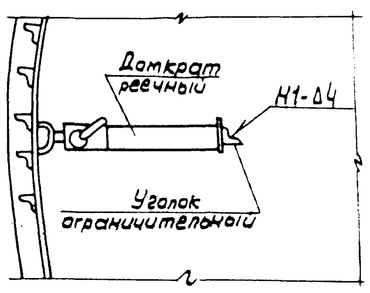

2) клином

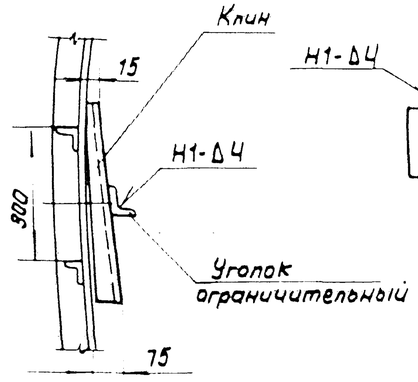

Е лист 19

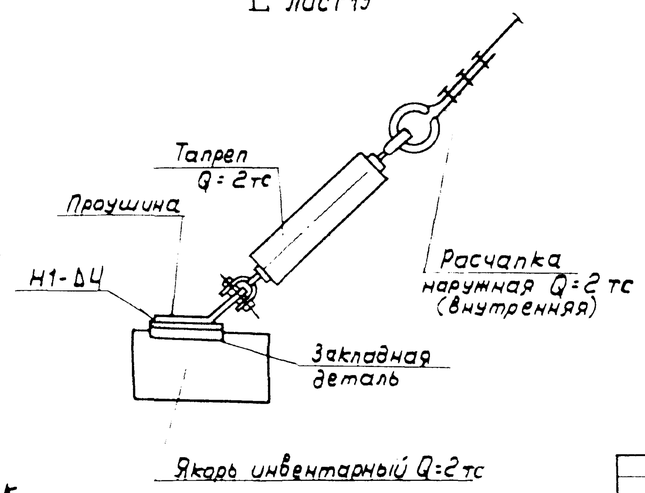

Привязан:						ТП 704-1-249с. 92			ПМ
						Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута ёмкостью 100 куб. м	Стадия	Лист	Листов
				Нач.отд	Ларионов		РП	20	
				Гл.спец.	Рохин	11.91	Разворачивание полотнища стенки резервуара (продолжение)	ГИПРОНЕФТЕСПЕЦМОНТАЖ г. Москва	
				Н.контр	Панова	11.91			
Инв. №				Инж	Пак				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

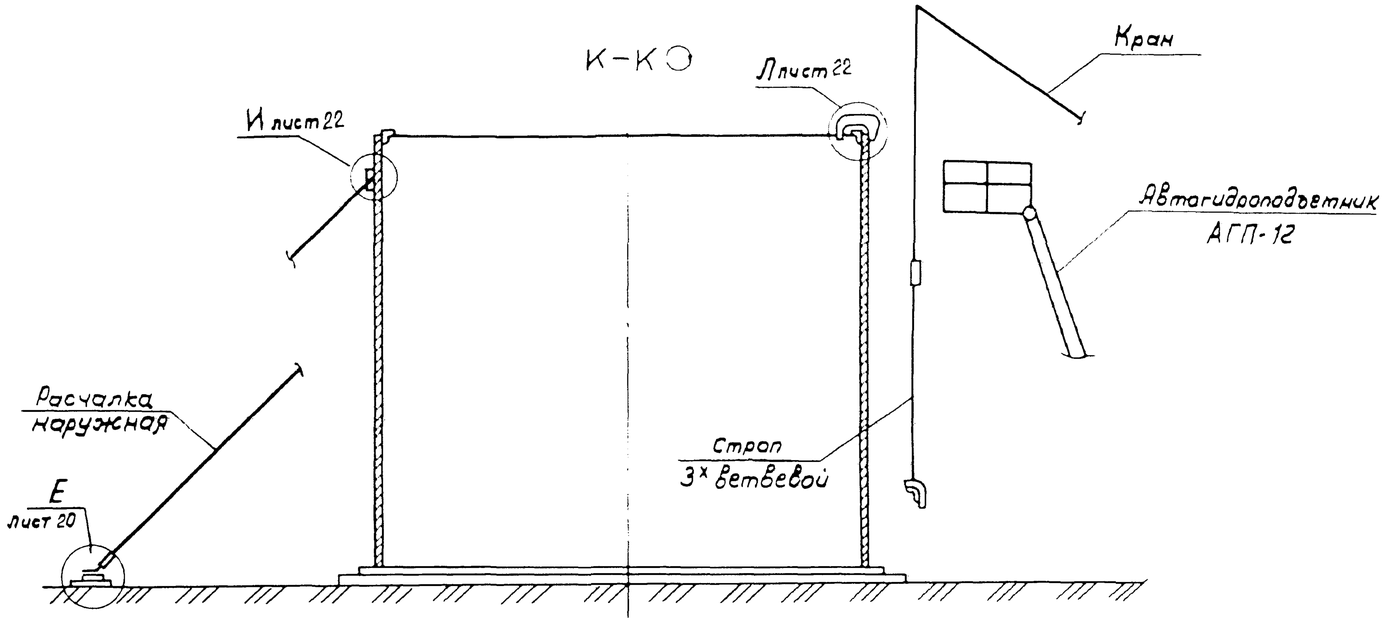

Схема 3. Установка обрамляющего уголка резервуара

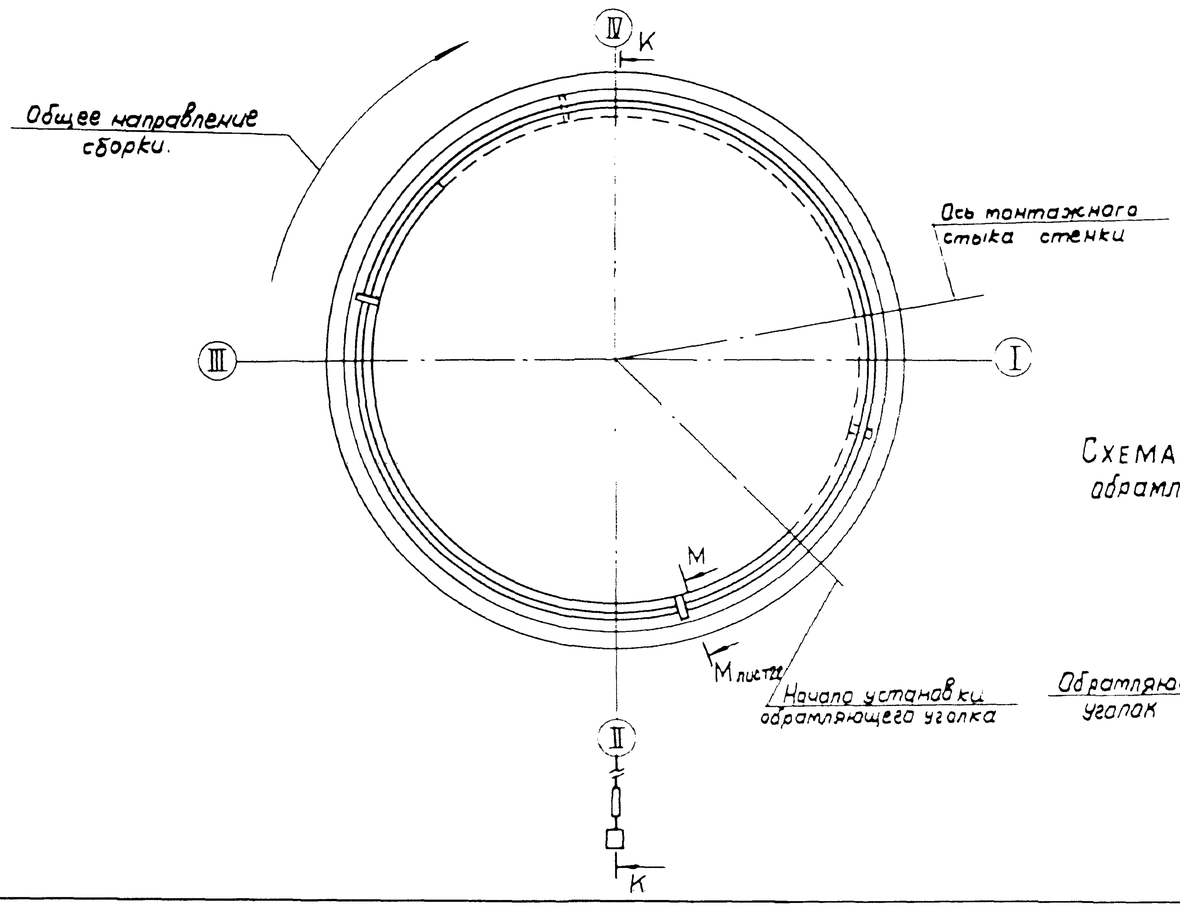

Схема 4. Установка обрамляющего уголка



ПОРЯДОК РАБОТ К СХЕМЕ 3.

1. Установить автогидроподъемник АГП-12 в место установки первого элемента обрамляющего уголка.
2. Приварить к элементам обрамляющего уголка по два ловителя с отвесами (сеч. М-М).
3. Произвести строповку элемента обрамляющего уголка согласно схеме 5.
4. Поднять краном и навесить элемент обрамляющего уголка на стенку, стоя на автогидроподъемнике.
5. Проверить по отвесам вертикальность стенки. и в случае необходимости вывести стенку в вертикальное положение с помощью талрепов расчалок (узел Е). По мере подгонки уголок прихватить к стенке.
6. Следующий элемент обрамляющего уголка установить аналогично установке первого элемента уголка. в месте стыковки элементов обрамляющего уголка проверить, чтобы их горизонтальные полки были на одном уровне (без выступов).
7. Прижатие уголка к стенке резервуара производить струбциной (узел Л).
8. Последний элемент обрамляющего уголка установить после сварки вертикального стыка стенки.
9. Удалить все ловители и расчалки. Места приварки зачистить.

УКАЗАНИЯ

1. До начала монтажа обрамляющего уголка проверить его периметр.
2. Место установки первого элемента обрамляющего уголка - т. Б. перенести на верхнюю кромку стенки с днища (ст. „Разметку днища").
3. После сборки всего кольца обрамляющего уголка на прихватках приступить к его сварке проектным сварным швом.
4. Приварку монтажных приспособлений к днищу и стенке резервуара производить электродами марки Э42А по ГОСТ 9467-75. Сварной шов выполнять по ГОСТ 5264-80.

Привязан				ТП 704-1-249с. 92 ПМ		
Нач. отд	Ларионов			Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 тыс. м³	Стадия	Лист	Листов
Гл. спец	Рахин		11.91		РП	21	
Н. контр	Панова		11.91	Развертывание полотнища стенки резервуара (продолжение)	ГИПРОНЕФТЕСПЕЦМОНТАЖ г. Москва		
Инж	Пак						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Альбом 6

Типовой проект 704-1-249 с. 92

Схема 5. Строповка обрамляющего уголка.

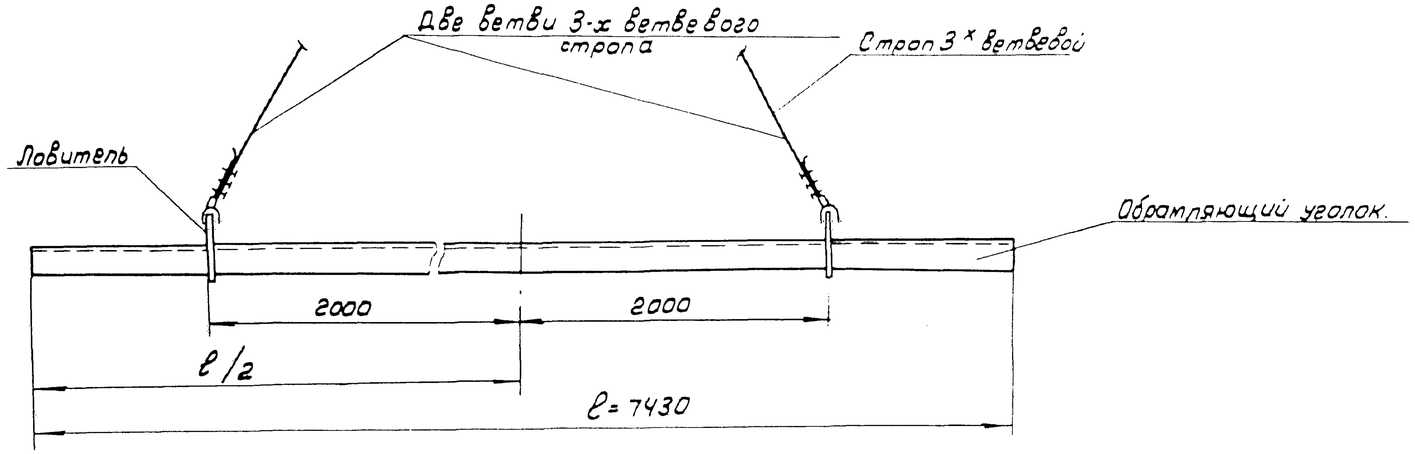

М–М ○ (1:5) лист 21

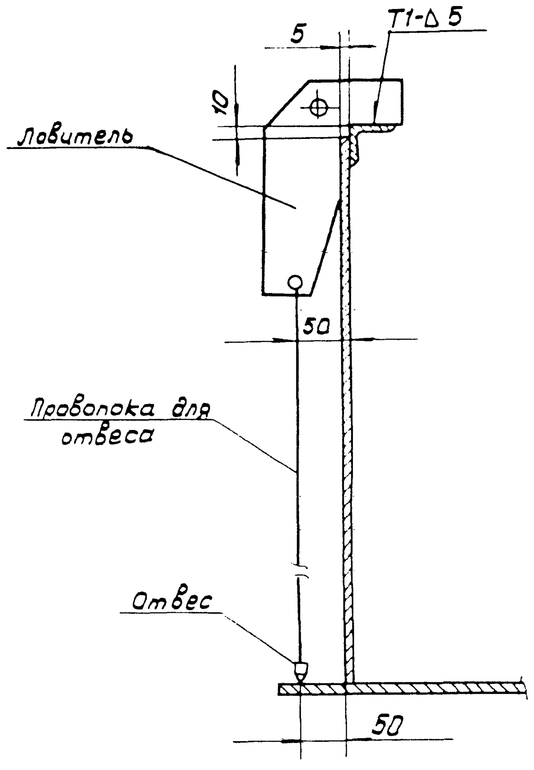

И (1:5) лист 21

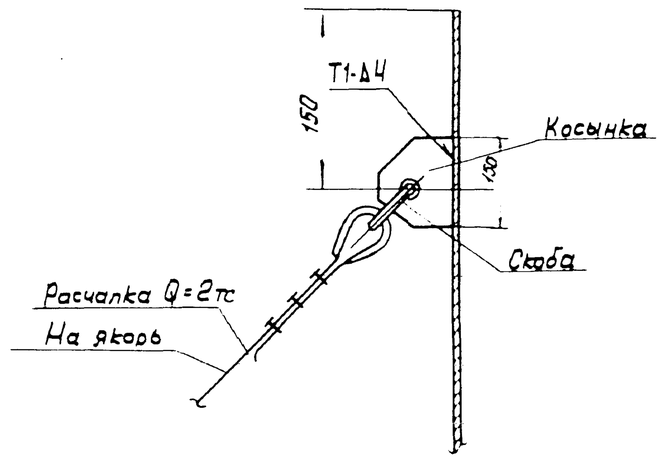

Л (1:5) лист 21

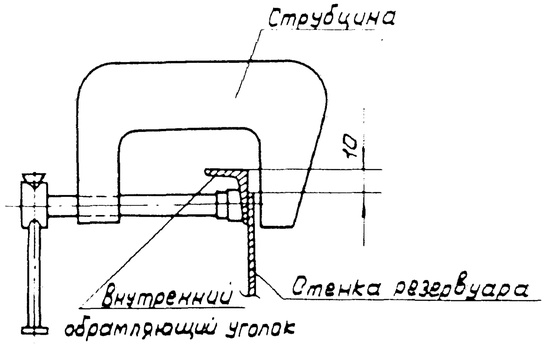

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

1. До срезки удерживающих планок обмотать рулон удлиненной (надставленной) расчалкой, закрепленной к трубе жесткости (схема 6). Срезку производить с автогидроподъемника АГП 12.
2. После срезки удерживающих планок ослабить канат, идущий на трактор, давая рулону распушиться.
3. Для развертывания начального участка полотнища приварить тяговую скобу (схема 7), предварительно приварив ограничительную пластину (сеч. Б-Б).
4. До срезки тяговой скобы, не ослабляя натяжение тягового каната, установить клиновой упор между рулоном и развернутой частью стенки. Вершина клинового упора должна находиться на прямой, проходящей через центры резервуара и рулона (схема 8).
5. Ослабить натяжение тягового каната до прижатия рулона к клиновому упору и погашения упругих деформаций полотнища.
6. Приварить вторую тяговую скобу с канатом и снять первую.
7. Сварной шов тяговой скобы не должен работать на излом, т.е. развертывание производить до положения тягового каната по касательной к рулону.
8. Приварку тяговой скобы должен производить квалифицированный сварщик, имеющий удостоверение на право производства ответственных сварочных работ
9. Устойчивость стенки резервуара в процессе ее монтажа должна быть обеспечена строгим соблюдением последовательности установки расчалок.

					ТП 704-1-249 с. 92		ПМ
привязан					Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб. м	Стадия	Лист	Листов
						РП	22	
		Нач. отд	Ларионов		Развертывание полотнища стенки резервуара (продолжение)	ГИПРОНЕФТЕСПЕЦМОНТАЖ г. Москва		
		Гл. спец	Рохин	11.91				
		Н. контр	Панова	11.91				
Инв. №		Инж	Пак					

Схема 6 Рулон перед срезкой планок.

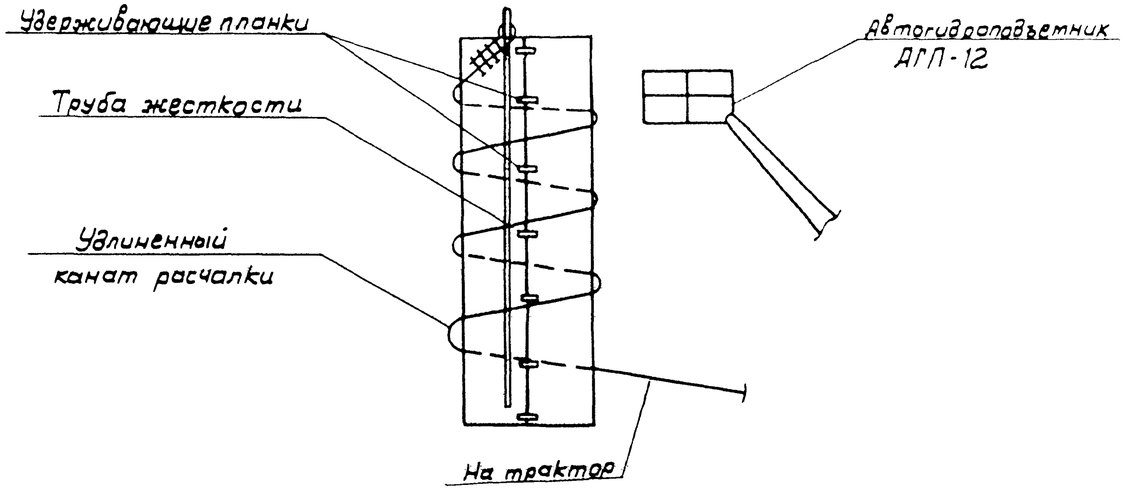

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРУДА (продолжение)

10. Запрещается пребывание людей в зоне между развернутой частью полотнища и рулоном, и в зоне развертывания рулона (схема 8).

Сварщик должен находиться на расстоянии не менее 1м. от клинового упора.

Бригадир должен отработать систему связи и сигнализации, располагаясь на расстоянии 6м от разворачиваемого рулона.

11 Оставлять рулон, находящийся в стадии развертывания (обеденный перерыв или по окончании стены), допускается после установки клинового упора в рабочее положение.

Схема 7. Начало развертывания полотнища стенки резервуара.

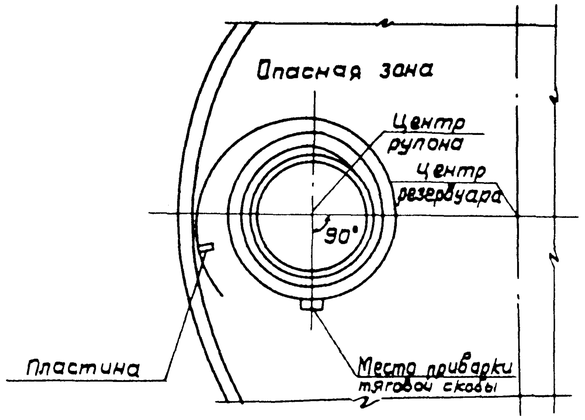

Схема 8. Промежуточное положение при развертывании полотнища стенки.

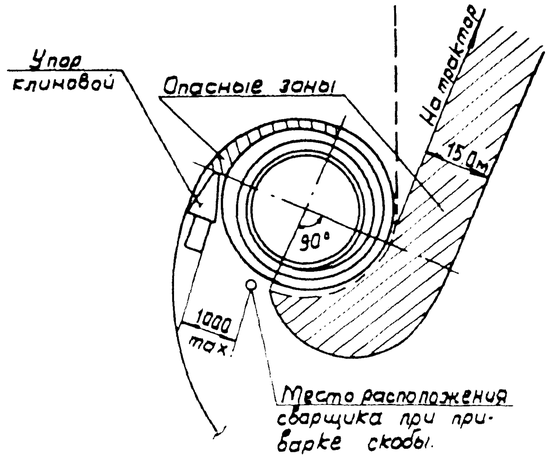

Альбом 6

Типовой проект 704-1-249с. 92

Привязан:					ТП 704-1-249с. 92			ПМ
			Нач. отд	Ларионов	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб. м	Стадия	Лист	Листов
			Гл. спец	Рохин		РП	23	
			Н. контр	Панова	Развертывание полотнища стенки резервуара (окончание)	ГИПРОНЕФТЕСПЕЦМОНТАЖ г. Москва		
Инв. №			Инж	Пак				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 6

Типовой проект 704-1-249 с.

Схема 1. Установка приспособления для замыкания и подмостей

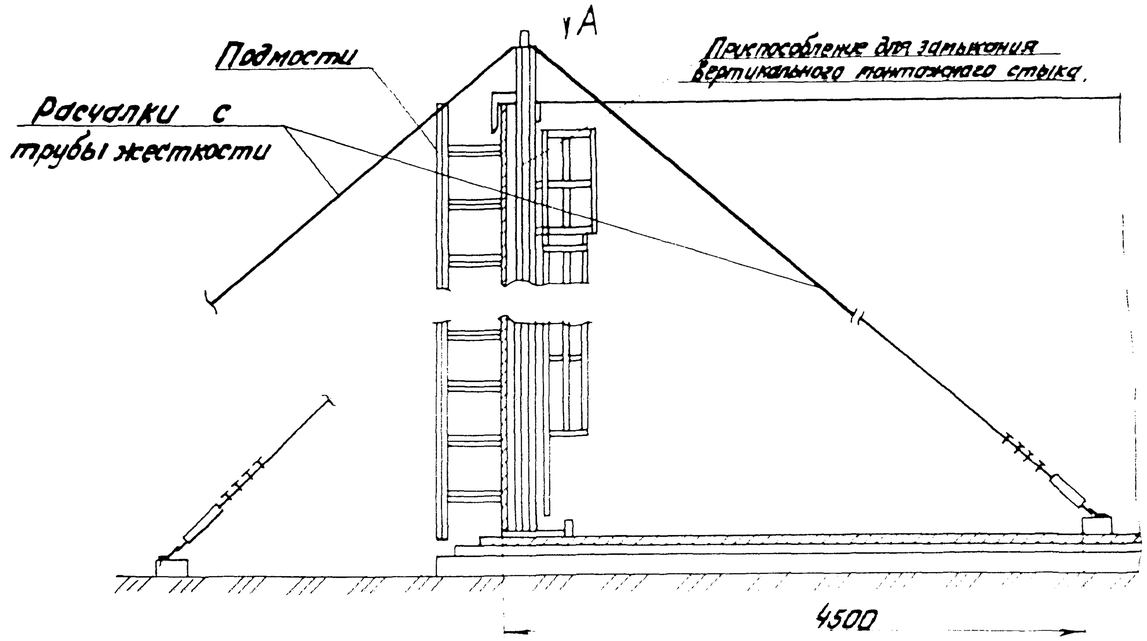

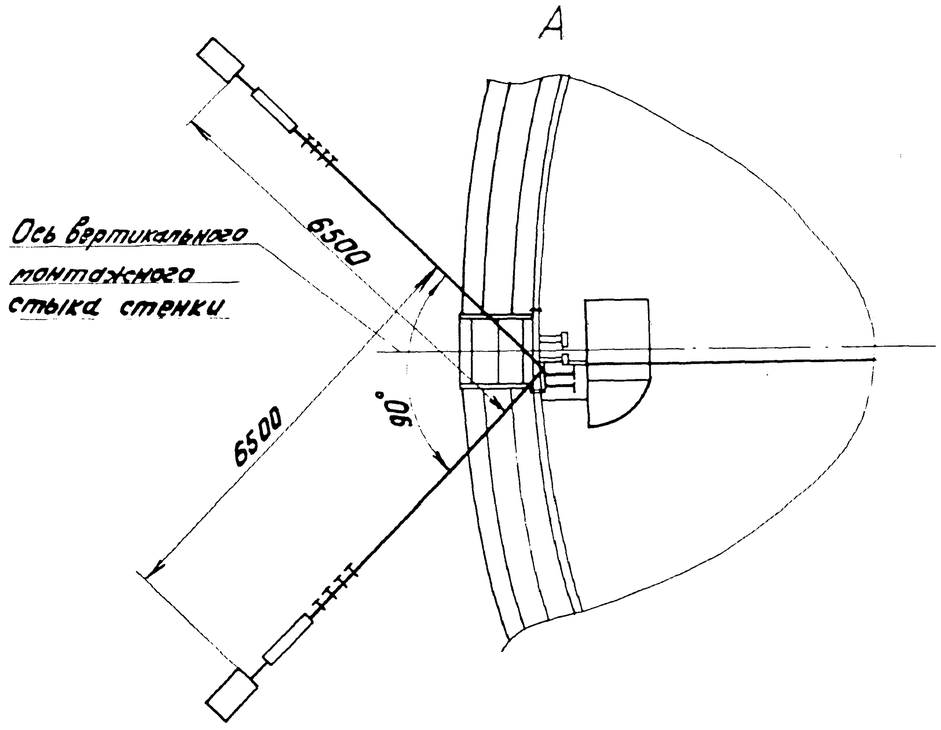

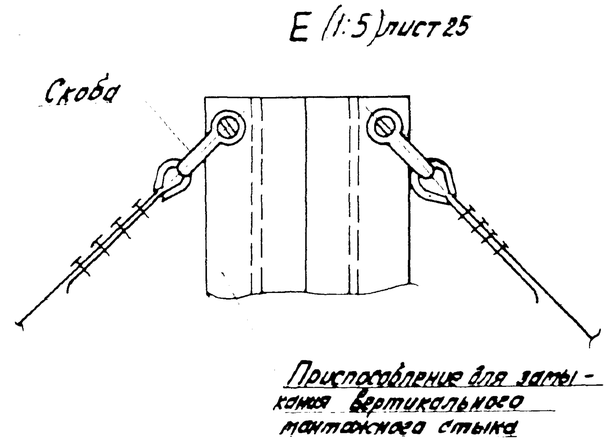

Порядок работ

1. До замыкания вертикального монтажного стыка стенки завести внутрь резервуара приспособление для замыкания вертикального монтажного стыка.

2. Вывести домкратами концевые участки полотнища стенки за контрольную риску R 2369 мм (радиус резервуара наружный) на величину, равную 6 мм (1,5 толщины нижнего пояса стенки).

Зафиксировать стяжные кронштейны в этом положении приварными пластинами (сеч. Г-Г.)

3. Установить в исходное положение приспособление для замыкания закрепить подпятник, приварив ограничители (сеч. Б-Б, сеч. Д-Д).

Проверить по отвесам вертикальность приспособления и зафиксировать это положение расчалками (схема 1, вид Е, вид А).

4. Произвести выравнивание стенки в зоне стыка с помощью винтов приспособления (сеч. В-В).

Стык выставить вертикально, контроль производить по отвесу.

5. Установить с наружной стороны подмости.

6. Произвести срезку нахлеста стыка, выдерживая прямолинейность реза и зачистку кромок под сварку.

7. Произвести сборку стыка на прихватках (при необходимости применять стяжные приспособления) и его сварку.

						ТП 704-1-249 с. 92		ПМ
Привязан						Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб.м	Стадия	Лист	Листов
				Нач.отд	Ларионов		РП	24	2
				Гл.спец.	Россин				
				Н.контр.	Панова		Замыкание вертикального монтажного стыка стенки резервуара (начало)	Гипронефтеспецмонтаж г. Москва	
Инв. №				Инж.	Пок				

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Альбом 6

Типовой проект 704-1-249с. 92

Схема 2. Строповка приспособления для замыкания

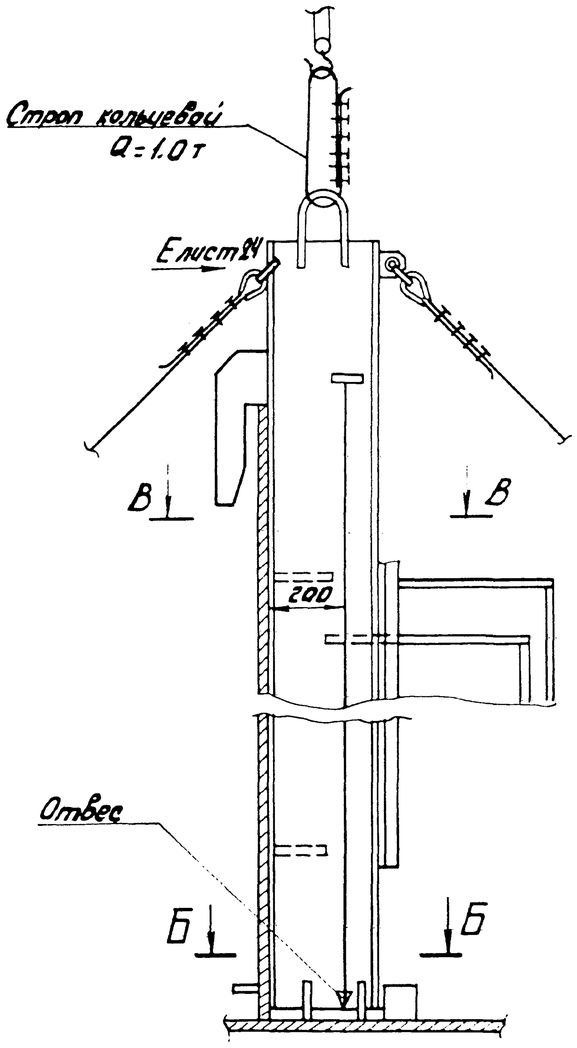

Б-Б (1:20)

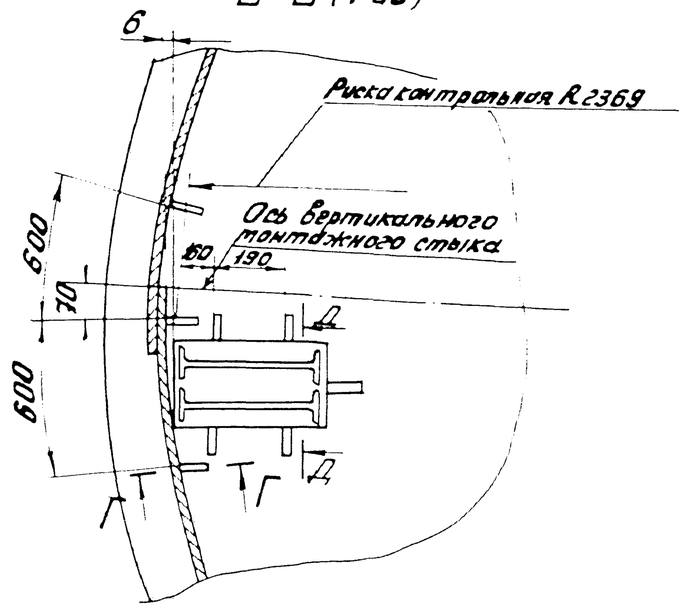

В-В (1:20)

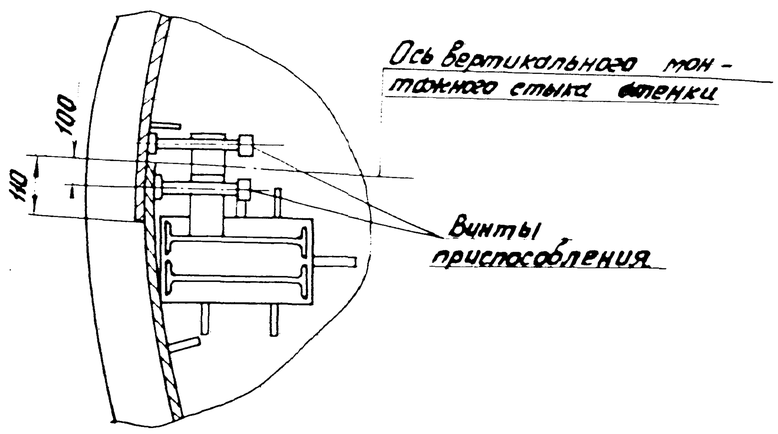

Д-Д (1:20)



Схема 3. Установка стяжного приспособления

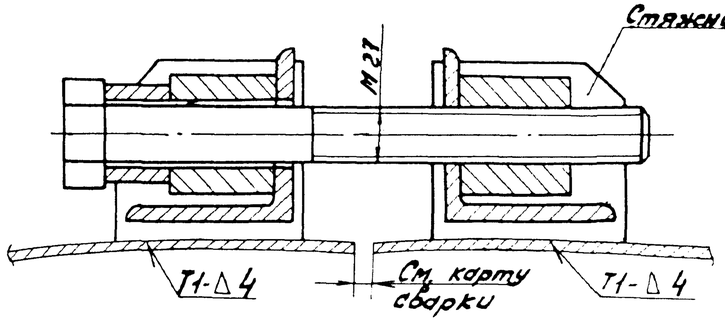

Г-Г (1:5)

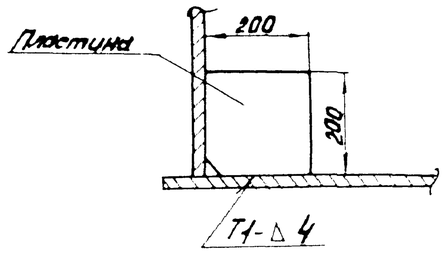

Указания

1. Расположение вертикального монтажного стыка стенки уточнить с учетом фактического состояния кромок полотнища.
2. При расчаливании приспособления для замыкания стыка использовать расчалки с демонтированной трубы жесткости.
3. Приварку монтажных приспособлений к стенке и днищу резервуара производить электродами типа Э42А по ГОСТ 9467-75.

Сварные швы выполнять по ГОСТ 5264-80.

Привязан:				ТП 704-1-249с. 92 ПМ			
				Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб. м	Стадия	Лист	Листов
			Нач.отд. Ларионов		РП	25	
			Гл.спец. Рахин				
			Н.контр. Панова	Замыкание вертикального монтажного стыка стенки резервуара (окончание)	Гипронефтеспецмонтаж г. Москва		
Инв. №			Инж. Пак				

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

25605-06 27

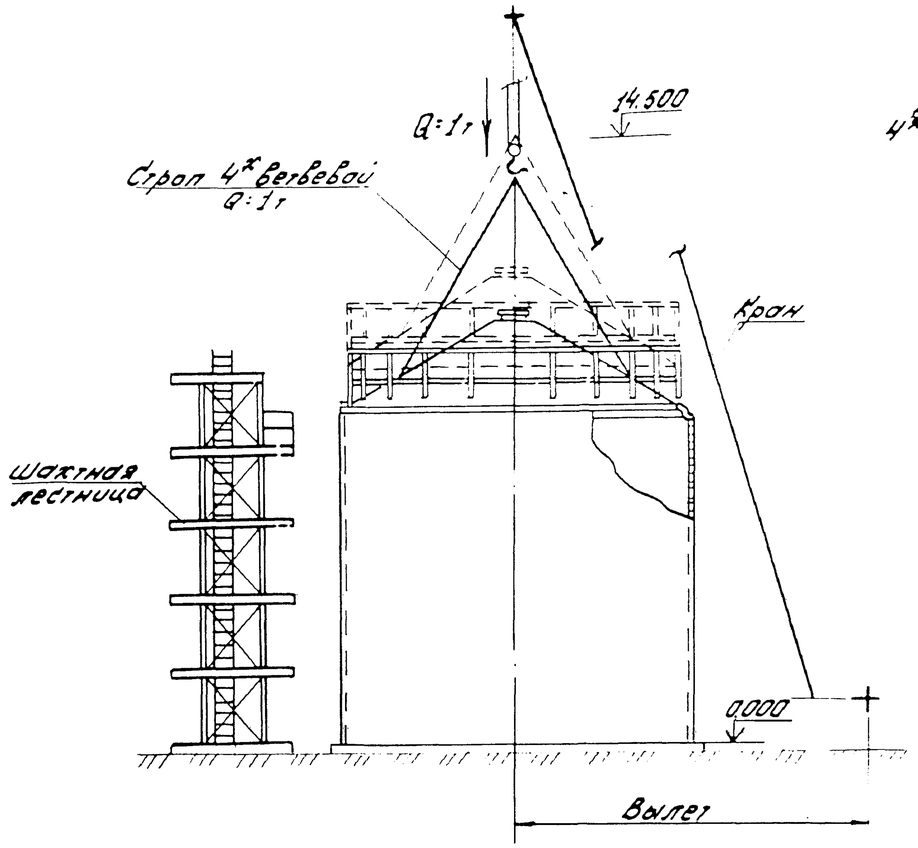

Схема 1. Строповка крыши

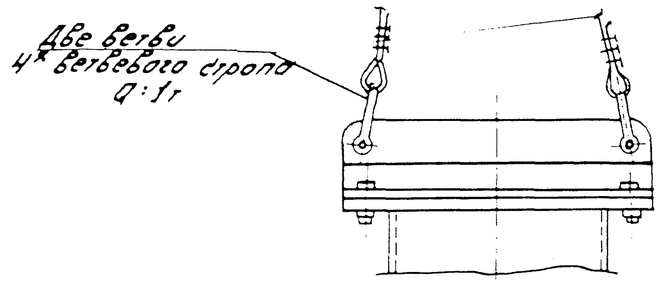

Схема 2. Крепление ловителя

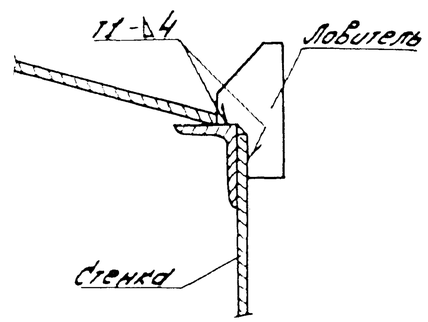

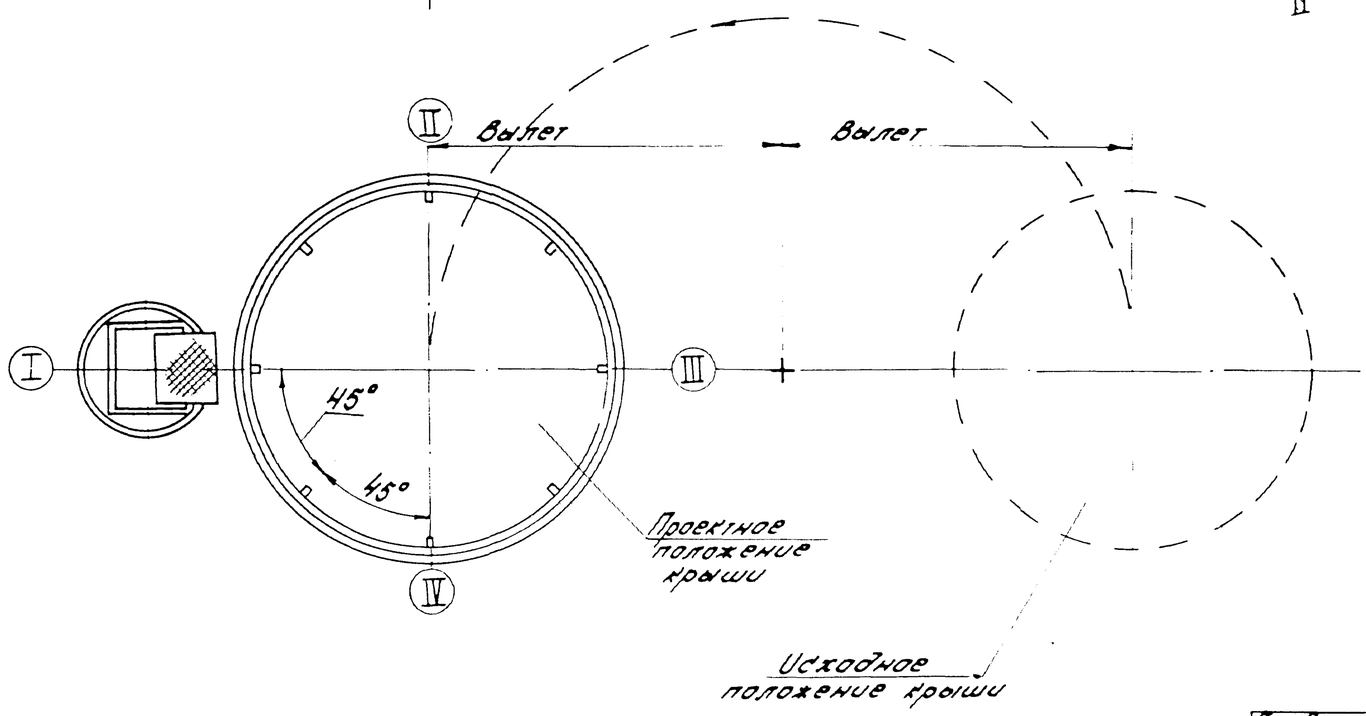

Порядок работ

1. Приварить к обрамляющему уголку и к стенке резервуара 8 ловителей (схема 2).
2. Застропить крышу 4х ветвевым стропом на кран. Приподнять крышу на 0,5м и выдержать в этом положении 10 мин.
3. Установить крышу в проектное положение.
4. Произвести расстроповку крыши и отогнать кран.
5. Подогнать кромку крыши к обрамляющему уголку стенки, сварив стык прерывистым швом.
6. Приварить крышу к обрамляющему уголку проектным катетом.

Указания

1. Перед подъёмом крыши установить шахтную лестницу резервуара на проектном фундаменте.
2. При установке крыши на стенку ее необходимо сориентировать относительно главных осей резервуара (I-III; II-IV).
3. Работы по подгонке и приварке крыши к стенке резервуара производить с автогидроподъёмника АГП-12.
4. Для попадания на крышу установить проектную переходную площадку с шахтной лестницы. Переходная площадка устанавливается после сварки крыши с уголком стенки прерывистым швом по всему периметру.

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Привязан:

Инв.№

Нач.отд.	Марьянов			
Гл.спец.	Рохин		11.91	
Н.контр.	Панова		11.91	
Инж.	Пак			

ТП 704-1-249с. 92 ПМ

Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб.м

Стадия	Лист	Листов
РП	26	

Установка крыши резервуара в проектное положение

Гипронефтеспецмонтаж г. Москва

Альбом 6

Типовой проект 704-1-249с 92

Схема 1. Разводка временных трубопроводов

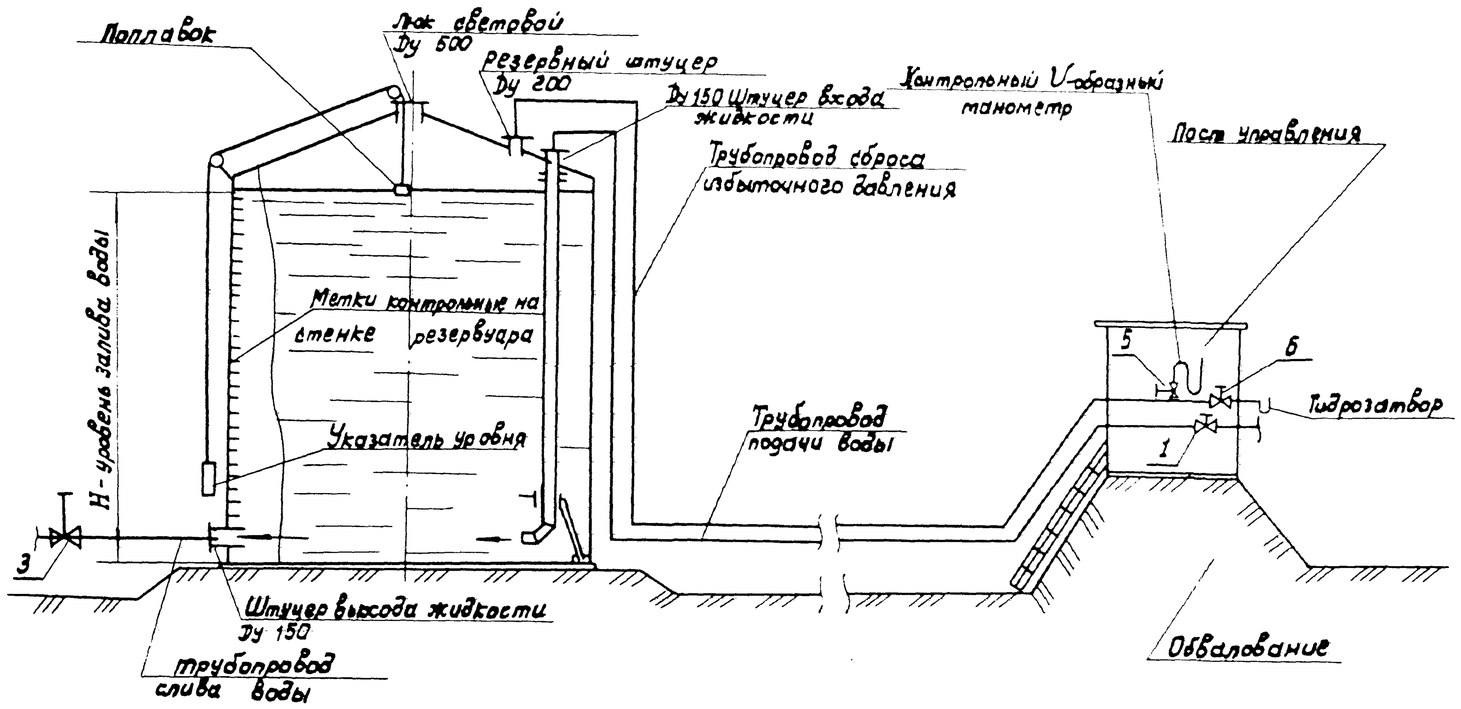

Схема 2. Подача и слив воды.

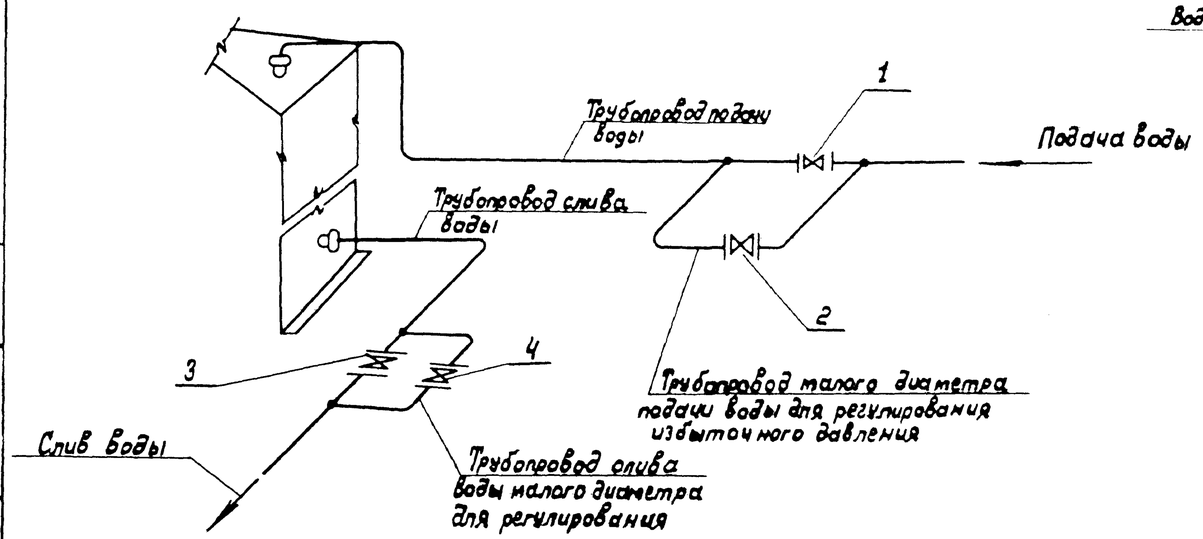

Схема 3. Гидрозатвор

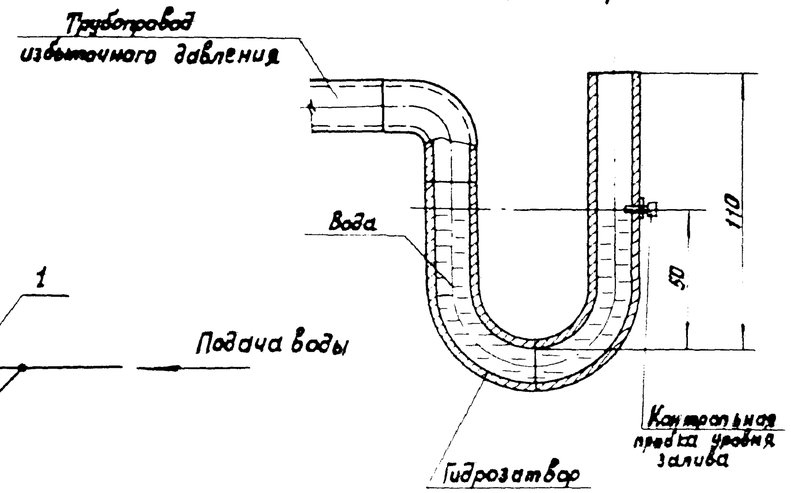

ПОРЯДОК РАБОТ

1. Подготовительные работы.

1.1. До начала испытаний закончить все сварочные работы и контроль сварных соединений.

1.2. Удалить из резервуара все посторонние предметы.

1.3. Очистить днище и стенку от грязи.

1.4. Произвести осмотр соединений и поверхности днища, нижних поясов стенки, крыши на предмет выявления и устранения возможных прожогов или других повреждений.

1.5. Смонтировать временный подводящий трубопровод подачи и слива воды. Использование проектных трубопроводов для проведения испытаний согласовать при привязке проекта с заказчиком.

Диаметр временного трубопровода определить с учетом максимальной производительности имеющегося насосного оборудования (схемы 1,2).

1.6. Смонтировать временные подводящие трубопроводы для установки гидравлического U-образного манометра и регулирования давления.

1.7. Все контрольно-измерительные приборы, задвижки для регулирования избыточного давления должны находиться за пределами обвалования, где расположить пост управления.

Для этой цели из кровли резервуара вывести трубу необходимого диаметра с отводами для манометра и регулирования давления. Рекомендуемые диаметры труб Ду50÷200.

В конце трубопроводов должны быть поставлены соответствующие задвижки.

1.8. Гидравлический манометр (U-образная трубка). одним концом подсоединяется к отводу трубопровода, который должен быть заглушен и иметь на конце металлический трубчатый переход с наружным диаметром, равным диаметру стеклянной трубы. Другой конец U-образной трубки оставить открытым. Гидравлический манометр собрать из стеклянных трубок диаметром 7÷15мм, соединенных между собой резиновыми вставками.

Величину избыточного давления измерить в мм вод. ст. по разности между уровнями воды в U-образной трубке, для чего последнюю закрепить на доске,

Привязан:						ТП 704-1-249с 92			ПМ
						Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб. м	Стадия	Лист	Листов
				Нач. отд.	Ларионов		РП	27	
				Гл. спец.	Рохин	11.91	Испытание резервуара (начало)	ГИПРОНЕФТЕСПЕЦМОНТАЖ г. Москва	
				Н. контр.	Панова				
Инв. №				ИНМ	Пак				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взамен инв.

ТАБЛИЦА 1

Объем резервуара, куб. м	Разность отметок наружного контура днища, мм			
	при незаполненном резервуаре		при заполненном резервуаре	
	смежных точек на расстоянии 6м по периметру	любых других точек	смежных точек на расстоянии 6м по периметру	любых других точек
100	10	25	20	40

Таблица 2

Номер п/п	Наименование отклонений	Предельные отклонения мм	Примечания
1	Днище Высота хлопунов	150	Предельная площадь хлопуна на 2 м²
	Стенка		
2	Отклонение внутреннего диаметра на уровне днища	±40	
3	Отклонение высоты при монтаже	±20	
4	Отклонения от вертикали образующих стенки по поясам:		
	I	±10	Замеры производить для каждого пояса на расстоянии до 50мм от верхнего горизонтального шва. Проверку отклонений производить через 6м по окружности резервуара.
	II	±20	
	III	±30	
	IV	±40	

ПОРЯДОК РАБОТ/продолжение/

на которой нанести шкалу с миллиметровыми делениями.

До установки манометр должен быть испытан.

1.9. Подготовить автогидроподъемник АГП-12 или другое средство для проведения соответствующих измерений и наблюдений.

1.10. Проверить высотные отметки наружного контура днища и произвести измерения геометрических размеров резервуара в соответствии с требованиями таблиц 1,2. Если отклонения не превышают допустимых, приступить к испытаниям. При наличии отклонений, превышающих допустимые, они должны быть устранены монтажной организацией до начала испытаний.

1.11. Смонтировать трубопровод для аварийного сброса воды из резервуара, выведенный за пределы обвалования. Диаметр трубопровода должен обеспечить максимальный сброс воды из резервуара.

1.12. Установить на резервуаре указатель уровня налива воды, нанести контрольные метки на стенке (схема 1).

1.13. Заглушить люки и патрубки на стенке резервуара, световые люки на кровле оставить открытыми.

1.14. На время испытания установить границы опасной зоны радиусом не менее двух диаметров резервуара, внутри которой не допускается присутствие людей, не связанных с испытаниями.

1.15. Все лица, принимающие участие в испытаниях, должны пройти инструктаж по безопасным методам ведения работ с соответствующим письменным оформлением.

1.16. По окончании всех подготовительных работ, предусмотренных настоящим разделом, представителями монтажной организации, ответственной за проведение прочностных испытаний, и заказчиком составляется акт о готовности резервуара к испытаниям.

Альбом 6

Типовой проект 704-1-249с. 92

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам. инв №

Привязан:

Инв №

Нач отд	Ларионов		
Гл. спец.	Рахин		11.91
Н. контр	Панова		
Инж	Пак		

ТП 704-1-249с. 92 ПМ

Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб. м

Испытание резервуара (продолжение)

Стадия	Лист	Листов
РП	28	

ГИПРОНЕФТЕСПЕЦМОНТАЖ г. Москва

2. Испытания резервуара.

Испытание резервуара на прочность и устойчивость производить при различных сочетаниях нагрузок: гидростатическое давление, гидростатическое и избыточное давление для испытания сварных швов крыши на плотность.

2.1. Гидравлическое испытание.

2.1.1. Открыть все световые люки на крыше резервуара, а также все задвижки и вентили трубопровода, сброса избыточного давления (вакуума) (схема 1).

2.1.2. Закрыть задвижки 3,4 трубопровода слива воды (схема 2). Задвижка 2 должна быть закрыта.

2.1.3. Открыть задвижку 1 и подать воду в резервуар, налив воды до расчетной высоты H = 5,96 м.
Заполнение осуществлять ступенями, по поясам, с промежутками, необходимыми для осмотра. По мере заполнения резервуара водой необходимо визуально наблюдать за состоянием конструкций и сварных соединений стенки. Полный резервуар, залитый водой до проектной отметки, испытать на гидростатическое давление с выдержкой 24 часа. При этом задвижка должна быть закрыта.

Если в процессе испытания и при выдержке под гидростатической нагрузкой на поверхности стенки резервуара или по краям днища не появятся течи и если уровень воды не будет снижаться, резервуар считается выдержавшим гидравлическое испытание.

2.1.4. Если в процессе испытания будут обнаружены отпотины, свищи, течи и трещины в швах поясов стенки (вне зависимости от величины дефекта), испытание должно быть прекращено и вода немедленно слита до уровня на один пояс ниже расположения дефекта.

Обнаруженные дефектные места подлежат удалению и заварке. Исправленные места повторно проверить на герметичность и при отсутствии течи испытание может быть продолжено.

2.1.5. После залива резервуара водой до расчетного уровня и выдержки под нагрузкой 24 часа произвести следующие измерения:

1) горизонтальности наружного контура днища и определения осадки основания;

2) отклонений, образующих стенки от вертикали и местных отклонений стенки.

Указанные измерения должны сопоставляться с замерами до залива резервуара.

2.1.6. Гидравлическое испытание необходимо проводить при температуре окружающего воздуха +5°С и выше. При необходимости испытания резервуара в зимних условиях водой должны быть приняты меры по предотвращению замерзания воды в трубках и задвижках, а также обмерзания стенок резервуара.

2.2. Испытание сварных швов крыши на плотность.

2.2.1. Слить воду в резервуаре до высоты 5.96 м.

2.2.2. Закрыть все люки и патрубки на крыше резервуара, проверить их герметичность. Открыть вентили 5,6 контрольного манометра и гидрозатвора (схема 1). Все остальные задвижки 1.2.3.4. по схемам 1.2 при этом должны быть закрыты.

2.2.3. Залить воду в гидрозатвор до уровня контрольной пробки (схема 3).

2.2.4. Закрыть задвижку и подавать воду по трубопроводу малого диаметра, открыв вентиль 2. Довести давление до 100 мм вод. ст. и закрыть вентиль 2.
Контроль давления вести по U-образному манометру.

2.2.5. Произвести контроль сварных швов крыши обмыливанием. Все обнаруженные дефектные места отметить, после чего сбросить давление. Исправить дефектные места и повторить контроль, создав давление 100 мм. вод. ст.

3. Требования безопасности труда.

3.1. До начала испытаний приказом по организации, на которую возложено проведение испытаний, назначить ответственное лицо-руководителя испытаний.

3.2. Перед проведением испытаний все работники, принимающие участие в них, обязательно должны пройти инструктаж по безопасным методам ведения работ непосредственно на местах их выполнения, с соответствующим письменным оформлением.

3.3. Установленная граница опасной зоны должна быть ограждена предупредительными знаками.

Площадка внутри опасной зоны должна обеспечивать свободный доступ к резервуару и задвижкам, снабжена инвентарными трапами для прохода через траншеи, предупредительными знаками и т.д.

3.4. Выполнять работы на крыше резервуара, разрешается только при наличии ограждения.

3.5. Работы внутри резервуара производить только под непосредственным надзором лица, ответственного за проведение испытаний.

3.6. Для наблюдения за состоянием конструкций во время испытаний в ночное время сам резервуар, а также все места установки приборов, приспособлений, лестниц, проходы и т.п. должны быть хорошо освещены.

3.7. На все время испытаний нахождение лиц, не участвующих в испытаниях, внутри зоны обвалования запрещается.

3.8. Осмотр состояния конструкций резервуара при испытаниях и проведении замеров производить только лицам, назначенными руководителем испытаний.

3.9. Во время повышения избыточного давления нахождение лиц, участвующих в испытаниях, в зоне обвалования не разрешается.

3.10. Допуск к осмотру конструкций резервуара разрешается не ранее чем через 10 мин. после достижения установленных рабочих нагрузок.

3.11. Производить остукивание молотком или кувалдой стенки резервуара, наполненного водой, запрещается.

3.12. Производить испытание кровли резервуара на прочность и герметичность во время дождя не разрешается.

3.13. При испытаниях крыши резервуара за показаниями U-образного манометра и состоянием конструкций установить постоянное наблюдение с безопасного расстояния. (за обваловением резервуара).

3.14. В процессе испытаний, когда резервуар залит водой и создано испытательное давление, подходить к резервуару или подниматься на крышу строго запрещается.

Подходить к резервуару для производства работ разрешается только после выдержки конструкции под нагрузкой не менее 30 мин. и после сброса давления.

3.15. До испытаний крыши резервуара избыточным давлением на люках крыши установить предохранительную арматуру (клапаны, гидрозатворы), рассчитанную на соответствующие испытательные нагрузки.

Альбом 6

Типовой проект 704-1-249 с. 92

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

Нач. отд.	Ларионов		
Гл. спец.	Рожин		
Н. контр.	Панова		
Инж.	Пак		

ТП 704-1-249 с. 92 ПМ

Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 1000 куб. м.

Стадия	Лист	Листов
РП	29	

Испытание резервуара (окончание)

Гипронефтеспецмонтаж г. Москва

Альбом 6

Типовой проект 704-1-249с. 92

Сварка стенки с днищем и обвязочным уголком

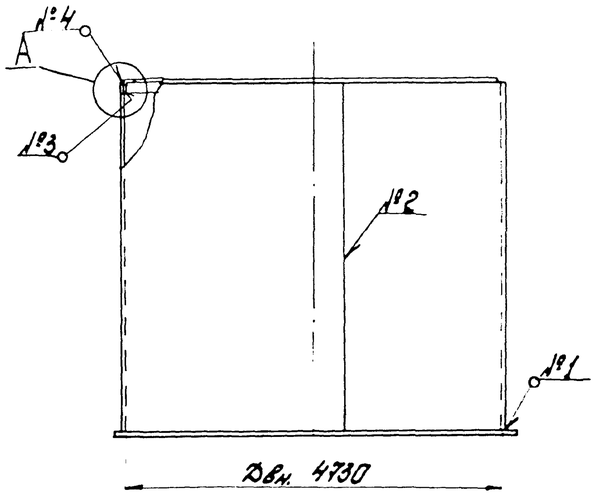

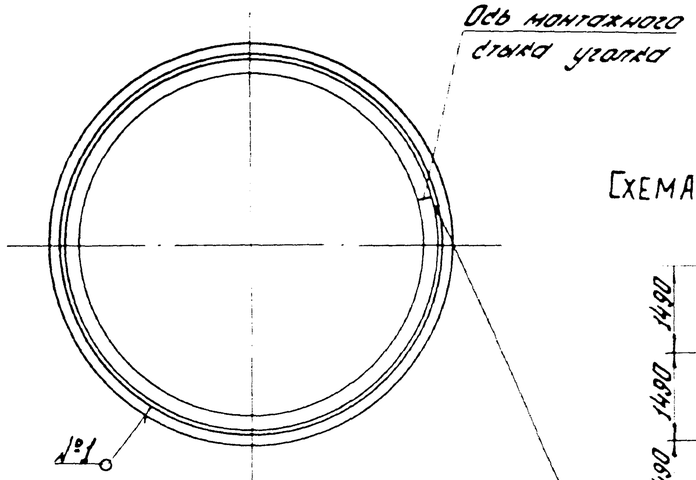

А (1:5)



Схема 1. Сварка шва №1

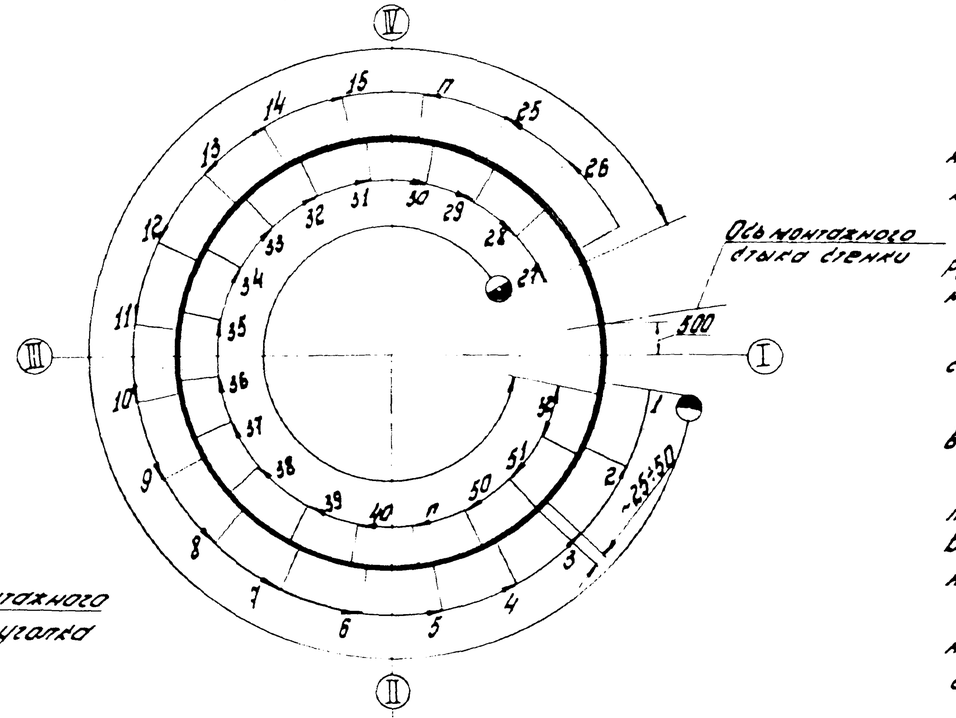

Схема 2. Сварка шва №2



Схема 3. Доварка пересечения шва №1 со швом №2

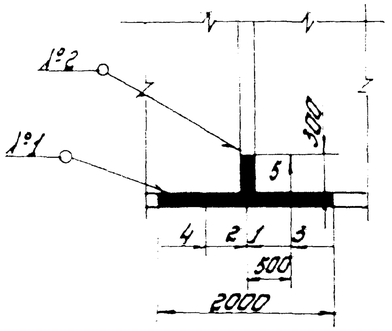

Порядок работ

1. Разворачивание рулона стенки и замыкание вертикального монтажного стыка производить согласно технологии монтажа (стр ...

2. Прихватку и сварку швов №1-4 выполнять способом ручной электродуговой сварки электродами типа Э-42А марки УОНИ 13/45 диаметром 3,0 и 4,0 мм.

3. Сварку швов №1,3,4 рекомендуется выполнять двум сварщикам при одновременной их работе на разных высотах.

4. По мере разворачивания рулона производить прихватку швом Т1-Δ4 50/250 с наружной стороны стенки.

5. Произвести сварку шва №1,3 и 4. Сварку выполнять в последовательности, указанной в табл. 1 и схеме 1.
Внимание! Участки шва №1 длиной по 1м от вертикального шва №2 доваривается после сварки шва №2.

По мере разворачивания рулона и сварки шва №1 с наружной стороны производить контроль герметичности смачиванием керосином.

6. Произвести сварку шва №1 с внутренней стороны стенки. Сварку выполнять в последовательности, указанной в табл. 1 и схеме 1.

7. Произвести сварку шва №2 сначала с наружной а затем с внутренней стороны стенки.
Внимание! Участок шва №2, примыкающий к днищу (300 мм) не доваривать.

8. Произвести доварку шва №1 и №2 согласно схеме 3.

9. Произвести контроль качества швов №1÷4 100% внешним осмотром и измерением. Шов №1 проверить на герметичность с внутренней стороны методом вакуумирования при перепаде давления до 0,6 кгс/см².

Шов №2 проверить методом радиографии в объёме 100% протяженности.

Условные обозначения:
- Сварной шов
- Размещение сварщика и общее направление сварки.
- 5 Номер технологического участка шва и направление его сварки

Привязан:					ТП 704-1-249с. 92			
			Нач.отд.	Перьмина				
			Гл.спец.	Рохин		Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб.м	Стадия	Лист	Листов
			Гл.спец.	Черышов			РП	30	
			Н.контр.	Попова		Сварка стенки (Начало)	Гипронефтеспецмонтаж г. Москва		
Инв.№			Нач.	Яшина					

Инв.№подл. | Подп.и дата | Взам.инв.№

Альбом 6

Типовой проект 704-1-249с. 92

Последовательность работ по сварке при разворачивании рулона стенки

Таблица 1

Порядковый номер операции	Содержание работ	Эскиз
1.	Начало разворачивания рулона стенки L=3,0м и прихватка с наружной стороны Т1-Δ4-50/250 на длине 2,0м	
2	Продолжение разворачивания рулона стенки, прихватки и начала сварки шва №1 с наружной стороны, установка и прихватка обвязочного уголка 90×56×5,5 (швы №3 и 4)	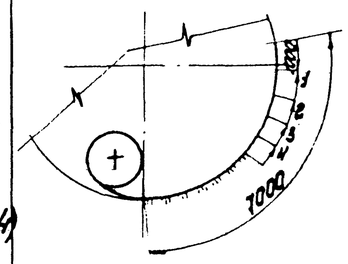
3	Окончание разворачивания рулона, прихватки и сварки шва №1 с наружной стороны и обвязочного уголка (швы №3,4). Сварка шва №2.	
4	Доварка участков шва №1 (L=2,0м) и шва №2 (L=0,3м).	
5	Сварка шва №1 с внутренней стороны.	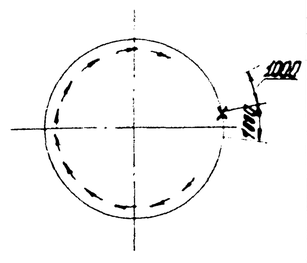

Характеристика монтажных сварных соединений стенки, стенки с днищем и уголком.

Таблица 2

Номер шва	Сечение шва и размеры	Тип шва	Положение шва	Толщина соединяемых деталей, мм	Длина одного шва, м	Масса н. м, кг	Расход электродов марки УОНИ 13/45, К2	
							ф3,0 мм	ф4,0 мм
1		Т3-Δ4	Нижнее	4+4	14,88	3,96	2,5	5,5
2		С7	Вертикальное	4+4	5,96	2,1	4,2	—
3,4		Н2-Δ4	Нижнее	4+5,5	14,88	4,0	8,0	—
					Итого:		14,7	5,5

Привязан:

Инв №

Нач. отд.	Ларионов			
Гл. спец.	Рохин			11.91
Гл. спец.	Черникова			
Н. контр.	Панова			
Инж.	Ершова			

ТП 704-1-249с. 92 ПМ

Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб.м

Сварка стенки (окончание)

Стадия	Лист	Листов
РП	31	

Гипронефтеспецмонтаж г. Москва

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Альбом 6

Типовой проект 704-1-249с. 92

Монтажные сварные соединения врезок патрубков в стенке резервуара

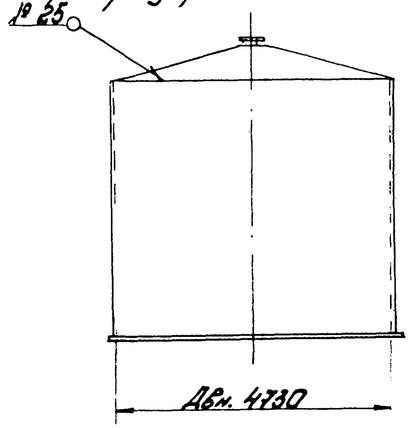

В ○

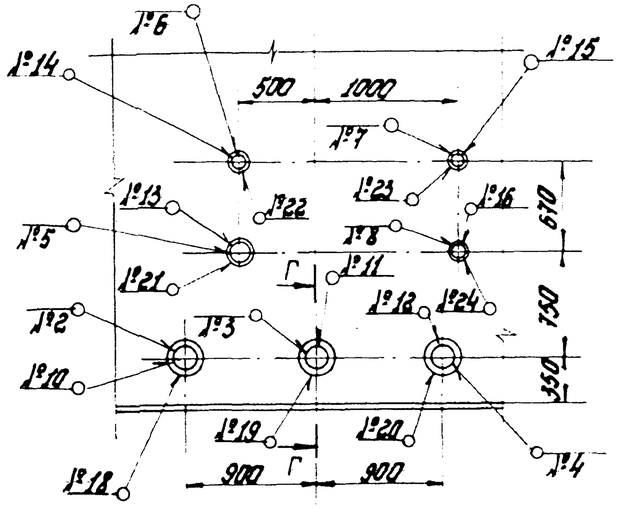

Г-Г (1:10)

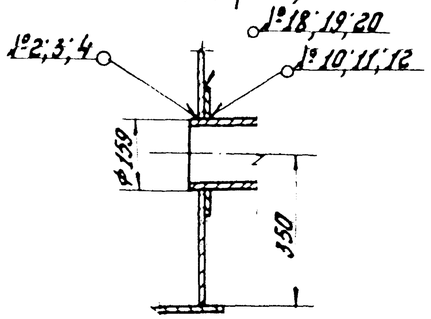

Схема сварки швов №1;9;17 в стенке резервуара

Схема сварки швов №2÷5;10÷13; 18-21 в стенке резервуара

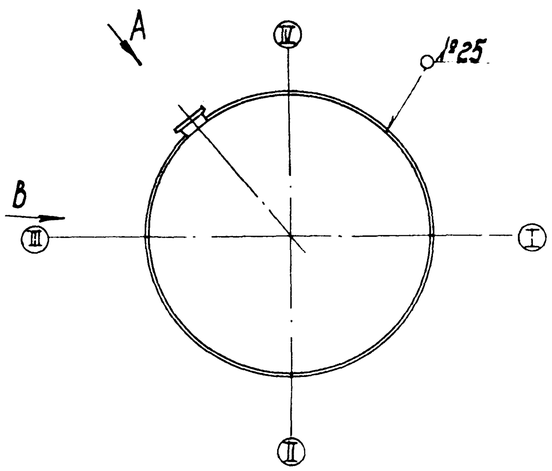

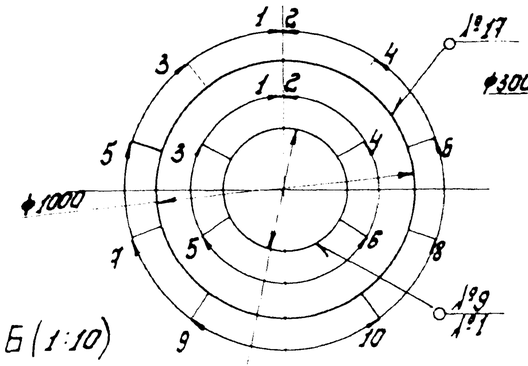

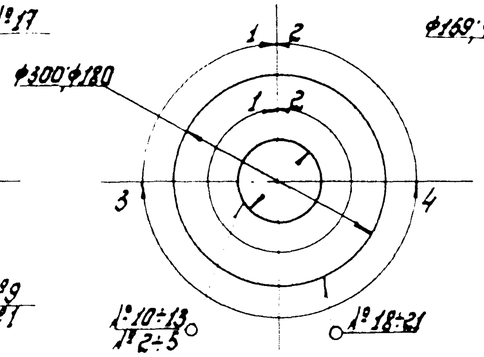

А ○

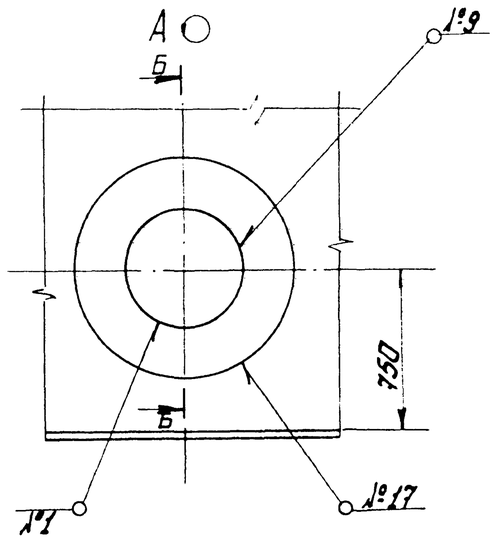

Б-Б (1:10)

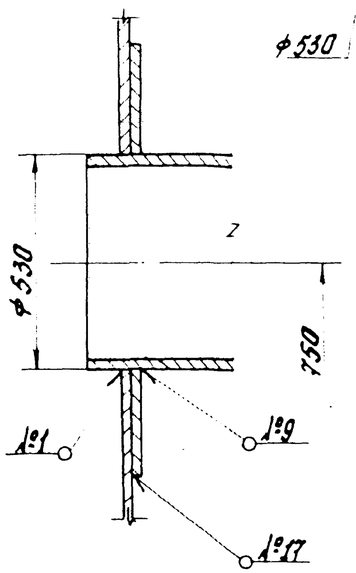

Схема сварки шва №25

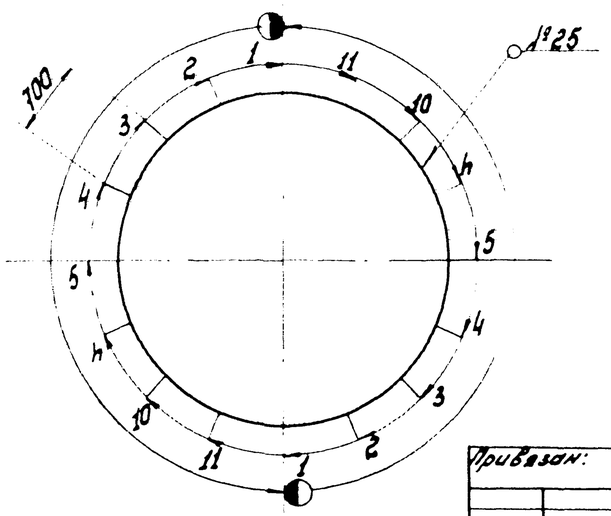

Порядок работ

1. Произвести разметку и вырезку отверстий под установку люков и патрубков. Вырезку отверстий выполнять кислородной резкой с учетом припуска не менее 4,0мм на последующую механическую обработку торцов реза и зазор под сварку.

Обработать торцы резов армированными абразивными кругами со снятием слоя металла 2,0мм.

2. Прихватку и сварку швов люков и патрубков выполнять ручной электродуговой сваркой электродами типа Э-42А марки УОНИ 13/45 диаметром 3,0мм.

3. Произвести прихватку труб патрубков и люков прерывистым швом Н1-Δ3-50/250.

4. Произвести сварку швов №1-8 в стенке резервуара. Сварку выполнять участками согласно схем сварки, см. лист ...

5. Произвести контроль качества выполняемых швов №1-8 100% внешним осмотром, измерением и проверить их герметичность смачиванием керосином.

6. Произвести прихватку усиливающих колец швом Н1-Δ3-50/250 и сварку швов №9-24.

Сварку выполнять участками согласно схем сварки, см. ...

7. Произвести контроль качества швов №9-24 100% внешним осмотром и измерением.

8. После установки крыши резервуара в проектное положение см. технологию монтажа стр. произвести прихватку крыши с обрамляющим уголком прерывистым швом Н1-Δ4-70/500.

9. Произвести сварку кольцевого шва №25. Сварку выполнять одновременно двум сварщикам участками согласно схеме сварки шва №25.

10. Произвести контроль качества выполненного шва №25 внешним осмотром и измерением катета.

Шов №25, а также швы люков и патрубков проверить на герметичность созданием избыточного давления воздуха до 100мм вод. ст. в процессе гидравлических испытаний резервуара.

Привязан:				ТП 704-1-249с. 92 ПМ			
				Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб. м	Стадия	Лист	Листов
	Нач. отд.	Ларионов			РП	32	
	Гл. спец.	Рогин					
	Гл. спец.	Чернышов		Сварка люков и патрубков на стенке резервуара (начало)	Гипронефтеспецмонтаж г. Москва		
	Н. контр.	Панова					
Инв. №	Инж.	Яшина					

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Альбом 6

Типовой проект 704-1-249с. 92

Характеристика монтажных сварных соединений стенки резервуара

Номер шва	Сечение шва и размеры	Тип шва	Положение шва	Толщина соединяемых деталей, мм	Длина одного шва, м	Масса н.м., кг	Расход электродов марки УОНИ 13/45, кг	
							Ф3,0	Ф4,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Т1-△4	Вертикальное неповоротное	5+4	1,68	0,25	0,5	—
2,3,4		Т1-△4	То же	4,5+4	0,5	0,24	0,48	—
5		Т1-△3	—"—	3+4	0,28	0,03	0,06	—
6		Т1-△3	—"—	2,5+4	0,15	0,013	0,03	—
7		Т1-△3	—"—	2+4	0,11	0,01	0,02	—
8		Т1-△3	—"—	2+4	0,1	0,01	0,02	—
9		Т1-△5	—"—	5+5	1,68	0,37	0,74	—
10,11,12		Т1-△4	—"—	4,5+4	0,5	0,24	0,48	—
13		Т1-△3	—"—	3+4	0,28	0,03	0,06	—
14		Т1-△3	—"—	2,5+4	0,15	0,013	0,03	—

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15		Т1△3	Вертикальное неповоротное	2+4	0,11	0,01	0,02	—
16		Т1△3	То же	2+4	0,1	0,01	0,02	—
17		Н1-△4	—"—	5+4	3,14	0,47	0,94	—
18,19 20		Н1-△4	—"—	4+4	0,25	0,14	0,28	—
21		Н1-△4	—"—	4+4	0,57	0,09	0,2	—
22		Н1-△4	—"—	4+4	0,3	0,05	0,1	—
23		Н1-△4	—"—	4+4	0,22	0,03	0,06	—
24		Н1-△4	—"—	4+4	0,22	0,03	0,06	—
25		Н1-△4	нижнее	5,5+4	14,9	2,0	1,5	2,5
				Итого:			5,6	2,5

Привязан:

Инв. №

Нач.отд.	Карионов		
Гл.спец.	Рохин		11.91
Гл.спец.	Чернышов		
Н.контр.	Панова		11.91
Ст.т.	Яшина		

ТП 704-1-249с. 92 ПМ

Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб. м

Стадия | Лист | Листов: РП | 33

Сборка люков и патрубков на стенке резервуара (окончание)

Гипронефтеспецмонтаж г. Москва

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Альбом 6

Типовой проект 704-1-249 с. 92

Монтажные сварные соединения крыши с люками и площадкой ограждения



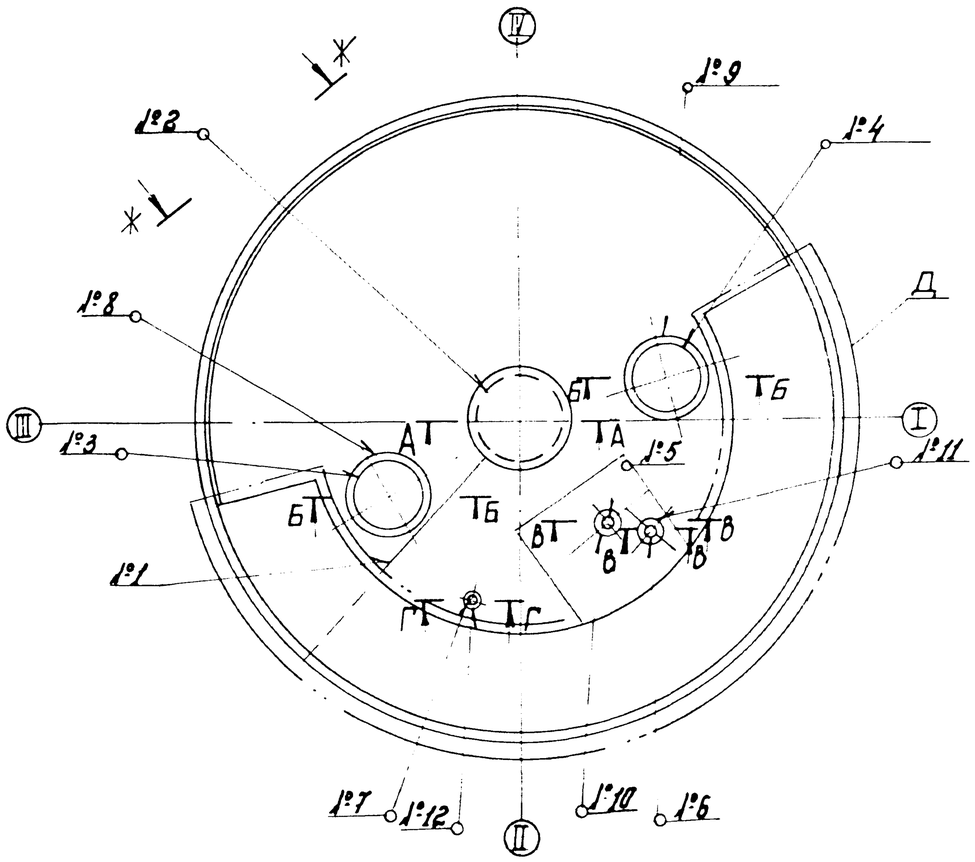

Схема сварки шва 1:1

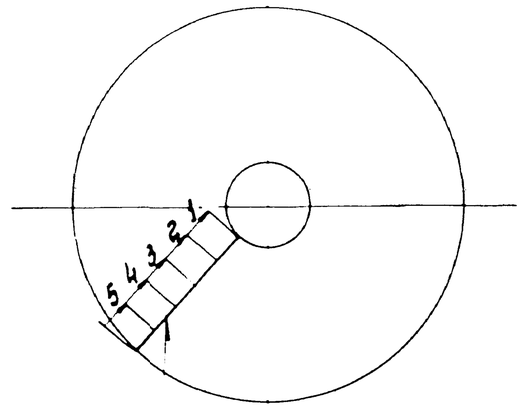

1:1

Схема сварки швов 1: 2,3,4,8,9

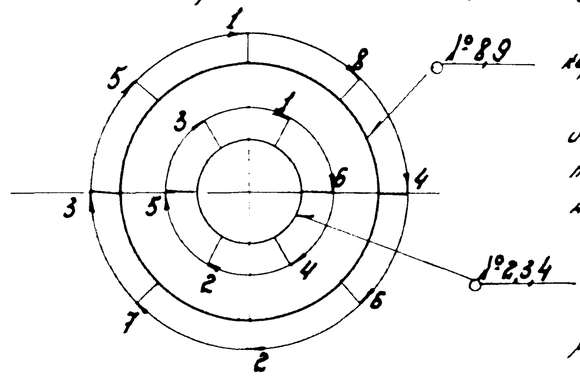

Схема сварки швов 1: 5÷7, 10÷12

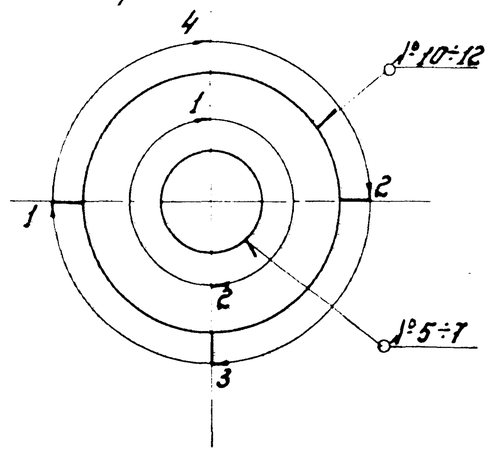

Порядок работ

1. Сварку элементов крыши с люками и площадками ограждений выполнять в соответствии с технологией монтажа стр.14,16

2. Прихватку и сварку всех швов производить способом ручной электродуговой сварки электродами типа Э-42А, марки УОНИ 13/45 диаметром 3,0 и 4,0 мм.

3. При сборке стыков крыши обеспечить требуемый зазор $2^{+1,0}_{-0,5}$ мм и отсутствие смещение кромок, превышающего 0,1 толщины листа, но не более 0,5 мм.

4. Произвести прихватку собранных стыков. Прихватки С2-50/350.

5. Произвести сварку шва 1:1. Сварку выполнять технологическими участками за один проход, как показано на схеме сварки шва 1:1.

6. Зачистить зоны по ~150 мм на шве 1:1 заподлицо с основным металлом под установку усиливающего кольца жесткости.

Проверить шов 1:1, внешним осмотром, измерением и на герметичность смачиванием керосином по ОСТ 5.1180-87.

Допускается контроль герметичности вместо смачивания керосином методом вакуумирования.

7. Разметить места врезки патрубков и люков на крыше и вырезать отверстия под их установку кислородной резкой с последующей зачисткой мест реза армированными абразивными кругами до снятием слоя около 2,0 мм.

Обеспечить зазор 1±1 мм между торцами отверстии и стенкой устанавливаемых патрубков и люков.

8. Произвести прихватку патрубков и люков к крыше прерывистым швом Т1-Δ4-25/150.

9. Произвести сварку швов 1: 2÷7. Сварку выполнять участками согласно схеме сварки.

10. Проверить качество швов 1: 2÷7 100% внешним осмотром и измерением.

11. После пригонки усиливающих колец с поверхностью крыши произвести прихватку их швом Δ4-25/150 и сварку швов 1: 8÷12. Сварку выполнять участками согласно схем сварки.

12. После установки площадок и ограждений по чертежам КМ произвести прихватку и сварку группы соединений швы 1:13.

13. Произвести контроль качества швов 1: 8÷12 100% внешним осмотром и измерением. После установки крыши в проектное положение швы 1: 1÷12 проверить на герметичность созданием избыточного давления при гидроиспытаниях до 100 мм вод. ст. с определением мест неплотностей обмыливанием швов.

Привязан:				ТП 704-1-249с. 92			ПМ
	Нач.отд.	Ларионов		Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб.м	Стадия	Лист	Листов
	Гл.спец.	Ратин	11.91		РП	34	
	Гл.спец.	Черняков		Сварка крыши, люков и ограждений (начало)	Типонефтестецмонтаж г. Москва		
	Н.контр.	Попова					
Инв.№	Инж.	Ежина					

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Альбом 6

Типовой проект 704-1-249с. 92

Д (1:20)

Сварка ограждения на крыше резервуара шов № 13

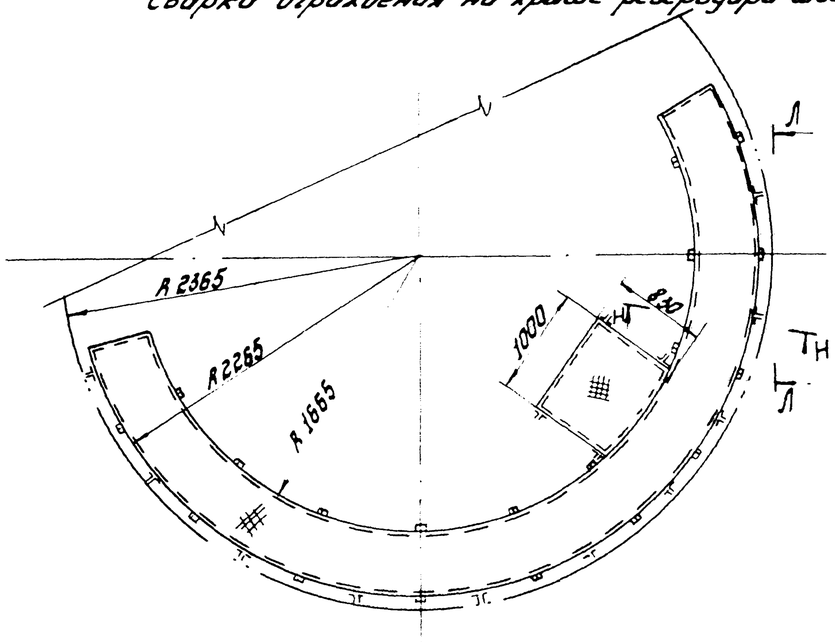

Л-Л (1:20)

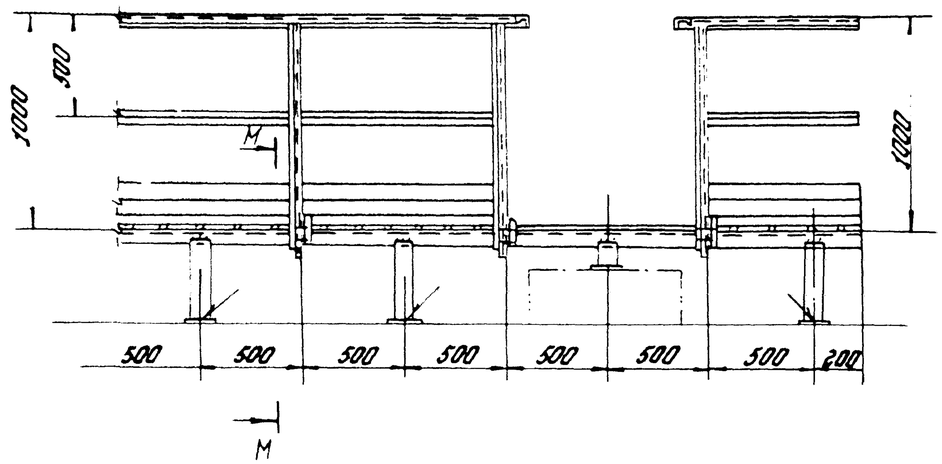

М-М (1:10)



Н-Н (1:20)

Ж-Ж (1:20)

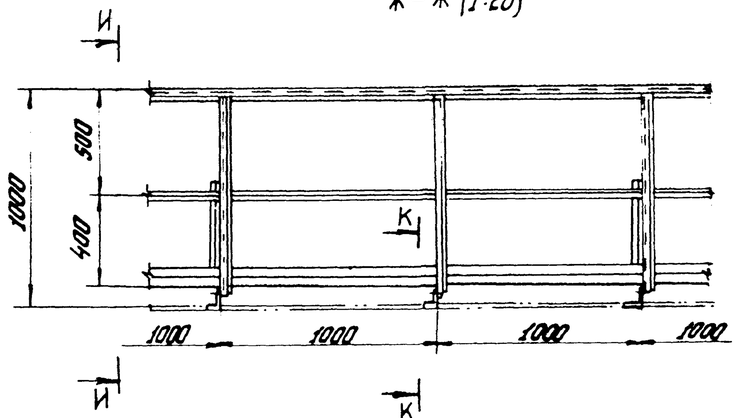

И-И (1:20)

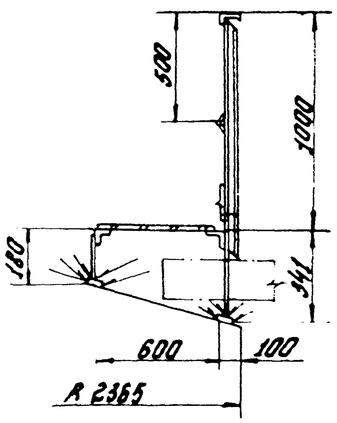

П-П (1:20)

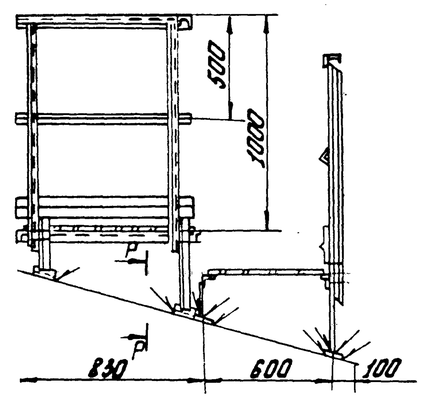

Р-Р (1:5)



К-К (1:5)

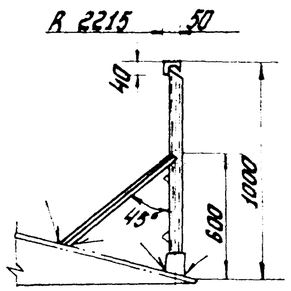



Привязан:

Инв. №

Нач. отд.	Ларионов		
Гл. спец.	Ротин		11.91
Гл. спец.	Чернышов		
Н. контр.	Попова		
Инж.	Дышина		

ТП 704-1-249с. 92 ПМ

Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб. м

Сварка крыши люков и ограждений (продолжение)

Стадия	Лист	Листов
РП	35	

Гипронефтеспецмонтаж г. Москва

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Альбом 6

Типовой проект 704-1-249 с. 92

А-А (1:10)

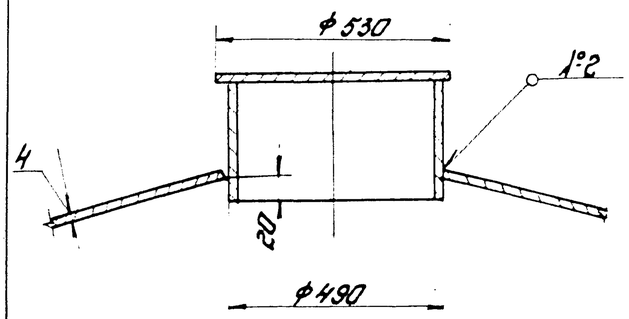

В-В (1:5)

Патрубок на крыше Ду 150

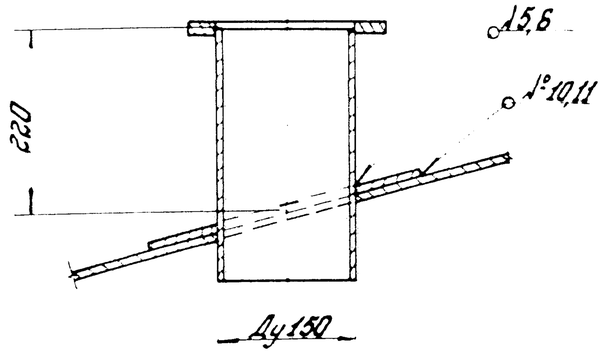

Б-Б (1:10)

Люк Ду 500

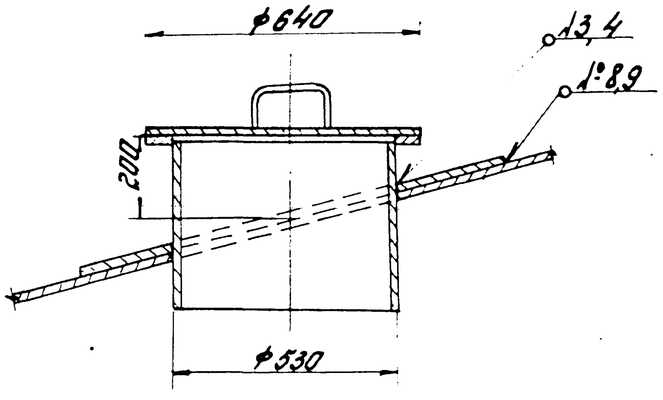

Г-Г (1:5)

Патрубок на крыше Ду 100

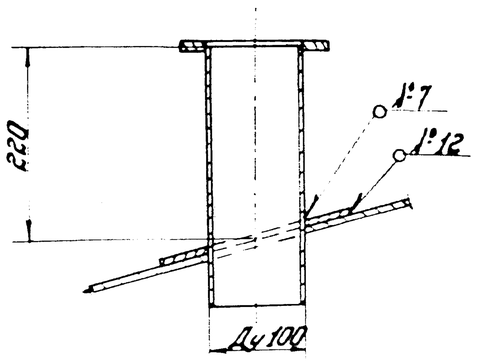

Характеристика монтажных сварных соединений

Номер шва	Сечение шва и размеры	Тип шва	Положение шва	Толщина соединяемых элементов, мм	Длина одного шва, м	Масса н. м, кг	Расход электродов марки УОНИ 13/45 кг ф3,0	ф4,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Соединения элементов крыши								
1		С2	Наклонное	4+4	2,42	0,56	1,2	—
Соединение патрубков и люков								
2		Т1-Δ4	Нижнее	4+4	1,54	0,21	0,42	—
3,4		Т1-Δ4	Нижнее	5+4	1,67	0,46	1,0	—
5,6		Т1-Δ4	Нижнее	6+4	0,499	0,14	0,3	—
7		Т1-Δ4	Нижнее	4+4	0,34	0,05	0,1	—
8,9		Н1-Δ4	Нижнее	4+4	3,14	0,84	2,0	—
10,11		Н1-Δ4	Нижнее	4+4	1,0	0,27	0,6	—
12		Н1-Δ4	Нижнее	4+4	0,7	0,1	0,2	—
Соединения элементов площадок и ограждений								
13	По чертежам КМ		Нижнее горизонтальное вертикальное	—	—	1,73	3,5	—
						Итого:	9,5 кг	—

Привязан:

Инв. №

Нач.отд.	Ларионов		
Гл.спец.	Рохин		11.92
Гл.спец.	Черняков		
Н.контр.	Панова		
Инж.	Яшина		

ТП 704-1-249 с. 92 ПМ

Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб. м

Сварка крыши, люков и ограждений (окончание)

Стадия	Лист	Листов
РП	36	

Гипронефтеспецмонтаж г. Москва

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Альбом 6

Типовой проект 704-1-249с. 92

СХЕМА 1. Сварка шва №1

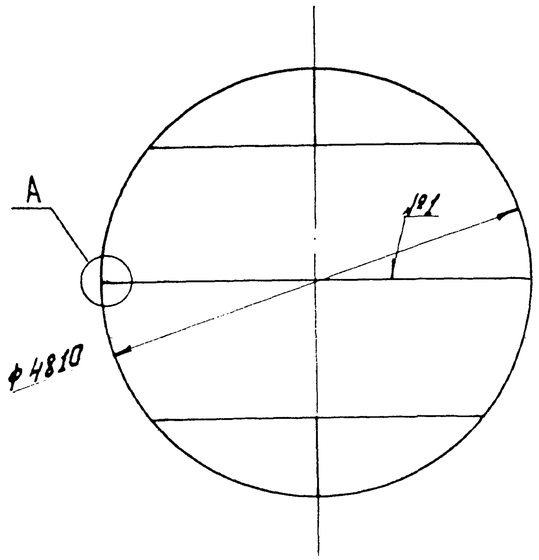

А

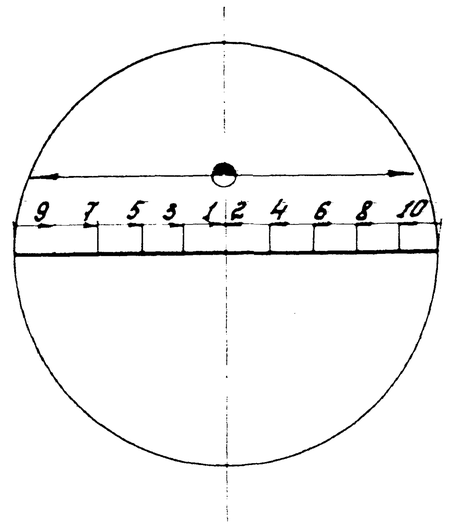

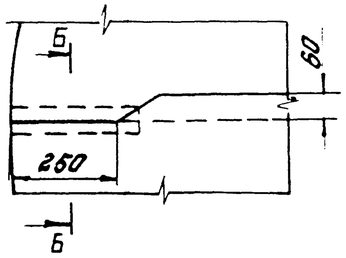

Б-Б (1:1)



Подкладной лист

Порядок работ

1. Сборку элементов днища производить согласно технологии монтажа (стр. 11). При сборке обеспечить величину нахлеста листа 60 мм и зазор $2^{+1}_{-0,5}$ мм на краевых участках шва $L = 250$ мм.

2. Прихватку и сварку днища производить способом ручной электродуговой сварки электродами типа Э42А марки УОНИ $^{13}/_{45}$ диаметром 3,0 и 4,0 мм.

3. Произвести прихватку элементов днища швом Н1-Δ4 $^{50}/_{250}$.

4. Произвести сварку шва №1. Сварку выполнять участками согласно схемы сварки.

5. Произвести контроль выполненного шва 100% внешним осмотром и измерением. Проверить герметичность вакуумирования.

Контроль перефирийных участков шва №1 (по $l = 250$ мм) производить методом радиографии.

Характеристика сварных соединений днища

Номер шва	Сечение шва и размеры	Тип шва	Положение шва	Толщина соединяемых деталей, мм	Длина шва, м	Масса н. м., кг	Расход электродов марки УОНИ $^{13}/_{45}$	
							ф3,0	ф4,0
1		Н1-Δ4	Нижнее	4+4	4,31	0,58	0,4	0,78
		С-5	"	"	0,5	0,1	0,2	–

Условные обозначения:

— Сварной шов

◐ – Размещение сварщика и общее направление сварки.

3 – Номер технологического участка шва и направление его сварки.

Привязан:

Инв. №

Нач. отд.	Ларионов		
Гл. спец.	Рохин		11.91
Гл. спец.	Нерянешов		
Н. контр.	Панова		11.91
Инж.	Яшина		

ТП 704-1-249с. 92 ПМ

Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб. м

Стадия	Лист	Листов
РП	37	

Сварка днища

Гипронефтеспецмонтаж г. Москва

Подп. и дата | Взам. инв. №
